

原子炉の状態 月例レポート 2025年5月

概要 東京電力の発表によると、[5月28日](#)現在、福島第一原子力発電所では、原子炉格納容器（以下、PCV）空調機戻り空気温度が、1号機：[21.9℃](#)（前月19.2℃）、2号機：[27.2℃](#)（前月24.2℃）、3号機：[20.8℃](#)（前月16.9℃）であり、原子炉格納容器の放射性物質（Xe-135 [参照](#)）濃度も、1号機B系：[1.38 × 10⁻³ Bq/cm³](#)（前月末1.68 × 10⁻³ Bq/cm³）、2号機A系：[検出限界値【1.2 × 10⁻¹ Bq/cm³】以下](#)（前月末も同じ）、3号機A系：[検出限界値【1.9 × 10⁻¹ Bq/cm³】以下](#)（前月末も同じ）と、有意な変動は見られていません（[5ページ](#)）。

筆者注：PCVのXe-135濃度を測定しているガス放射線モニタは、1号機は半導体検出器、2・3号機はシンチレーション検出器となっています。[機種の違いの詳細および理由は分かりません](#)）

[3、4ページ](#)には、[5月のイチエフ廃炉作業全般の主な取り組みと状況](#)を示しています。3ページではイチエフ構内の平面画像に主な取り組み事項を配置してあります。4ページは各事項の簡単な解説です。ページ間では各ボックス冒頭の＜T1＞＜R2＞等の記号で照合してください。[青地のボックス](#)は今月東京電力が月例の「廃炉・汚染水・処理水対策の概要」において、主な取り組みとして示したもののうち実際に行われた作業、[灰色地のボックス](#)は計画・準備・試験・報告等、[黄色地のボックス](#)は筆者が東京電力が毎日発表する「プラント関連パラメータ」等をチェックした際抱いた疑問他、筆者の判断によるものです。いずれのボックスも原資料があるものはそのハイパーリンクを埋めてあります。廃炉に向けた進捗状況を概観するためにご利用ください。


[4月のイチエフ内のインシデント・事故情報](#)は、[77ページ](#)をご覧ください。

47ニュースのイチエフに関する報道（[78ページ](#)）では、[ウェブサイト47ニュース「原発問題」](#)に掲載された記事の、本文へのリンクを貼った見出しを、[【イチエフの廃炉】](#)・[【イチエフ事故の後始末】](#)・[【原子力発電、核施設をめぐる動き】](#)および月によって変わる中区分等に分けて紹介してあります。大区分【原子力発電、核施設をめぐる動き】内の今月の中区分は、[再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策](#)/[原子力発電のバックエンド（使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管（地上保管）](#)/[原子力災害時の避難計画の妥当性](#)/[柏崎刈羽原発（電力消費地と原発立地）](#)/[九州電力による原発リプレースメント計画](#)/[各地の原発・核施設](#)/[未分類](#)としました。

このレポートは、基本的に表題の年月に東京電力、原子力規制委員会、経済産業省その他から発表された福島第一原発の現況に関する資料の要点などを、できる限り専門用語・略語を排してまとめ、理解に必要な最小限の解説を加えたものです。文中「イチエフ」とは、福島第一原発の略称です。

目次	
1 主な取り組み(更新)	… 3
2 プラント関連パラメータ	… 5
3 原子炉内の温度(更新)	… 6
4 原子炉建屋から放出された放射性物質による外部汚染の程度(更新)	… 7
5 その他の指標(更新)	… 9
6 原子炉格納容器循環注水冷却(の停止試験)	
(1)～(3) 概要	…10
(4) 第Ⅰ期(2020年5月まで)	…13
(5) 第Ⅱ期(2020年8月まで)	…33
(6) 第Ⅲ期(現在)の一部	…36
⑥ 2号機TE-2-3-69Rの謎	…43
(7) 循環注水冷却スケジュール(更新)	…46
7 原子炉格納容器ガス管理設備	…47
8 東京電力が発表してきた原子炉の状態を表すデータの信頼性について	…70
9 原子炉建屋から新たに放出された放射性物質量の評価についての考察	…72
10 東京電力が発表したイチエフ内のインシデント・事故情報(更新)	…77
11 イチエフに関する報道(更新)	…78

1 主な取り組みと状況(更新)

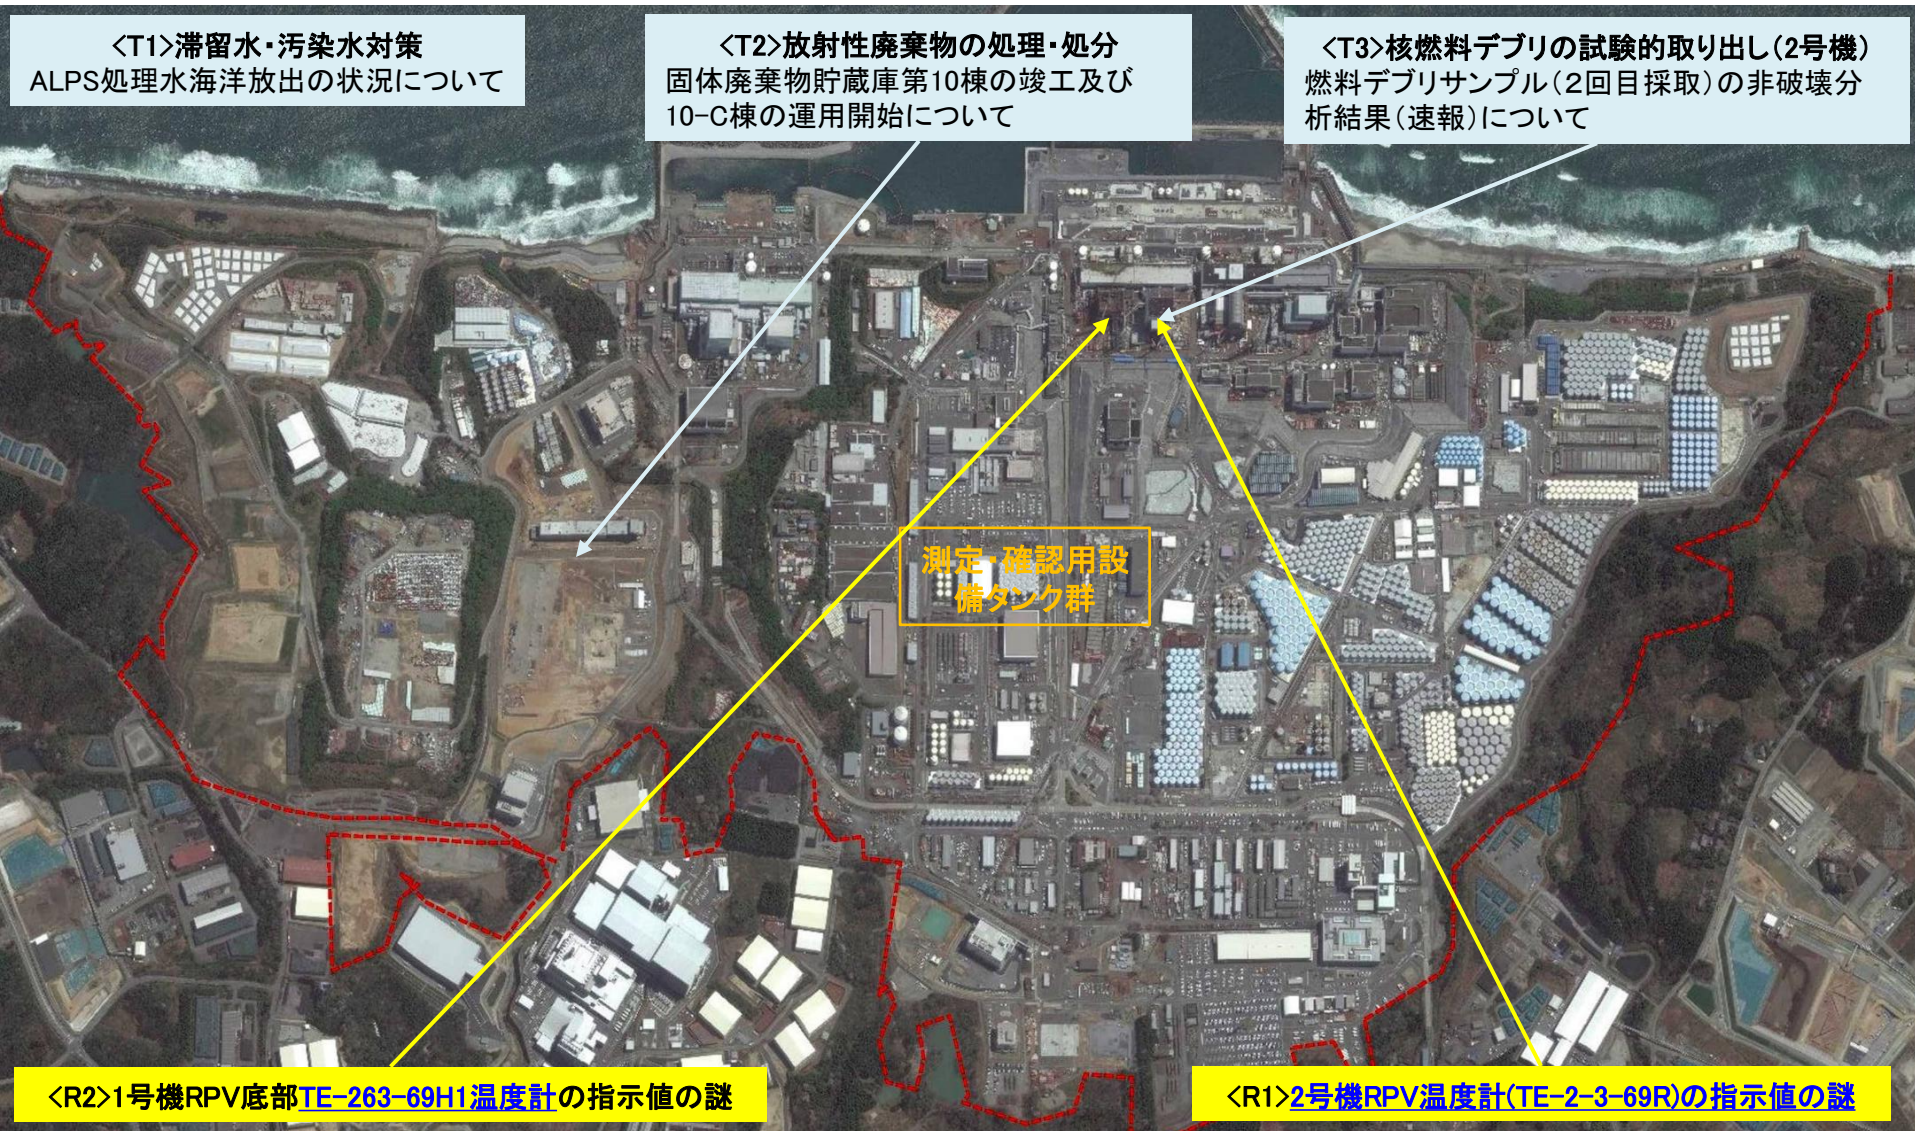

〈T1〉ALPS処理水海洋放出の状況について
東京電力によると、ALPS処理水の海洋放出設備について、昨年8月の測定・確認用設備C群の点検開始以降、順次点検を進め、昨年11月に開始した測定・確認用タンクB群の点検が完了し、計画していた点検は全て完了しました。いずれの点検結果においても、放出工程に影響を与える異常は確認されなかったということです。

なお、測定・確認用タンクB群の内面に塗装の膨れや腐食が確認されましたが、タンクの機能への影響はないと評価しており、補修塗装等を実施したそうです。

また、2025年6～7月に予定している2025年度第2回ALPS処理水海洋放出に向け、5月9日から、タンク群の水質の均質化のための循環・攪拌運転を開始し、5月16日に測定・確認用タンクC群から試料が採取されました。今後、採取した試料の分析を行い、ALPS処理水の希釈放出前に放出基準を満足していることを確認していくということです。

〈T2〉固体廃棄物貯蔵庫第10棟の竣工及び10-C棟の運用開始について

廃炉作業で発生した瓦礫類が収納されたコンテナを屋内保管する施設として、2023年3月から、A・B・Cの3棟からなる固体廃棄物貯蔵庫第10棟の設置が順次進められ、A棟は昨年8月、B棟は昨年10月から運用が開始されています。

C棟は、2023年10月から設置工事が開始されていましたが、2025年4月25日付で使用前検査終了証が交付され、運用が開始されました。これにより固体廃棄物貯蔵庫第10棟が全て完成したことになります。

東京電力によると、今後、コンテナを定置するためのベースフレームの設置作業等を行ったうえでコンテナを屋内保管していく予定とのこと。

〈T3〉2号機核燃料デブリサンプル(2回目採取)の非破壊分析結果(速報)について

東京電力は、2回目の核燃料デブリ試験的取り出しにて採取されたサンプルについて、4月25日にJAEA大洗原子力工学研究所へ輸送し、4月28日から非破壊分析を開始しました。

複数個ある燃料デブリサンプルの総重量は0.187gであり、一番大きいサンプルで約5mm×約4mm、試料を容器に収納した状態で測定した線量率は約0.3mSv/h、外観は不均一な形状をしており、全体的には、1回目採取のサンプルより色合いが明るく茶色に近い褐色で、表面の一部に黒色の領域や空孔が認められたということです。

γ線スペクトロメトリの結果、アメリシウム-241が検出されており、燃料成分が含まれることが分かったそうです。

引き続き、非破壊分析を継続し、取りまとめた後に詳細分析(固体分析・溶液分析)を実施する予定だそうです。

〈R2〉1号機原子炉压力容器底部TE-263-69H1温度計の指示値の謎
先月レポートで報告した通り、この温度計の指示値は、2025年3月初めから、他の1号機原子炉压力容器他の温度計指示値と異なる挙動を示しています。

このため東京電力は、3月31日に表記温度計の点検を実施しましたが、当該温度計については、監視計器として使用可能と判断しています。

しかしその後も、この温度計の指示値は、他の温度計指示値とは異なる挙動を示し続けていますが、東京電力からはその理由について格段の発表はありません。

この温度計の指示値の挙動については、[プラント関連パラメータ2 ページ上のグラフの黄緑色の折れ線グラフ](#)をご覧ください。

〈R1〉2号機RPV温度計(TE-2-3-69R)の指示値の謎

この温度計の指示値は、月に数回、1号機・3号機の原子炉、また2号機原子炉内の他の温度計指示値と異なる挙動を繰り返しています。

この温度計の指示値の挙動については、[プラント関連パラメータ3 ページ上のグラフの黒の折れ線グラフ](#)をご覧ください。

この原因について東京電力からはその理由について格段の発表はありません。

詳しくは、[本レポート「2号機TE-2-3-69Rの謎」](#)をご覧ください。

2 プラント関連パラメータ



(更新)

号機	1号機		2号機		3号機	
	4月23日	5月28日	4月23日	5月28日	4月23日	5月28日
原子炉注水状況	給水系：1.4ml/h CS系：0.0ml/h (4/23 11:00 現在)	給水系：1.4ml/h CS系：0.0ml/h (5/28 11:00 現在)	給水系：0.0ml/h CS系：1.5ml/h (4/23 11:00 現在)	給水系：0.0ml/h CS系：1.5ml/h (5/28 11:00 現在)	給水系：1.9ml/h CS系：1.9ml/h (4/23 11:00 現在)	給水系：1.8ml/h CS系：1.9ml/h (5/28 11:00 現在)
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：19.1℃ VESSEL ABOVE SKIRT JOINT (TE-263-69H1)：12.6℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：19.1℃ (4/23 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：22.1℃ VESSEL ABOVE SKIRT JOINT (TE-263-69H1)：18.6℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：22.1℃ (5/28 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：24.0℃ RPV Temperature (TE-2-3-69R)：27.0℃ (4/23 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：27.1℃ RPV Temperature (TE-2-3-69R)：30.7℃ (5/28 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOINT (TE-2-3-69F1)：19.2℃ VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H1)：18.2℃ (4/23 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOINT (TE-2-3-69F1)：23.4℃ VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H1)：22.0℃ (5/28 11:00 現在)
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：19.2℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：18.8℃ (4/23 11:00 現在)	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：21.9℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：21.7℃ (5/28 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：24.2℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1)：24.4℃ (4/23 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：27.2℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1)：27.4℃ (5/28 11:00 現在)	PCV Temperature (TE-16-002)：16.9℃ SUPPLY AIR D/W COOLER (TE-16-114F#1)：17.6℃ (4/23 11:00 現在)	PCV Temperature (TE-16-002)：20.8℃ SUPPLY AIR D/W COOLER (TE-16-114F#1)：21.3℃ (5/28 11:00 現在)
原子炉格納容器 圧力	0.08kPa g (4/23 11:00 現在)	0.08kPa g (5/28 11:00 現在)	1.14kPa g (4/23 11:00 現在)	3.84kPa g (5/28 11:00 現在)	0.53kPa g (4/23 11:00 現在)	0.53kPa g (5/28 11:00 現在)
空素封入流量 ※1	RPV (RVH-A)：-Nml/h RPV (RVH-B)：16.00Nml/h (JP-A)：14.27Nml/h (JP-B)：-Nml/h PCV：-Nml/h ※2 (4/23 11:00 現在)	RPV (RVH-A)：-Nml/h RPV (RVH-B)：17.09Nml/h (JP-A)：15.41Nml/h (JP-B)：-Nml/h PCV：-Nml/h ※2 (5/28 11:00 現在)	RPV-A：5.98Nml/h RPV-B：5.95Nml/h PCV：-Nml/h ※2 (4/23 11:00 現在)	RPV-A：6.46Nml/h RPV-B：6.46Nml/h PCV：-Nml/h ※2 (5/28 11:00 現在)	RPV-A：6.57Nml/h RPV-B：6.47Nml/h PCV：8.51Nml/h (4/23 11:00 現在)	RPV-A：7.00Nml/h RPV-B：6.98Nml/h PCV：8.79Nml/h (5/28 11:00 現在)
原子炉格納容器 水素濃度 ※3	A系：0.00vol% B系：0.01vol% (4/23 11:00 現在)	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (5/28 11:00 現在)	A系：0.05vol% B系：0.04vol% (4/23 11:00 現在)	A系：0.11vol% B系：0.07vol% (5/28 11:00 現在)	A系：0.23vol% B系：0.23vol% (4/23 11:00 現在)	A系：0.11vol% B系：0.10vol% (5/28 11:00 現在)
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135)	A系：1.40E-03Bq/cm B系：1.68E-03Bq/cm (4/23 11:00 現在)	A系：1.59E-03Bq/cm B系：1.38E-03Bq/cm (5/28 11:00 現在)	A系：ND(1.2E-01Bq/cm以下) B系：ND(1.2E-01Bq/cm以下) (4/23 11:00 現在)	A系：ND(1.2E-01Bq/cm以下) B系：ND(1.2E-01Bq/cm以下) (5/28 11:00 現在)	A系：ND(1.9E-01Bq/cm以下) B系：ND(1.8E-01Bq/cm以下) (4/23 11:00 現在)	A系：ND(1.9E-01Bq/cm以下) B系：ND(1.8E-01Bq/cm以下) (5/28 11:00 現在)
使用済燃料 プール水温度	25.6℃ (4/23 11:00 現在)	24.2℃ (5/28 11:00 現在)	21.7℃ (4/23 11:00 現在)	22.9℃ (5/28 11:00 現在)	-℃ ※5 (4/23 11:00 現在)	-℃ ※5 (5/28 11:00 現在)
FPC 貯蔵タンク 水位	2.37m (4/23 11:00 現在)	5.34m (5/28 11:00 現在)	3.01m (4/23 11:00 現在)	2.68m (5/28 11:00 現在)	4.17m (4/23 11:00 現在)	3.05m (5/28 11:00 現在)
号機	4号機		5号機		6号機	
	4月23日	5月28日	4月23日	5月28日	4月23日	5月28日
使用済燃料 プール水温度	-℃ ※4 (4/23 11:00 現在)	-℃ ※4 (5/28 11:00 現在)	16.7℃ (4/23 11:00 現在)	21.3℃ (5/28 11:00 現在)	15.1℃ (4/23 11:00 現在)	17.3℃ (5/28 11:00 現在)
FPC 貯蔵タンク 水位	3.97m (4/23 11:00 現在)	2.83m (5/28 11:00 現在)	4.60m (4/23 11:00 現在)	2.62m (5/28 11:00 現在)	2.60m (4/23 11:00 現在)	2.70m (5/28 11:00 現在)
※1: 使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する。 ※2: 空素封入停止中。 ※3: 指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計器精度によりマイナス表示される場合があるため) ※4: 4号機は使用済燃料の取り出しが完了しており、温度監視は不要。 ※5: 3号機は使用済燃料の取り出しが完了しており、温度監視は不要。						

3 原子炉内の温度

[\(更新\)](#)


東京電力によると、注水冷却を継続することにより、原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度は、号機や温度計の位置によって異なるものの、下に引用したグラフのとおり推移しています。

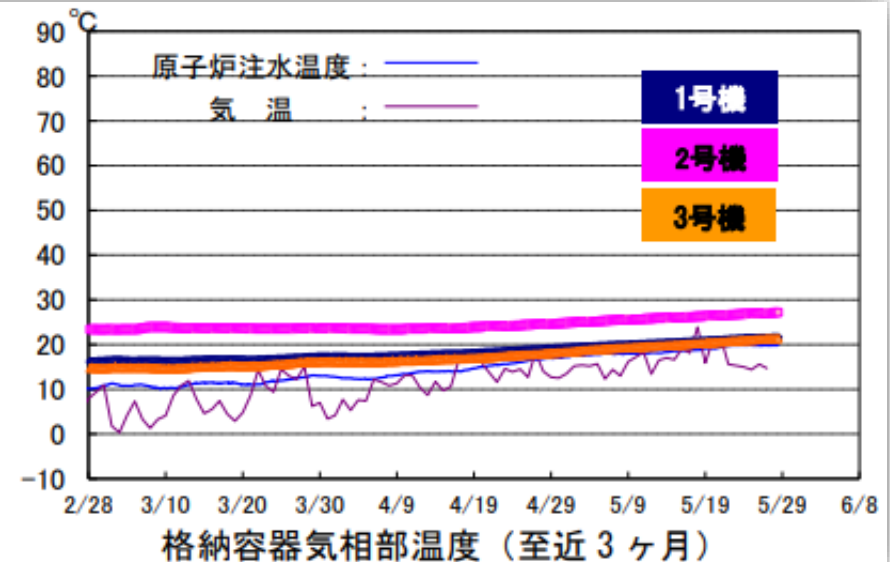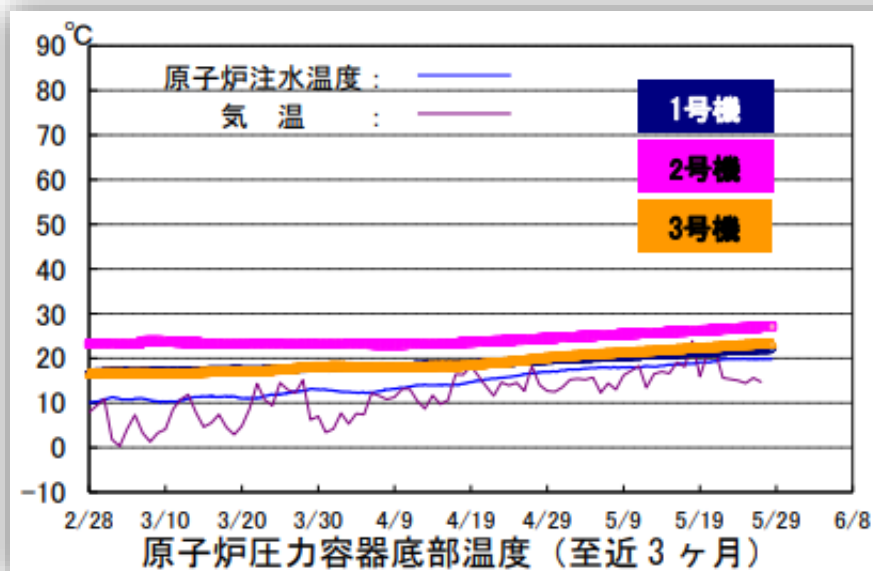

4 (1) 原子炉建屋から放出された放射性物質による外部汚染の程度 (更新)


東京電力によると、2025年4月における1～4号機原子炉建屋からの追加的放出線量の算定値は、 1.3×10^4 Bq/h 未満(前月 2.0×10^4 Bq/h未満)と放出管理の目標値 (5.5×10^6 Bq/h)を下回っています。そして、この算定値による敷地境界における空气中放射性物質濃度は、Cs-134: 8.4×10^{-12} (前月 1.1×10^{-11} Bq/cm³)、Cs-137: 7.2×10^{-12} Bq/cm³ (前月 1.1×10^{-11} Bq/cm³)であり、当該値が1年間継続した場合、敷地境界における被ばく線量は、年間 3.0×10^{-5} mSv 未満(前月 4.0×10^{-5} mSv 未満)であり、管理目標値年間1 mSvを満足する気体放出による評価値 8.8×10^{-3} mSvより十分小さいと推定しています。

1～4号機原子炉建屋からの放射性物質(セシウム)の放出による敷地境界における年間被ばく線量評価
(トレンドグラフ)

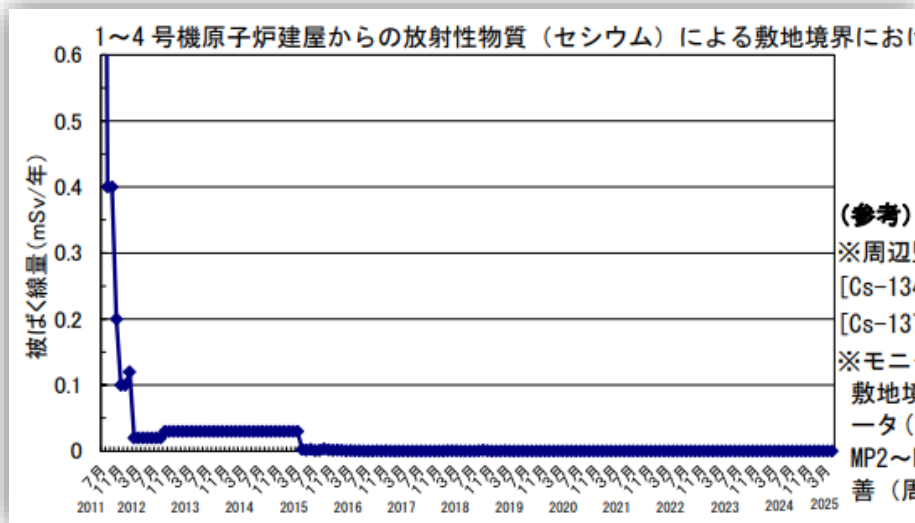

1～6号機原子炉建屋からの放射性物質(セシウム)の放出による敷地境界における被ばく線量評価の年間推移

※ 筆者注: こちらは対数グラフです

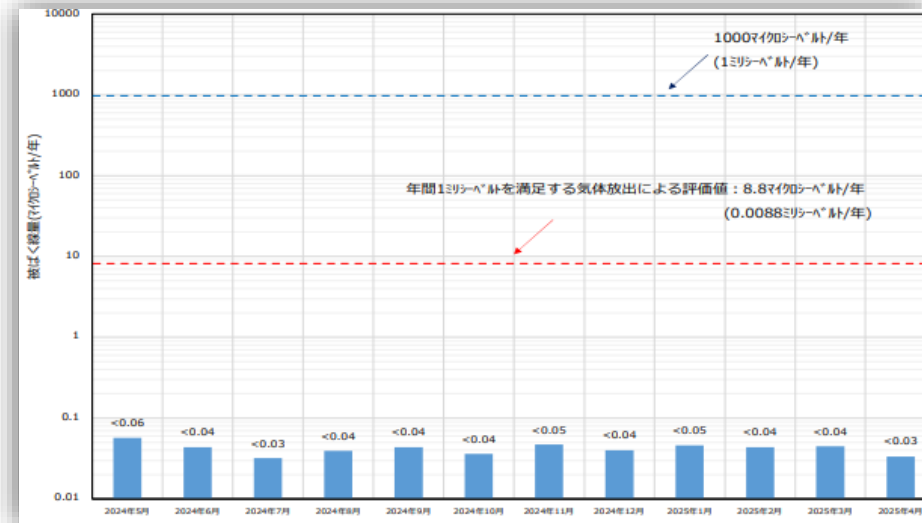

出典: 出典: 2025年5月29日 廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第138回)資料「廃炉・汚染水・処理水対策の概要」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2025/05/05/2-1.pdf>

: 2025年5月29日 廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第138回)資料「1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果(2025年4月)」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2025/05/05/3-6-3.pdf>

概要に戻る

2 (2) 「1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果」の変更について

東京電力は、2019 年 11 月、1～4号機原子炉建屋からの放射性物質の追加的放出量の評価方法、および評価結果のグラフの記述内容を変更しました。東京電力による変更点、および変更の理由は以下の通りです。

・ 放出による敷地境界の空气中放射性物質濃度(単位:Bq/時)⇒敷地境界の被ばく線量(単位: μ Sv/年)

(理由)一般公衆が放出の影響を理解しやすくする。

・被ばく線量評価の計算手法:5、6号機の寄与(年間稼働率80%の運転時の推定放出量で評価したもの)を一律加算する⇒測定結果を元にした被ばく線量を評価する。

(理由)これまで被ばく線量は、1～4号機追加的放出量の被ばく線量評価に、5、6号機からの影響を一定値(運転時の想定放出量から評価:約0.17 μ Sv/年)加算していた。この方法によると、最近では5、6号機の割合が大き(約80%)、1～4号機の放出による影響がわかりにくくなっていた。実態により近づけるため、5、6号機も測定結果を元にした被ばく線量を評価し、検出された場合は、1～4号機による被ばく線量評価に加算することとする。


下左はこれまでの評価方法および記述内容による2018年10月からのグラフ、下右が新たな方法による2018年11月からの評価のグラフです。

1-6号原子炉建屋からの放出量評価、2019年9月までの評価方法で、その直近12か月分



1-4号原子炉建屋からの被ばく線量評価、2019年10月改訂の評価方法で、その直近12か月分

※ 筆者注: いずれも対数グラフ。

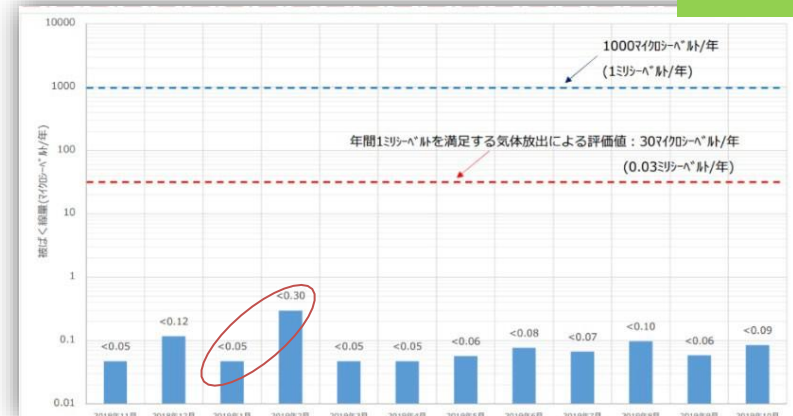

概要に戻る

出典：2019年11月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第72回） 資料「「1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果」の変更について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/11/3-6-2.pdf>

2019年11月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第72回） 資料「1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果（2019年10月）」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/11/3-6-3.pdf>

5 その他の指標

(更新)

東京電力によると、**2025年4月23日から5月28日までの1か月**、格納容器内圧力や、臨界監視のための格納容器放射性物質濃度(Xe-135)等のパラメータについても有意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていません。

※ 筆者注：

Xe-135（キセノン135）はウラン燃料が核分裂をした時に生じる放射性物質で、半減期は極めて短く約9時間です。このためXe-135が増加したままになるのは、ウランの核分裂が継続して起きているときであり、臨界に達していると考えられます。

6 原子炉格納容器循環注水冷却(の停止)


(1) 循環注水冷却の経過

1～3号機の原子炉は、注水冷却を継続することにより、現在は一定の範囲内の温度を保ち安定状態にあります。事故直後は、この注水冷却の水源は大熊町の坂下ダムに求めていました。

しかしこれでは原子炉内で核燃料デブリ等に接触し放射能で汚染された水が増えるばかりであることから、2011年6月から新設のバッファタンク(浄化水を一時的にためておくタンク)を水源とする循環注水に移行しました。さらに2013年7月からは水源の保有水量の増加・耐震性・耐津波性を向上させるため、水源を3号機復水貯蔵タンク(CST)に切り替えました。

そして2016年3月には1号機タービン建屋が循環注水冷却ラインから切り離され、10月には、汚染水の漏えいリスクを低減するため、淡水化(RO)装置を4号機タービン建屋に設置し、循環ループを約3kmから約0.8kmに縮小し現在に至っています。

(現在の循環注水冷却ラインの概念図)

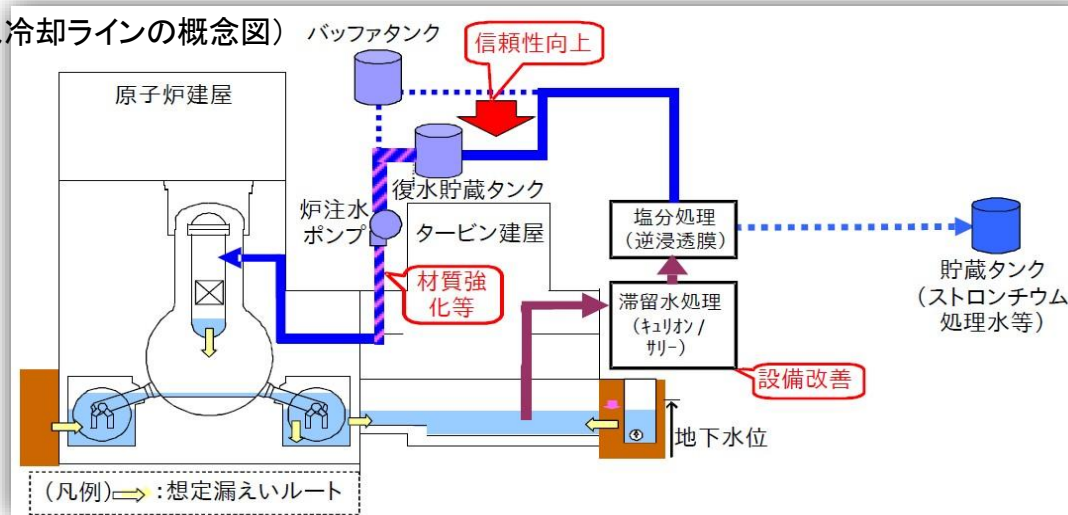

出典：2018年3月1日廃炉・汚染水対策チーム会合事務局会議資料「廃止措置等に向けた進捗状況：循環冷却と滞留水処理ライン等の作業」
<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/03/2-00-04.pdf>

2016年3月31日東京電力株式会社

「1号機タービン建屋の循環注水ラインからの切り離し達成について～原子炉建屋からタービン建屋へ滞留水が流入しない状況の構築～」

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images1/images1/d160331_06-j.pdf

[概要に戻る](#)


(2) 循環注水冷却の今後

原子炉注水冷却ラインの縮小という課題については、ロードマップ(第4版)では「核燃料デブリ取り出しのための原子炉格納容器の止水・補修作業を開始するまでに、原子炉格納容器からの取水方法を確立する。その上で、原子炉注水冷却ラインの小循環ループ化(格納容器循環冷却)を図る」とされていました。

第5版においては「循環注水を行っている1～3号機については、タービン建屋等を切り離した循環注水システムを構築した上で、原子炉建屋の水位低下等により、原子炉建屋から他の建屋へ滞留水が流出しない状況を構築する」となっています。

2017年12月の3・4号機間の連通部の切り離しに続き、2018年9月13日には1号機側、2号機側の建屋内に溜まっている汚染水の水位が1号機廃棄物処理建屋の床面(T.P.-36)を下回り、その後も安定して床面以下の水位を保っていることから、東京電力は1・2号機間の連通部について切り離しを達成したと判断しました。

【1・2号機の建屋床面レベル、建屋間連通部及び滞留水の水位(2018.9.13現在)】

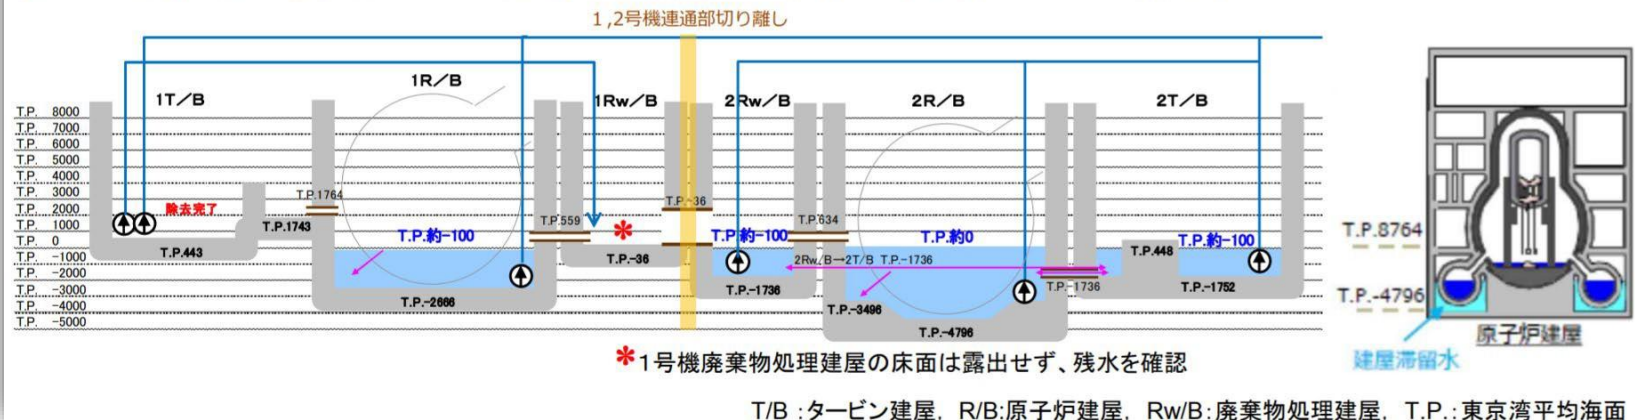

出典：2015年6月12日廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(第4版)

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2015/pdf/0625_4_1c.pdf

2017年9月26日廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(第5版)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hairo_osensui/dai3/siryousu2.pdf

画像出典：2018年9月27日第58回廃炉・汚染水対策チーム会合事務局会議資料

「建屋滞留水処理の進捗状況について(1,2号機間及び3,4号機間の連通部の切り離し達成)」

<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-1-3.pdf>

概要に戻る

(3) 2系統ある注水冷却系のうち1系統の試験的停止について

格納容器内にある使用済み核燃料および核燃料デブリは、炉心スプレイ系(CS系)と給水系(FDW系)という2系統の循環注水冷却系によって冷却されています(下図参照)。



東京電力は、原子炉注水設備に関する信頼性向上を目的として、以下の改造工事を計画・実施しています。

- ①1～3号機炉心スプレイ系(CS系)注水ラインの一部PE管化(2018)
- ②2, 3号機給水系(FDW系)注水ライン他の改造(2017)
- ③処理水バッファタンク取替(2018～2019)

②の2, 3号機給水系(FDW系)注水ライン他の改造の際は、原子炉への注水をCS系のみで実施することになり、2017年11月の注水量3.0 m³/hでCS系単独注水の実績がないことから、東京電力は、CS系単独注水事前確認試験を行い原子炉の冷却状態に対する影響を確認しました。

CS系単独注水は、2号機では2017年10月31日～11月7日まで、3号機では11月14日～11月21日まで実施されました。

試験期間において、監視パラメータとしていた原子炉圧力容器底部温度、格納容器温度、格納容器ガス管理設備ダストモニタの指示値に「CS系単独注水に切り替えたこと」に伴う有意な変化はなく、原子炉の冷却状態に異常はないものと推定されています。

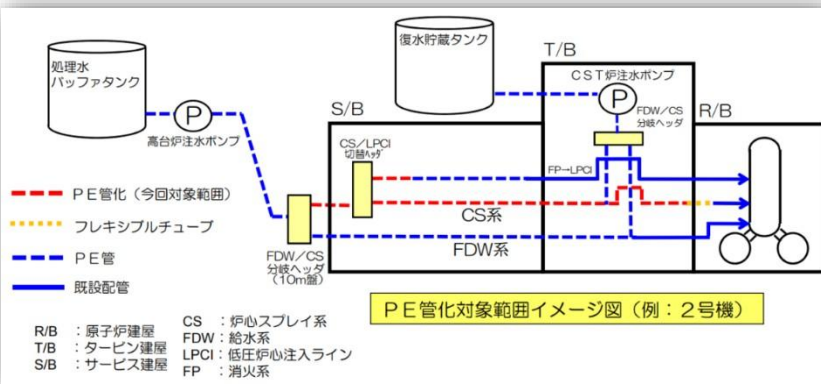

CS系SUSフレキシブルチューブの曲がりの状態



新規PE管施工後

出典：2017年11月30日第48回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料「1～3号機原子炉注水設備の改造工事について」

<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/10/3-05-02.pdf>

2017年11月30日第48回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料

「2, 3号機 給水系注水ライン改造に伴うCS系単独注水の影響確認試験の実施状況について」

<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/11/3-05-04.pdf>

概要に戻る

(4) 原子炉格納容器循環注水冷却(の停止) 第 I 期

① 1号機核燃料デブリ冷却状況の確認の実施について

東京電力は、1号機において緊急時対応手順の適正化などを図ることを目的に、原子炉注水を2日程度(約48時間)停止する試験を2019年10月15日から開始することを発表しました。注水停止時の温度上昇率については、48時間の注水停止で最大8.7℃程度の温度上昇と予測しています。なお、注水停止時および再開時の監視パラメーターと判断基準、基準逸脱時の対応(次ページ)については以下のように発表しています。

2020注水停止試験に戻る

また、今後3号機についても、今年度中を目途に注水停止試験を実施する予定としています。

地震のイチエフへの影響に戻る

(1) 冷却状態の監視(注水量停止時)

監視パラメータ	監視頻度		注水停止時の判断基準
	注水停止中	(参考) 通常監視頻度	
原子炉圧力容器底部温度	毎時	毎時	温度上昇が15℃未満 ※1
原子炉格納容器内温度	毎時	6時間	温度上昇が15℃未満 ※1
原子炉への注水量	毎時	毎時	原子炉に注水されていないこと
格納容器ガス管理設備 ダストモニタ	毎時	6時間	有意な上昇が継続しないこと

※1 15℃以上の温度上昇があった際には、流量を1.5m³/hに増やす(注水を再開する)。

(冬季のRPV/PCV温度は概ね30℃未満であり、15℃の温度上昇でも45℃未満と想定)

(2) その他の傾向監視パラメータ

・原子炉圧力容器上部温度、格納容器圧力、格納容器内水位

(1) 冷却状態の監視(注水量増加時)

・注水変更操作から24時間の監視強化とし、冷却状態に異常が無い場合には、24時間以降は通常頻度での監視に移行。

監視パラメータ	監視頻度		注水再開時の判断基準
	操作後24時間	24時間以降 (通常監視頻度)	
原子炉圧力容器底部温度	毎時	毎時	温度上昇が15℃未満※1
原子炉格納容器内温度	毎時	6時間	温度上昇が15℃未満※1
原子炉への注水量	毎時	毎時	(必要な注水量が確保されていること)
格納容器ガス管理設備 ダストモニタ	6時間	6時間	有意な上昇が継続しないこと

※1 注水変更後、10℃以上の温度上昇があった際には、関係者間で情報共有・監視強化を継続する。

(2) 未臨界状態の監視

・注水変更操作から24時間は速やかにホウ酸水を注入できる体制を維持

監視パラメータ	監視頻度		注水再開時の判断基準
	操作後24時間	24時間以降 (通常監視頻度)	
格納容器ガス管理設備 Xe-135濃度	毎時	毎時	通常値の10倍未満であること※2

※2 Xe-135の通常値は1号機は1.0×10⁻³Bq/cm³程度である。連転上の制限である1Bq/cm³に余裕があっても、2系同時に上昇した場合には、確実な未臨界維持のためホウ酸水を注入する。(片系のみ場合は、計器故障の可能性も含めて判断する)

(3) その他の傾向監視パラメータ

・原子炉圧力容器上部温度、格納容器内水位

出典：2019年9月26日 廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第70回) 資料

「福島第一原子力発電所 1号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/09/3-5-2.pdf>

概要に戻る

a 1号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果(速報)について

東京電力によると、2019年10月15日～10月17日の期間、約49時間注水を停止しました。試験期間中の炉内状況は安定して推移し、原子炉圧力容器(RPV)底部温度や原子炉格納容器(PCV)温度の温度上昇量は小さかったということです。

また、ダスト濃度や希ガス(Xe135)等のパラメータにも異常はありませんでした。

今後、実際の温度上昇と予測との差異や、温度計の挙動の違い、PCV水位の変動、原子炉注水停止前後に採取した放射線データなどを評価する予定だそうです。

さらに、3号機についても、今回の試験結果をふまえ、2019年度中を目途に実施する予定としています。





参照

最大温度上昇量		
	RPV底部	PCV
注水停止中 (10月15日11:00～10月17日12:00)	0.2℃	0.6℃
試験期間中 (10月15日11:00～10月30日14:00時点)	0.4℃	0.7℃

監視パラメータ		判断基準を満たさない場合の対応
原子炉への注水量		目標注水量を目安に、原子炉注水量を調整する
冷却状態の監視	原子炉圧力容器底部温度	1.5m³/hで原子炉注水を再開する。 - 注水再開/注水増加によってパラメータに安定傾向がない等の場合には、さらなる注水量の増加等の措置を関係者で協議する。 (温度上昇が急であり、1m³/hを超える注水量の急増が必要と判断される場合にはホウ酸水を注入したうえで、注水量を増加する)
	原子炉格納容器内温度	
	格納容器ガス管理設備ダストモニタ	
未臨界状態の監視	格納容器ガス管理設備希ガスモニタ	- ホウ酸水を注入する。 - ホウ酸水を注入しても未臨界維持の見込みがない場合は、注水量を低減する等の措置を関係者で協議する。


b 1号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について

試験中の原子炉圧力容器(RPV)各部、格納容器(PCV)の温度データは下図のように発表されています。

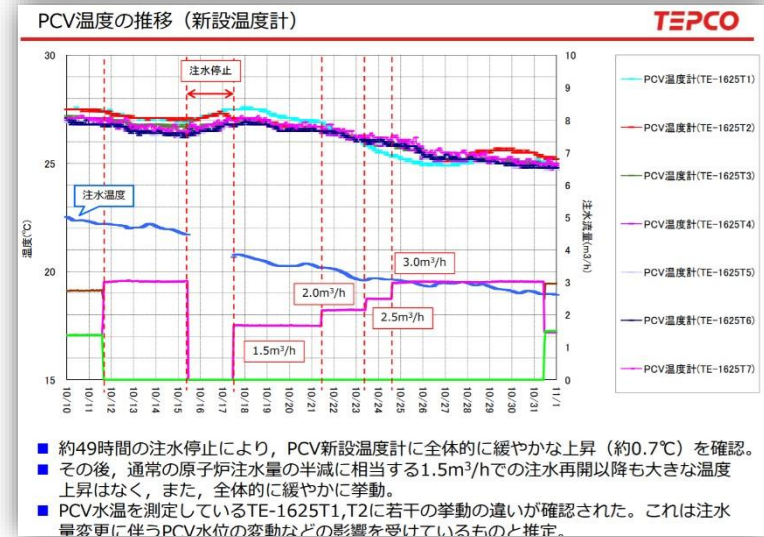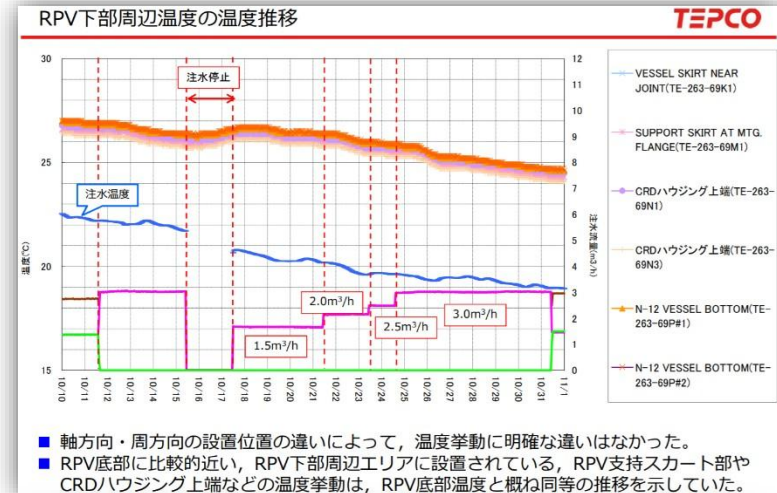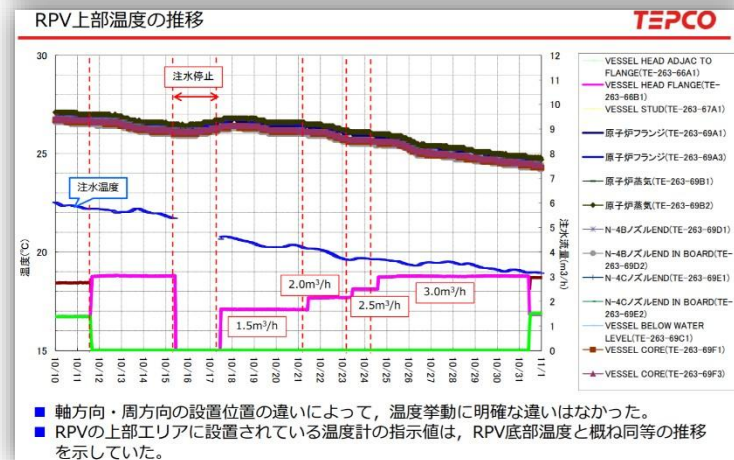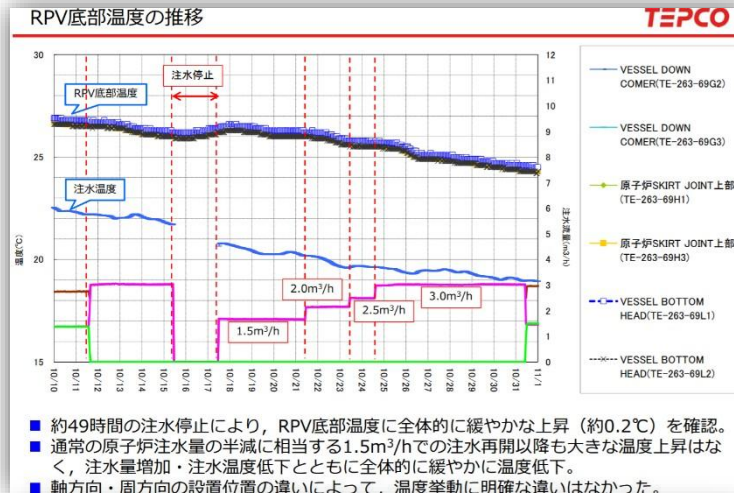


(次ページに続く)

試験期間中、格納容器(PCV)水温が興味深い挙動を示し、東京電力は考察を加えています(下図)。

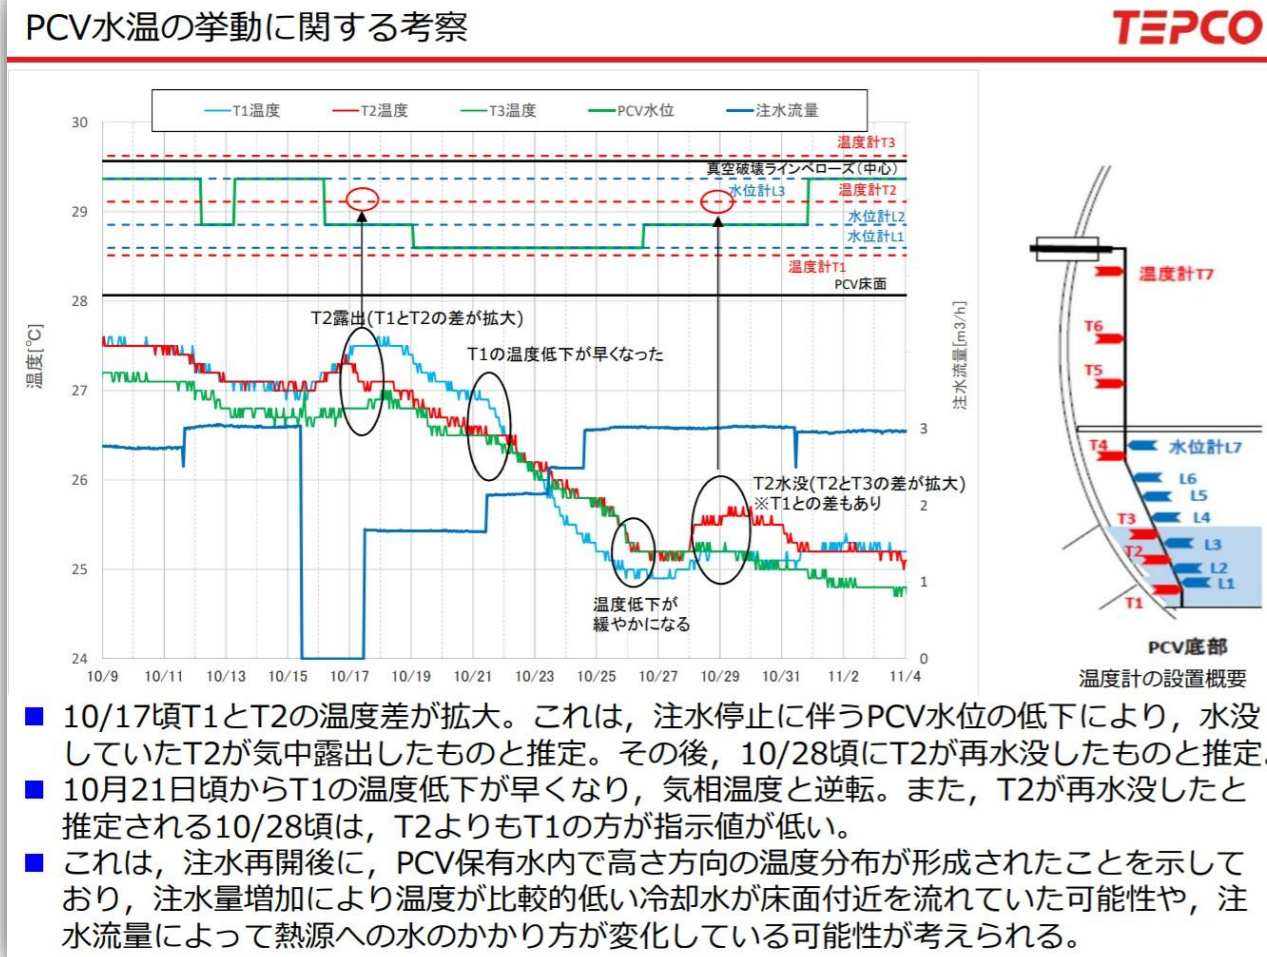

(次ページに続く)

また、原子炉内の熱源（核燃料デブリ）の所在をどう想定するかによって、冷却状態の推移に伴う原子炉圧力容器（RPV）の熱バランス式による推定温度と実際の測定温度との乖離の度合いが変わってきます（下図）。

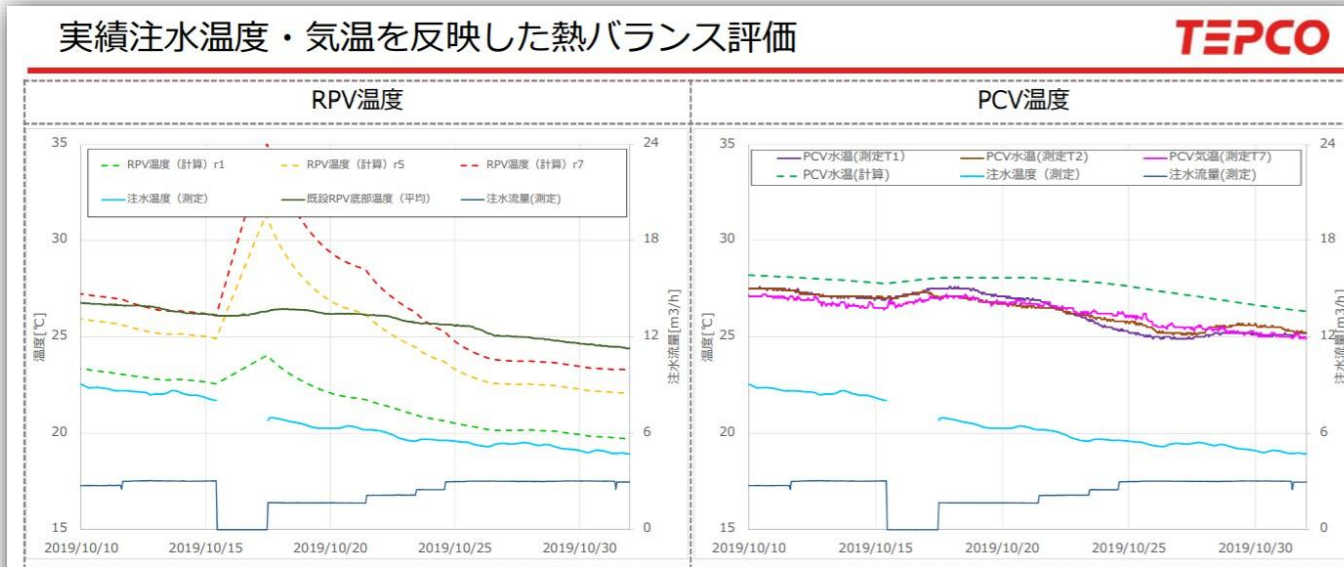

- 季節変化による気温の低下とともに注水温度が低下しており、全体的に温度は低下傾向。
- RPV底部温度について、RPVに存在する熱源の量が少ないと仮定した評価ケース（r1）では、全体的に温度を低めに評価する傾向。一方、RPVに存在する熱源を多く設定すると、温度評価は温度計指示に近づくが、注水停止時の温度上昇を過大に評価する傾向。
- PCV温度は概ね実績温度を再現している一方で、PCV水温と気温の違いなど、局所的な温度変化まではモデル上考慮しておらず、再現できていない。また温度上昇時の傾きは概ね一致したものの、注水再開以降の温度低下傾向が実績よりも評価の方が遅い傾向がある。

（次ページに続く）

このような熱バランス式による推定温度と実際の温度との乖離が生じる原因を、東京電力は下図の通り考察し、熱バランス式の改良も検討するとしています。

熱バランス評価に関する考察

TEPCO

- 熱バランスモデルと実際の測定値に差異が生じる原因として、以下のような1号機のプラントの特徴が影響している可能性が考えられる。
 - (1) PCV保有水量が多いこと（PCV水位が高いこと）
 - PCV保有水量の違いは、PCV全体の熱容量の大きさに影響するため、PCV温度の過渡変化時の時定数に影響する可能性。
 - PCV保有水量が多いことにより、液相内での温度分布が発生しやすくなる可能性。
 - ペDESTAL内やPCV底部における燃料デブリの水没状態の違いにより、燃料デブリから冷却水への伝熱量に差異がある可能性。
 - (2) 燃料デブリの大部分がPCV側に存在（推定）
 - 現状モデルでは多くの熱源が存在するPCV側の熱収支計算で、PCV気相温度を計算しておらず、気相/液相の温度分布や、PCV気相を介したRPVとPCVの熱伝達が適切に計算出来ていない可能性がある。
 - (3) 温度測定の不確かさ
 - 温度計は周方向・高さ方向に複数設置されているものの、設置位置によっては、細かい温度分布を観測できていない可能性。
 - 既設温度計は事故の影響により絶縁が低下しており、指示値に不確かさがある。(最大20℃程度) なお、PCVには、事故後に新しく温度計を設置している。
- これらの特徴は3号機にも共通しており、今後の3号機の試験においても類似の傾向となる可能性がある。3号機の試験結果も踏まえモデルの改良を検討していく。

② 2号機CS系のPE管化工事に伴う 核燃料デブリ冷却状態への影響について

東京電力によると、2号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系(CS系)ラインについて、信頼性向上の観点から、ステンレス製(SUS)フレキシブルチューブをポリエチレン管(PE管)に取り替える工事を実施しました。

工事中、2017年12月8日～12月25日の期間は給水系(FDW系)単独での運転となりましたが、8月22日～8月29日においてFDW系による単独注水試験を実施しており、当該運転状態でも核燃料デブリ(以下、デブリ)の冷却状態に問題がみられないことは事前に確認済みでした。

この工事によるデブリ冷却状態への影響については、監視パラメータとしていた原子炉圧力容器底部温度、格納容器温度、格納容器ガス管理設備ダストモニタのいずれの指示値も、FDW系単独注水に切り替え時、さらにPE管化したCS系を運用開始後にも有意な変化はなく、原子炉の冷却状態に異常がないことが確認されたとのこと。

筆者注:CST = 復水貯蔵タンク



出典：2018年2月1日第50回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料「2号機 CS系のPE管化工事に伴う燃料デブリ冷却状態への影響について」

<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/02/3-05-04.pdf>

2017年9月28日第46回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料

「2, 3号機 原子炉注水ラインのPE管化工事に伴うFDW系単独注水の影響確認試験の実施状況について」

<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/3-05-03.pdf>

概要に戻る

a 2号機復水貯蔵タンク(CST)を水源とする

注水冷却開始(インサービス)に向けた原子炉注水系の切替について

2020年2月27日の廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議(第75回)において、東京電力が提出した資料「2号機CSTインサービスに向けた原子炉注水系の切替について」を開いたところ、冒頭に

原子炉注水系統の水源多重化を図るため、2019年1月8日、2号機CST(復水貯蔵タンク)を復旧し、原子炉注水の水源として使用する操作を実施中、2号機原子炉注水ポンプ(CST炉注水ポンプ)が全停する事象が発生した。

という記述がありました。

しかし筆者はこのトラブルについて押さえていなかったため、今回2019年1月にさかのぼり、下記出典の東京電力資料により、このトラブルとその後の経過を追ってみました。

まず一連の過程の目的である2号機CSTインサービスとは何かというところから始めます。

(次ページに続く)

出典：2019年1月8日東京電力ニュースリリース「福島第一原子力発電所 2号機原子炉への注水ポンプの起動・停止について」
http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190108_1.pdf

2019年1月31日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議(第62回)東京電力資料「2号機CST炉注ポンプ全停事象について」
<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-3.pdf>

2019年2月28日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議(第63回)東京電力資料「2号機CST炉注ポンプ全停事象の原因と対策について」
<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/02/3-5-3.pdf>

2019年8月29日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議(第69回)東京電力資料「2号機CSTインサービスに向けた原子炉注水系の切替について」
<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/08/3-5-3.pdf>

2020年2月27日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議(第75回)東京電力資料「2号機CSTインサービスに向けた原子炉注水系の切替について」
<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/02/3-5-4.pdf>

概要に戻る


東京電力によれば、2号機復水貯蔵タンク(CST)を水源とする注水冷却開始(インサービス)およびその背景と目的とは、

- ・ 現在、1～3号機の原子炉内には安定的に注水を継続しているが、燃料デブリの崩壊熱は大幅に減少している状況
- ・ 崩壊熱の減少により1～3号機の原子炉注水量を低減してきており、滞留水の低減を図っている。
- ・ それに伴い現在の原子炉注水流量は、ポンプの定格流量に比べ少ない流量になっており、系統上の運用としては、CSTへの戻し流量が多い状態となっている。
- ・ 2号機CSTを復旧し原子炉注水の水源として運用することで、原子炉注水系統全体の運用(原子炉注水量や戻し流量の調整等)がしやすくなる。
- ・ また、2号機CSTの運用を開始することで、原子炉注水系統の水源の多重化が図れる。

だそうです。

概念的には下左図の状態を右図の状態に持っていく計画です。

(次ページに続く)

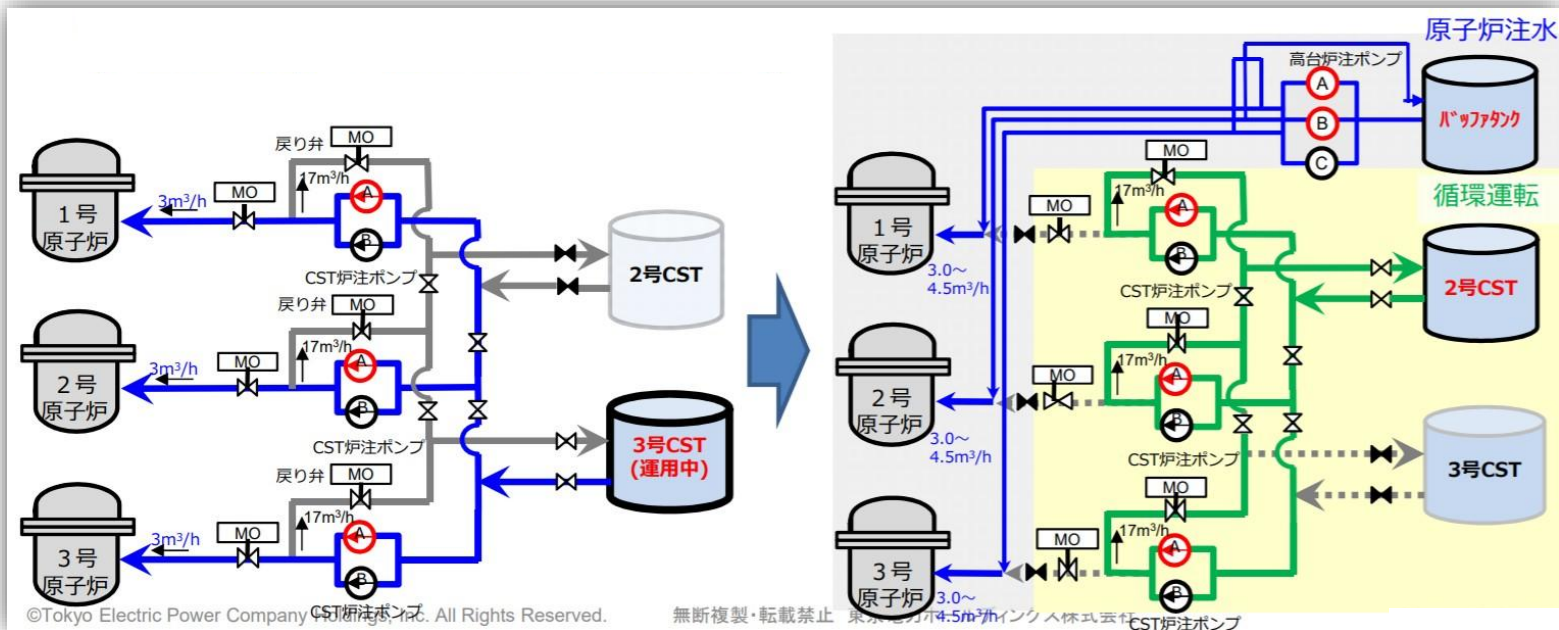

概要に戻る

ところが、2019年1月8日、2号機復水貯蔵タンク(CST)を水源とする注水冷却開始(インサービス)に向けて1、2号機原子炉への注水源を3号機復水貯蔵タンクから2号機CSTへ変更する操作をしていたところ、2号機原子炉注水ポンプが1分間全停しました。

東京電力は、直ちに操作前の状態へ戻す操作を実施し、注水冷却そのものは継続されています。また、注水ポンプ全停中、原子炉圧力容器、格納容器各部の温度、モニタ等の指示に変化はなかったとのことです。

その後東京電力は、原因を調査し、その結果について以下のように公表しました。

- ・全号機のポンプストレーナに水垢(赤茶)の付着が確認されており、吸込圧力の低下が確認された2号機 CST炉注ポンプ(B)のみストレーナこし網内面に鉄さび片の付着が確認された。また、フランジ部にもこし網より落下した鉄さび片が確認された。

- ・現在までの運転により水垢などがストレーナに付着し、その影響で若干の詰まりが発生していた状態で、今回、2号機CSTインサービス操作により、鉄さびがストレーナに流入したため、急激に圧損が増加し、ポンプ吸込圧力が低下したと考えられる。

(次ページに続く)

また再発防止対策については以下の通りとしています。

＜対策①:フラッシングの実施＞

配管内面の鉄さびを仮設ストレーナにて回収するため、2号機CST⇒CST供給配管⇒CST戻り配管のフラッシング運転を行う。なお、未使用配管をインサービスする場合は、事前のフラッシングを行うこととする。

＜対策②:ポンプ吸込ストレーナの点検＞

1～3号機のCST炉注ポンプ吸込ストレーナ清掃を行い、ストレーナに堆積した水垢、鉄さびの除去を行う。ストレーナの点検は、ポンプ吸込圧力の低下傾向が確認された場合に行うこととしていたが、本事象を鑑みストレーナの保全計画を見直すこととする。

＜対策③:2号機CSTインサービス時の手順の再検討＞

急激にパラメータが変化した場合に備えた対応手順を策定する。(パラメータの安定後の操作、戻り弁の調整・ポンプ切替手順等)

そして対策を実施後の2019年8月、2号機復水貯蔵タンク(CST)を水源とする注水冷却開始(インサービス)に向けて、1～3号機CST炉注系統を2号機CST循環運転に切り替え、

①2号CSTを水源とした場合の異常の有無。(各号機の流量・圧力バランス)

②ポンプ切替による2台運転時の影響確認。(戻り弁(MO,手動バイパス)開度とポンプ吐出圧力の状態等)

の運転状態を確認する計画を明らかにしました。

毎月の「循環注水冷却スケジュール」を見ると、その後実施時期の調整による複数回の延期があり、今回改めて、2020年3月3日から5日にかけて1～3号機CST炉注系統を2号機CST循環運転に切り替え、運転状態を確認した上で、3月下旬には2号機CSTを水源とする注水冷却を開始したいとしています。

③ a 2号機核燃料デブリ冷却状況の確認の実施について

2号機核燃料デブリ(以下、デブリ)の循環注水冷却は新しい段階に入るようです。

2019年3月現在、1～3号機の原子炉内はデブリへの循環注水冷却により安定状態を保っています。

一方、デブリの崩壊熱は時間の経過により大幅に減少しています。

また、注水冷却が停止した場合の現行の原子炉の温度変化の推定(評価)については、自然放熱による温度低下等は考慮せず、デブリの崩壊熱のみを考慮して計算しているため、実際より急激に上昇する推定(評価)となっています。

(現行の推定(評価)／温度上昇率:約5℃/時間、原子炉圧力容器温度の初期温度を30℃と仮定して運転上の制限値である80℃に達する時間:約10時間)

東京電力は、今後、何らかの原因により原子炉に注水冷却の停止を含む多重トラブルが発生した場合、優先すべき対応を適正に判断するために、また、注水設備のポンプ切替時等に、注水量に極力変化がないようにするための現行の複雑な操作を、ヒューマンエラーリスクの低い2系統のうち片方を止めた上でもう片方を起動するというシンプルな切替に見直すために、注水冷却が停止した状態でのより実際に近い温度変化を確認しておく必要があるとしています。

(熱バランスによる推定(評価)／温度上昇率:約0.2℃/時間、原子炉圧力容器温度の初期温度を30℃と仮定して運転上の制限値である80℃に達する時間:約12日)

このため、一時的に原子炉注水量を低減(STEP1)、停止(STEP2)し、デブリの冷却状況の実態を把握するとともに、気中への放熱も考慮したより実態に近い温度変化の推定(熱バランス評価)の正確さを確認する試験を、2019年1月に実施することを計画していました。

この計画は、2号機原子炉注水ポンプ(CST炉注ポンプ)が1分間全停するトラブルがあったため延期されていましたが、原因が解明され健全性が確認されたため4月に実施するものです。

1～3号機確認試験の結果のまとめに戻る

(次ページに続く)

出典: 2019年3月20日 東京電力資料「福島第一原子力発電所 2号機燃料デブリ冷却状況の確認の実施について」


http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190320_1.pdf

2019年3月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第64回) 資料「2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/03/3-5-2.pdf>

概要に戻る

操作手順、および、2号機の注水量を低減するために1、3号機の原子炉注水量を増加させる操作が必要な理由は下図の通りです。

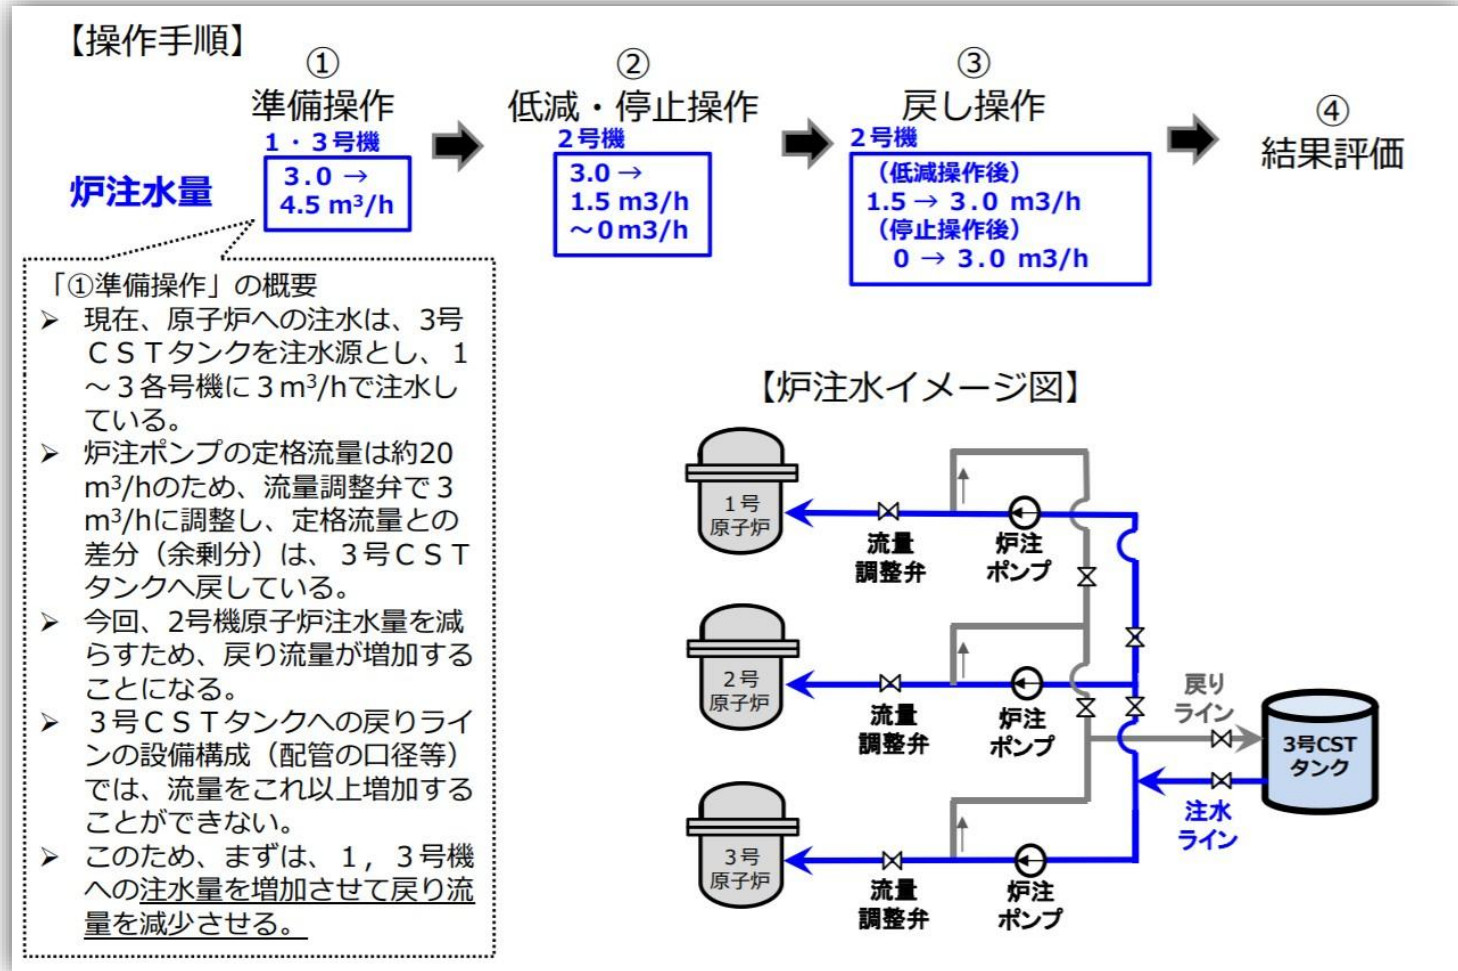

出典：2019年3月20日 東京電力資料「福島第一原子力発電所 2号機燃料デブリ冷却状況の確認の実施について」

http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190320_1.pdf

2019年3月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第64回） 資料「2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/03/3-5-2.pdf>

概要に戻る


b 2号機核燃料デブリ冷却状況の確認の実施状況

核燃料デブリ冷却状況の確認スケジュール(予定)は下表であり、2019年4月12日現在の実施状況は以下の通りです。

4月2日午前10時51分、2号機 炉心スプレイ系原子炉注水量:3.1 m³/h→1.5 m³/h

4月9日午前10時43分、2号機 炉心スプレイ系原子炉注水量:1.4 m³/h →3.0 m³/h

なお、この原子炉注水量低減操作を通じ、関連監視パラメータに異常はなかったそうです。

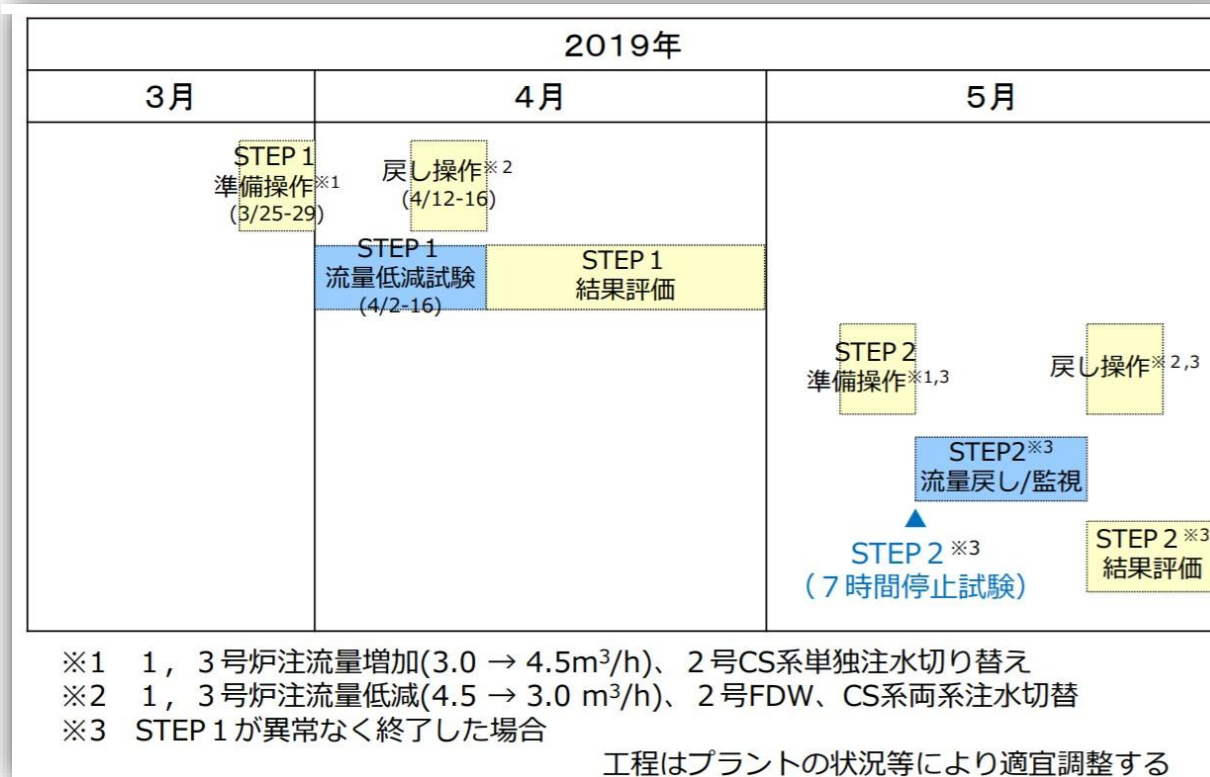

出典：2019年3月20日 東京電力資料「福島第一原子力発電所 2号機燃料デブリ冷却状況の確認の実施について」

http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190320_1.pdf

2019年3月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第64回） 資料「2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/03/3-5-2.pdf>

2019年4月9日 東京電力 「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」

http://www.tepco.co.jp/press/report/2019/1514125_8985.html

概要に戻る

c 2号機核燃料デブリ冷却状況の確認の実施結果

東京電力は、2号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験STEP1を2019年4月2日～4月16日に実施し、その結果について以下の明朝体部分(文中のゴシック体は筆者による補遺)の通り報告しています。

2号機 の原子炉注水量を3.0 m³/hから1.5 m³/hまで低減、および1.5 m³/hから3.0 m³/hに増加し、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認した。

<操作実績> 2019年4月2日 10:05～10:51 3.1 m³/h → 1.5 m³/h

2019年4月9日 10:07～10:43 1.4 m³/h → 3.0 m³/h

<原子炉の冷却状態> RPV(原子炉圧力容器)底部温度やPCV(原子炉格納容器)温度の温度上昇については、温度計毎にばらつきはあるが、概ね予測通りであり、試験継続の判断基準(温度上昇15℃未満)を満足(下表参照)。

PCVガス管理設備の短半減期希ガス(Xe-135)は、原子炉注水量の増加後も有意に 検知されず、原子炉は未臨界を維持。その他のプラントパラメータにも異常なし。 よって、試験STEP2として、原子炉注水を一時的に停止する試験を5月中旬から開始する。 なお、今回の試験における温度上昇の予測評価との差異や、温度計の設置位置による挙動の違いなどの詳細評価については今後実施していく予定。

(次ページに続く)

	温度上昇量	指示値	温度計	備考
RPV底部温度	5.2℃	20.2→25.4℃	TE-2-3-69R	上昇量、指示値最大
PCV温度	2.8℃	18.8→21.6℃	TE-16-114H#2	上昇量最大
	2.1℃	20.8→22.9℃	TE-16-114C	指示値最大

東京電力は、2号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験STEP2を2019年5月13日～5月24日に実施し、その結果について以下の明朝体部分の通り報告しています。

2号機の原子炉注水を短時間停止し、注水停止中のRPV(原子炉压力容器)底部の温度上昇率は0.2℃/h以下と概ね予測と同程度であることを確認

<操作実績>

2019年5月13日 10:11～10:40 3.0 m³/h → 0.0 m³/h

2019年5月13日 18:17～18:54 0.0 m³/h → 1.5 m³/h

2019年5月15日 10:03～10:18 1.5 m³/h → 2.0 m³/h

2019年5月16日 13:36～13:58 2.0 m³/h → 2.5 m³/h

2019年5月17日 15:02～15:15 2.5 m³/h → 3.0 m³/h

<注水停止中のRPV底部の温度上昇率(2019年5月13日)>

温度上昇率	温度計指示値	温度計
0.2℃/h以下	24.5℃ (10時時点) → 25.5℃ (18時時点)	TE-2-3-69R

<原子炉の冷却状態>

RPV底部温度やPCV温度の挙動は、温度計毎にばらつきはあるが、概ね予測どおりであり、試験継続の判断基準(温度上昇15℃未満)を満足中。

<その他のパラメータ>

PCVガス管理設備のダスト濃度に有意な上昇なし

PCVガス管理設備の短半減期希ガス(Xe-135)は、原子炉注水量増加後も有意な上昇

なく原子炉は未臨界を維持

今後については、実際の温度上昇と予測との差異や、温度計の設置位置による挙動の違い、原子炉注水停止時に採取した放射線データなどを評価、他号機での試験等、追加試験の検討を予定しています。

出典：2019年5月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第66回） 資料

「2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験(STEP2)の結果（速報）について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/05/3-5-2.pdf>

概要に戻る

③ 3号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について


東京電力は、2号機・1号機に続き、3号機においても緊急時対応手順の適正化などを図るために、必要な安全措置を取りつつ、2020年2月3日から2日程度（約48時間）の注水停止試験を、下左図のような工程で実施していく計画を発表しました。

また試験期間中の温度上昇を下右図のように予測評価しています。

[1号機確認試験結果速報に戻る](#)

試験工程	2020年1月	2020年2月
3号機	CS系 単独注水 1/31	燃料デブリ冷却状況の確認試験 (2/3~2/17) 注水停止：2/3 注水再開：2/5 CS系・FDW系 注水 2/17
1・2号機	注水流量増加 (3.0 → 4.5m ³ /h) 1/29~1/31	注水流量低下 (4.5 → 3.0m ³ /h) 2/10

(実際の操作日は現場状況により変更となる場合がある)

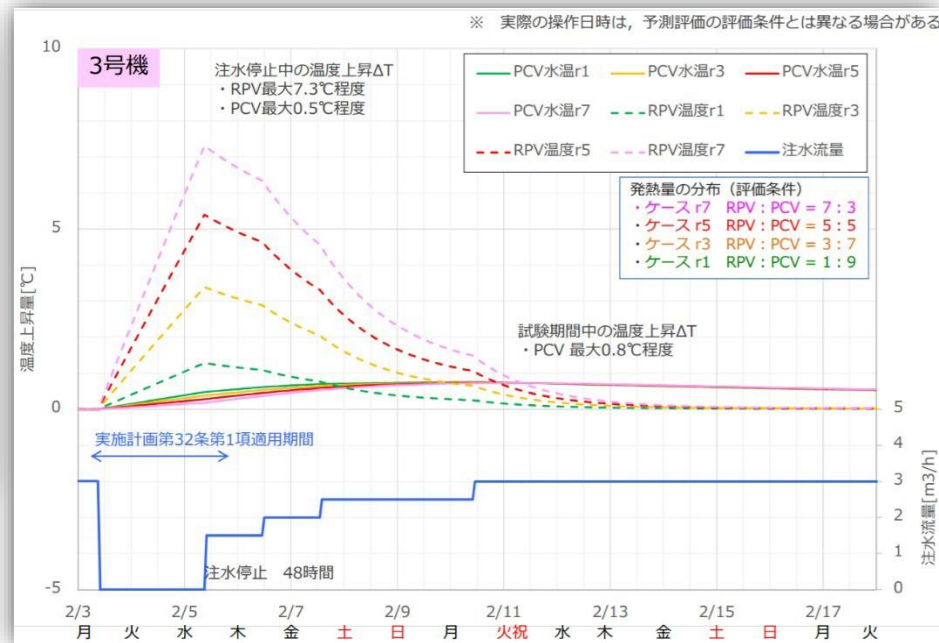

3号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果(速報)について

東京電力は、3号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果(速報)について下記の通り発表しました。

■ 試験概要

- ✓ 2020年2月3日～2月5日にて約48時間注水を停止。その後、注水を再開しパラメータを監視。試験期間中の炉内状況は安定して推移し、判断基準を満足した。
- RPV底部温度、PCV温度に温度計毎のばらつきはあるが概ね予測の範囲内で推移。
- ダスト濃度や希ガス(Xe135)濃度等のパラメータに有意な変動なし。

最大温度上昇量

	RPV底部	PCV
注水停止中 (2月3日10:00～2月5日10:00)	0.6℃ (約0.01℃/h)※	0.7℃ (約0.01℃/h)※
試験期間中 (2月3日10:00～2月17日10:00)	0.8℃	1.2℃

※ () 内は温度上昇率

■ 今後について

- ✓ 実際の温度上昇と予測との差異や、温度計の挙動の違い、PCV水位の変動、原子炉注水停止前後に採取した放射線データなどを評価予定。
- ✓ 緊急時対応手順等への反映を検討していく。

1号機確認試験速報にもどる

④ 1～3号機 核燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について

東京電力は、3号機核燃料デブリ(以下、デブリ)冷却状況の確認試験の結果について上表の通りまとめ、さらに2019年3月から開始された **参照** 1～3号機デブリ冷却状況の確認試験を終了し、その結果について、下表の通り発表しました。

(3号機デブリ冷却状況の確認試験の結果についてのまとめ)

■ RPVの温度挙動について

- RPV底部温度、RPV下部周辺温度は全体的に緩やかな挙動を示していた。
- RPV底部ヘッド上部温度(TE-2-3-69H2)、RPVスカート上部温度(TE-2-3-69K1)で注水再開後の温度低下が大きい傾向、注水量を2.5m³/hに増加した後に温度上昇傾向が確認された。

■ PCV水温と水位の変動について

- PCV新設温度計(TE-16-003)で温度変化が確認された。当該温度計はPCV水位の変化に伴い、一時的に気相露出したと推定している。
- PCV水位の評価結果及びMSIV室内の漏えい音の確認より注水停止中のPCV水位はMSラインベローズに至っていないと推定している。

■ 熱バランス評価と実績温度の比較

- RPV温度は熱源の存在割合に応じ、評価結果と実績温度に若干の差異が生じた。
- PCV温度は実績温度を概ね再現している。


■ 放射線データについて

- ダストではCs-137、凝縮水ではCo-60、Sb-125で注水停止前後の放射能濃度に変動が確認された。
- フィルタユニット表面線量、オペフロダストモニタの指示値については注水停止による影響は確認されなかった。

筆者注:

RPV=原子炉圧力容器

PCV=原子炉格納容器

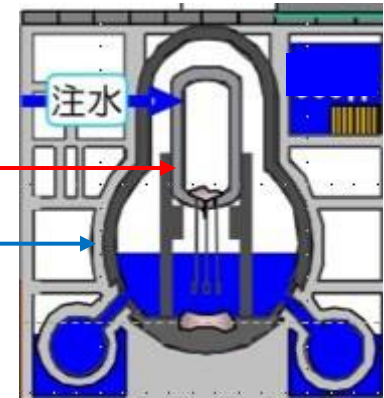

- 1～3号機において、原子炉注水を一時的に停止する試験を実施した結果として、以下のことがわかった。

- ① 試験中のRPV温度やPCV温度に大きな上昇はなく、ダスト濃度や希ガス濃度にも影響はなかったことから、一時的な原子炉注水の停止によって、燃料デブリの冷却状態に問題はないこと。
- ② 熱バランスモデルによって、注水停止などの過渡的な冷却状態の変化をふくめ、RPV底部温度やPCV温度を概ね評価可能であること。
- ③ 注水停止中の温度上昇率は、最大の2号機で約0.2℃/hであり、この温度上昇率に基づくと、注水停止時の時間余裕は、およそ10日以上と見込まれ、従前評価の約10時間と比べ、大幅に余裕が大きいこと※。

※ RPV底部の温度が運転上の制限である80℃に到達するまでの時間余裕

筆者注:なかったことから、

(5) 原子炉格納容器循環注水冷却(の停止) 第Ⅱ期

① 福島第一原子力発電所1～3号機原子炉注水停止試験の実施について

2020年7月、東京電力は、2019年度に実施した注水停止試験結果(前ページ参照)を踏まえ、今後の廃炉に向けて、各号機の状態を踏まえた目的に応じた試験を計画・実施していくことを発表しました。 [参照](#)

各号機の試験目的等は、下左の表の通りとされていますが、さらに、原子炉冷却状態や炉内挙動などの評価に資するデータ拡充の観点から、原子炉格納容器(PCV)ガス管理設備のHEPAフィルタユニット表面線量率の取得、およびPCVガス管理設備のHEPAフィルタ入口側抽気ガス(フィルタ通過前)のダストおよびHEPAフィルタ入口側抽気ガス(フィルタ通過前)の凝縮水のサンプル採取も検討されています。 筆者注：HEPAフィルタ＝空気中からゴミ、塵埃などを取り除き、清浄空気にする目的で使用するエアフィルタの一種

日程は、2号機の試験を先行して実施(注水停止：8/17～8/20予定)。1号機の試験は、内部調査に向けた作業後に実施する計画。3号機は今年度中に実施できるように工程を調整していくとしています。

また、注水停止時に生じる可能性のあるリスク、およびそのリスクの緩和策については下右の表の通りとしています。

	1号機	2号機	3号機
試験目的	注水停止により、PCV水位が水温を測定している下端の温度計(T1)を下回るかどうかを確認する	2019年度試験(約8時間)より長期間の注水停止時の温度上昇を確認し、温度評価モデルの検証データ等を蓄積する	PCV水位がMS配管ベローズを下回らないことを確認する
補足	- 昨年度試験では、PCV水温を測定している温度計は露出しなかった - より長期間の停止で温度計が露出するか確認し、今後の注水量低減・停止時に考慮すべき監視設備に関する知見を拡充する - PCV水位低下状況を踏まえ、今後の注水のありかたを検討していく	- 昨年度試験での注水停止期間、RPV底部温度はほぼ一定で上昇することを確認 - より長期間の停止で、温度上昇の傾きに変化が生じるか確認し、評価モデルを検証する	- 昨年度試験では、PCVからの漏えいを確認しているMS配管ベローズまでPCV水位は低下しなかった - PCV水位の低下有無や低下速度等を踏まえ今後の注水のありかたを検討していく
停止期間	5日間	3日間	7日間

	影響評価	影響緩和策
温度変化	- 注水停止に伴う除熱減少により、RPVやPCVの温度が上昇する - 熱バランス評価により温度上昇は最大10℃程度と評価しており、注水停止試験による温度上昇は限定的	- 想定外の温度上昇に備え、RPV、PCVの温度変化を慎重に監視。 - 異常な温度上昇を確認した場合、速やかな注水再開や注水量増加等の措置を実施。
再臨界	注水再開時に1m³/hを超える注水増加を伴うものの、注水量を現在の状態に戻す操作であり、未臨界維持に与える影響はない	- ガス管理設備の希ガスモニタを監視。 - Xe-135の濃度の上昇/検知を確認した場合、注水再開前の状態に戻し、ほう酸水の注入等の措置を実施。
ダスト等の放出量増加	ガス管理設備においてフィルタを通して排気していることや、湿潤環境が維持されていることにより、注水停止試験による放出量増加はない	- ガス管理設備のダストモニタを監視。 - 異常なダスト上昇を確認した場合、速やかな注水再開や注水量増加等の措置を実施。

出典：2020年7月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議(第80回) 資料
「福島第一原子力発電所1～3号機原子炉注水停止試験の実施について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/07/3-5-2.pdf>

[概要に戻る](#)

② 1号機原子炉注水停止試験の実施について

1号機の原子炉格納容器(PCV)には注水冷却により、核燃料デブリ(以下、デブリ)の上に深さ約1.5 mの汚染滞留水(以下、滞留水)が溜まっており、その水温は温度計により常時監視されています。

注水冷却は汚染水発生の一つの要因であり、デブリの冷却を確保しつつ注水量を低減することが望まれています。水温の監視も欠かすことはできません。

今回の停止試験は、5日間の注水停止により滞留水が最下部の温度計(右図T1)の位置より下がり、水温が測れなくなるかどうかを確認することを目的として実施されました。

なお2019年度に実施された49時間の注水停止試験 **参照** では、温度計T1の位置まで滞留水は下がりませんでした。


試験結果は概略以下の通りであったと発表されました。

注水停止:2020年11月26日14:33→注水再開:2020年12月1日15:20

原子炉圧力容器(RPV)底部温度、PCV温度に温度計ごとのばらつきはあるが、概ね予測の範囲内で推移した。

PCV水位は、水温を測定している下端の温度計(T1)を下回らなかったと推定される。昨年度試験と同様に、注水停止中にドライウェル(D/W。筆者注:原子炉圧力容器を包み込むフラスコ型の部分)圧力の低下を確認した。

ダスト濃度や希ガス(Xe-135)濃度に有意な変動はなかった。

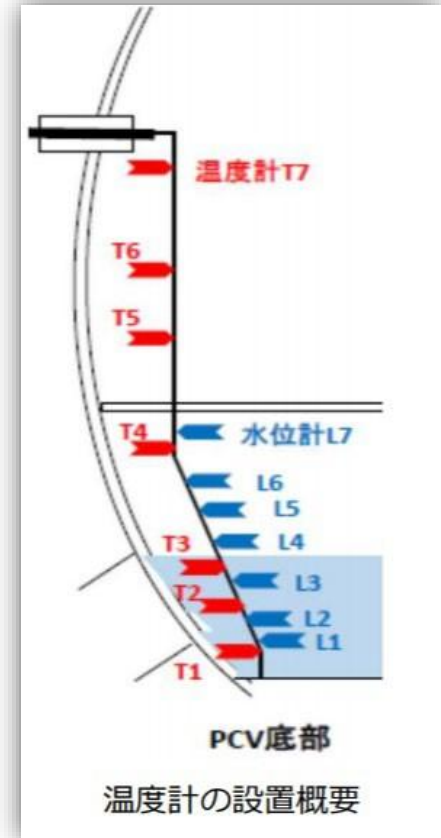

出典: 2020年11月26日 廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第84回)資料「1号機原子炉注水停止試験の実施(試験工程)」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/11/3-5-4.pdf>

2020年12月24日 廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第85回)資料「1号機原子炉注水停止試験結果」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/12/3-5-2.pdf>

概要に戻る

③ 2号機原子炉注水停止試験結果(速報)

前々ページの下左表中、原子炉注水停止試験2号機の目的である「2019年度試験(約8時間)より長期間の注水停止時の温度上昇を確認し、温度評価モデルの検証データ等を蓄積する」ため、2020年8月17日10:09～年8月20日11:59の約74時間、2号機において、核燃料デブリの冷却注水が停止されました。

この間の温度上昇は、原子炉圧力容器(RPV)底部で12℃未満、原子炉格納容器(PCV)で4℃未満。温度変化の推移も、現行の温度評価モデルに基づく予測に近いものでした。また、この間、ダスト濃度や希ガス(Xe135)濃度等のパラメータに有意な変動も測定されませんでした。


東京電力は今後について、

「試験終了予定の8月28日までパラメータの監視を継続する。

実際の温度上昇と予測との差異や、温度計の挙動の違い、原子炉注水停止前後に採取した放射線データなどを評価予定」としています。


RPV底部温度の推移 (試験開始からの温度変化量)

TEPCO

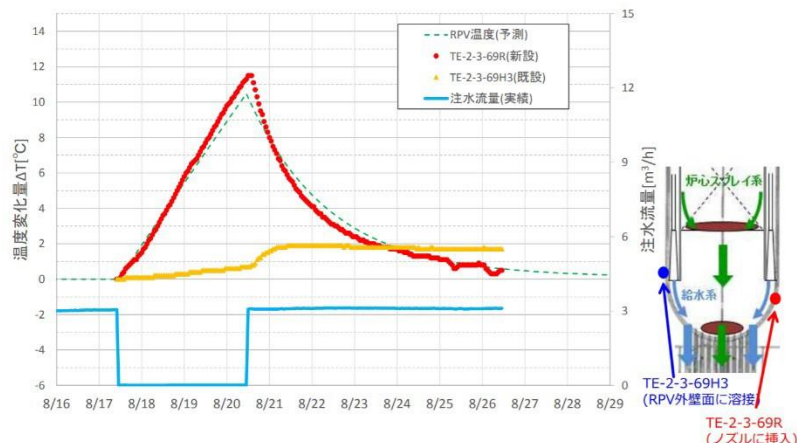

PCV温度(新設)の推移 (試験開始からの温度変化量)

TEPCO

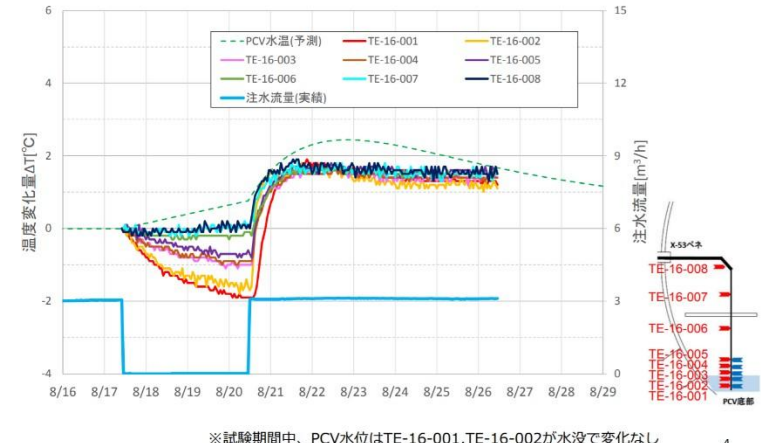

※試験期間中、PCV水位はTE-16-001, TE-16-002が水没で変化なし

出典：2020年8月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第81回） 資料

「2号機原子炉注水停止試験結果(速報)」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/08/3-5-2.pdf>

概要に戻る

(6) 原子炉格納容器循環注水冷却(の停止) 第Ⅲ期

① 福島県沖地震(2021年2月13日)のイチエフへの影響、および地震から分かったこと

2021年2月13日夜福島県沖を震源としたマグニチュード7.3の地震が発生し、イチエフは震度6弱の揺れにみまわれました。この地震によりイチエフ構内で起きた主要なこと、またこの地震をきっかけに分かったことを、以下に列挙します。

- ・ 5・6号機の各原子炉建屋の上部にある使用済み核燃料プールから水の一部があふれ出ました。東京電力は建屋外への流出は確認されておらず、外部への影響はないとしています([14日東京電力発表](#))。
- ・ 増設ALPSサンプルタンク1基(全3基)、高性能ALPSサンプルタンク2基(全3基)にタンクの位置ずれ(最大5cm)が確認されたそうです。東京電力は、水漏れやタンクの損傷は確認されていないとしています([18日東京電力発表](#) 9ページ)。
- ・ 1・3号機原子炉格納容器(以下、格納容器)の水位が低下していることが分かりました([19日東京電力発表](#))。
- ・ 1号機の格納容器圧力が低下していることが分かりました([21日東京電力発表](#))。
- ・ 22日の原子力規制委員会の第88回特定原子力施設監視・評価検討会の席上で、東京電力は、3号機の原子炉建屋に昨年設置した地震計2基が故障していたにもかかわらず、修理などの対応をせず放置していたため、[2月13日に発生した地震の揺れのデータが記録できていなかったことを明らかにしました\(第88回特定原子力施設監視・評価検討会 会議映像\)](#)。
- ・ [22日、東京電力が、2月1日から1～3号機の水位データの採取を終了していたことが分かりました\(おしどりマコtwitter\)](#)。

本レポートでは、このうち、今後の廃炉作業への影響も懸念される、1・3号機格納容器の水位低下と、1号機格納容器圧力の低下について、現時点で分かる限り、何が起きているのかを掘り下げてみます。

概要に戻る


(次ページに続く)

② a 福島県沖地震 (2021年2月13日)のイチエフへの影響、および地震から分かったこと

1号機では、2019年10月に行われた1号機核燃料デブリ注水冷却停止試験 [参照](#) において、水位を温度計T2 付近まで下げたところで、原子炉格納容器(以下、PCV)圧力が低下し、注水再開後、水位を温度計T2付近まで上げたところでPCV圧力が元に復しています。東京電力は、この高さがこれまでに損傷が確認されていた真空破壊ラインベローズの設置高さとおおむね一致したことから、PCV水位が損傷箇所を下回ると、損傷箇所が空气中に露出し、そこからPCV内空気が漏えいし、PCV圧力が低下したたのだろうと推論しています(2020.1.30 [『1号機 燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について』](#)14ページ)。

この推論を今回の1号機PCVの水位と圧力との挙動に重ね合わせると、今回の地震発生後、1・3号機PCVの水位が低下し、かつ1号機の格納容器圧力が低下していることから、1号機PCVでは、これまでに損傷が確認されていた真空破壊ラインベローズより下部の損傷が拡大したか、新たな損傷が生じ、そこから冷却水が漏れることでPCV水位が真空破壊ラインベローズ以下に低下し、真空破壊ラインベローズが空气中に露出し、そこからPCV内空気が漏えいしPCV圧力が低下したと考えられます。

核燃料デブリの環境への影響の最大の防波堤であるPCVおよび周辺機器の脆弱性が懸念されます。 [\(次ページに続く\)](#)

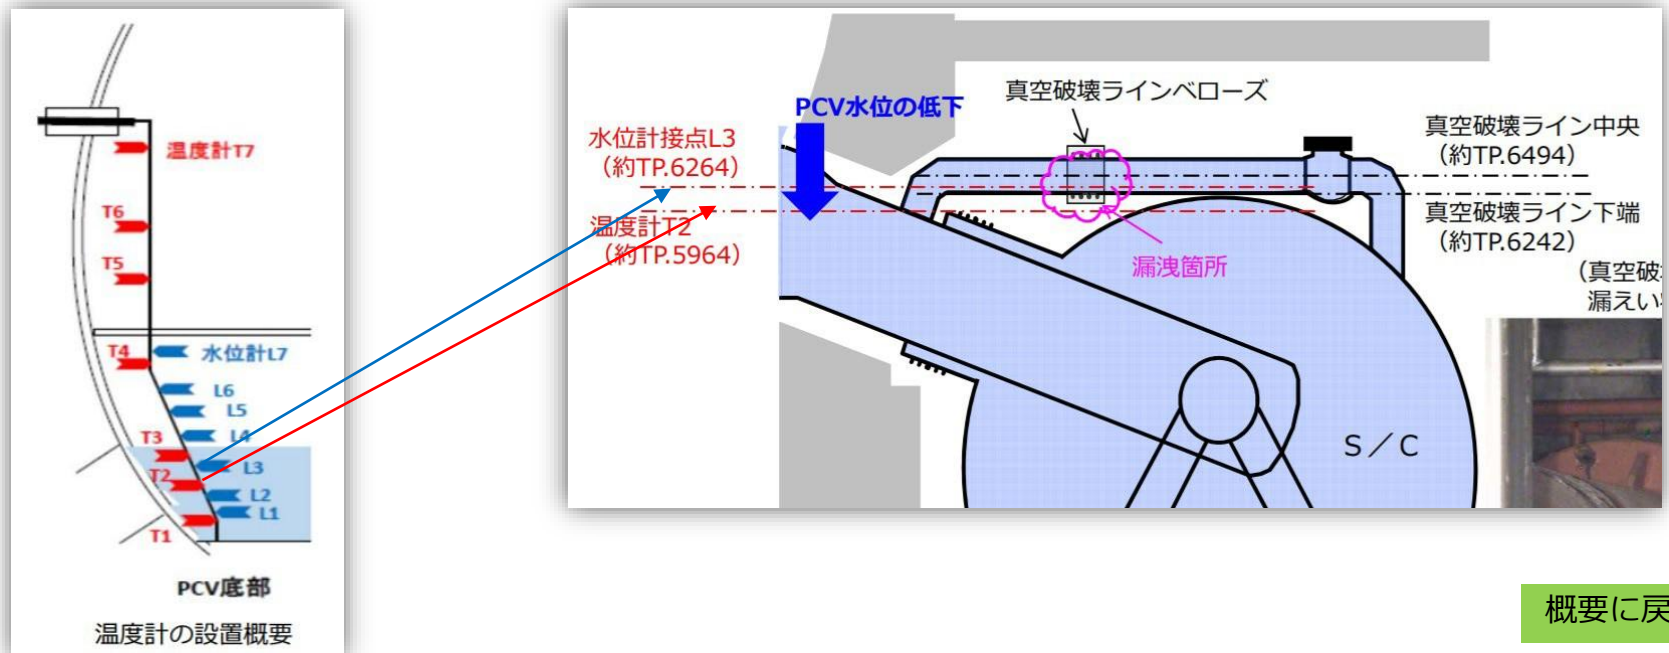


b 2月25日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議(第87回)以降の推定

[下部2図を含む標記会議資料](#)において東京電力は、1号機原子炉格納容器(以下、PCV)の水位の低下および圧力の低下の状況と原因について、[前ページ](#)の筆者の推定とほぼ同じ推定をしています。27日現在、温度計T2付近まで水位は下がり続けているようです。


1号機 原子炉格納容器温度計・水位計の設置高さ

TEPCO

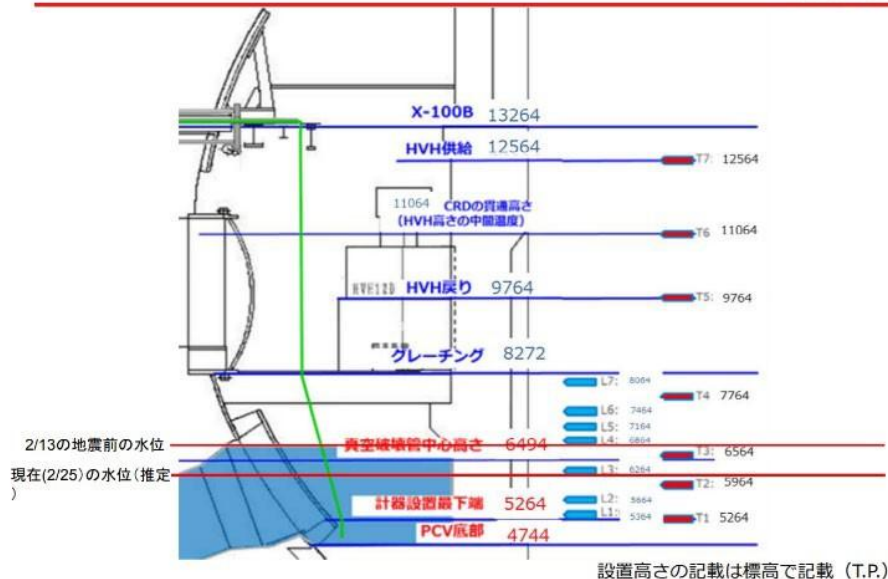

(参考) 1号機 これまでのPCV漏洩箇所の推定状況 (2/2)



TEPCO

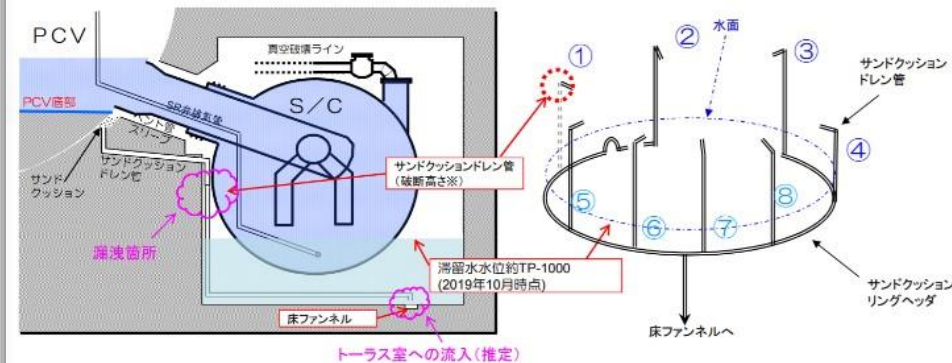

※ サンドクッションドレン管は8本あり、うち1本が気中で破断していることが確認されている。

- サンドクッションドレン配管からの漏洩が確認されているのは、気中で破断している1箇所のみであるが、他の7本についても、水中(たとえば床ファンネル付近)において、PCVから漏洩している可能性がある。

[下部2図を含む標記会議資料](#)において東京電力は、3号機PCVの水位低下の原因については、主蒸気配管の伸縮継手部からの漏えいが従来から確認されていたことにとどめています。しかし、3月1日現在、水位は主蒸気配管が通っている貫通部下部を超えて低下しています。[損傷の拡大（推定）と水位の低下に戻る](#)

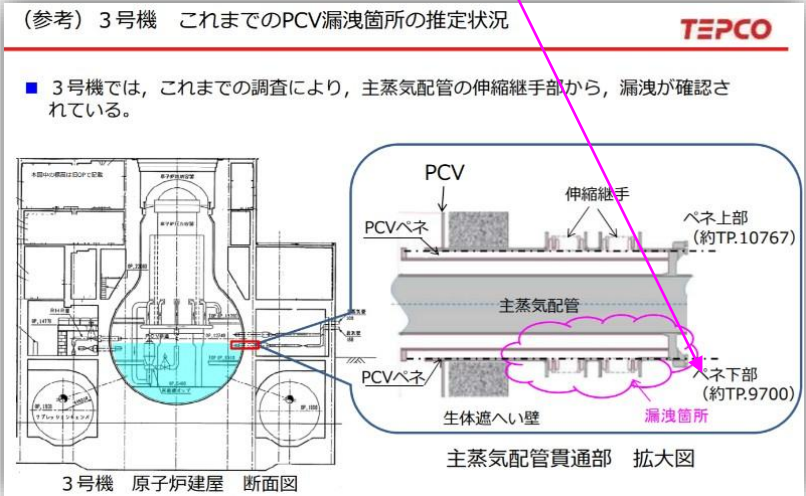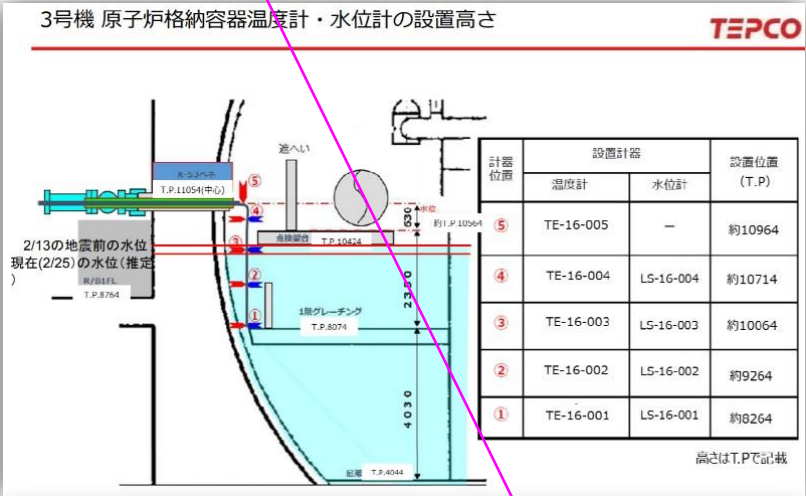

3号機PCV水位の変化（東京電力日報データから筆者が計算）			
日付	水位（底部から）	前日との水位差	地震前との水位差
単位	mm	mm	mm
地震前の水位	6,380		
2021/2/19	5,579	-801	-801
2021/2/20	5,570	-9	-810
2021/2/21	5,549	-21	-831
2021/2/22	5,549	0	-831
2021/2/23	5,529	-20	-851
2021/2/24	5,520	-9	-860
2021/2/25	5,509	-11	-871
2021/2/26	5,518	9	-862
2021/2/27	5,499	-19	-881
2021/2/28	5,500	1	-880
2021/3/1	5,519	19	-861

③ 1・3号機原子炉格納容器の水位

3号機については、2021年4月2日『[福島第一原子力発電所の状況について\(日報\)](#)』によると、プラントパラメータに異常がなく、原子炉格納容器(以下、PCV)水位も、2021年2月13日以前の水位約 6.4 m から 90 cm 減で安定していることから、4月2日、監視強化から通常の監視に戻したということです。

1号機は、『[1,3号機原子炉格納容器\(PCV\)の水位低下について\(続報2\)](#)』によると、3月22日、水位が水位計L2 (T.P.+5,664 mm)を下回ったため、核燃料デブリ冷却用注水量を 3.0 m³/h→4.0 m³/hとし、23日の『[同\(続報4\)](#)』によると、水位は水位計 L2 上に復し、26日の『[同\(続報6\)](#)』によると注水量を 3.0 m³/hに戻しています。また1号機では接点式の水位計しか設置しておらず、連続的に水位データを追えません、4月の水位は温度計T2(T.P.+5,964 mm)水位計L2 (T.P.+5,664 mm)との間にあるようです。

また3号機については、4月5日から4月22日の期間、原子炉注水停止に伴いPCVの水位がどの程度まで低下するのか影響を確認し、さらに今後の燃料デブリ取り出し関連作業に向けた知見拡充を図るため、3号機の原子炉注水設備において、原子炉注水を一時的に停止する試験(3号機原子炉注水停止試験)を実施しました。

詳しくは[次ページ](#)をご覧ください。

さらに1号機では、2021年度、地震があった際のリスクを低減するため、水位を低下させる計画が発表されました。

※ [この1号機の水位低下計画についてのレポートは、今後の核燃料デブリの取り出し準備の一環と思われますので、「核燃料デブリの取り出し準備2021年4月レポート」173ページ～「\(3\) 原子炉格納容器\(以下、PCV\)内部状態の変更」内の176ページ～「b 1号機 原子炉格納容器水位低下計画について」に移しましたので、そちらをご覧ください。](#)

(次ページに続く)

④ 1号機 原子炉格納容器の水位の経過について

(2021年5月の経過)

	TP標高(mm)	PCV底から高さ (cm)
水位計L3	6,264	152
温度計T2	5,964	122
水位計L2	5,664	92

1号機の原子炉格納容器(以下、PCV)水位は、「福島原子力事故に関する定期更新 2021年(日報)」によりますと、5月1日から6日までは、温度計T2(T.P.+5,964 mm)と水位計L2(T.P.+5,664 mm)の間にありましたが、7日には水位計L2(T.P.+5,664 mm)を下回り、注水量が約3.0 m³/hから約4.0 m³/hへと増量されました。この結果11日、水位は温度計T2(T.P.+5,964 mm)超に復し、注水量は約3.0 m³/hへ戻されています。この不安定な水位を受け、10日に計画されていたPCV注水量変更計画が延期されています。

18日には総注水量約3.0 m³/hのうち、炉心スプレイ系と給水系が半々だったのが給水系一本での約3.0 m³/hに変更されました。理由は不明です。

21日になると水位は再び温度計T2(T.P.+5,964 mm)付近となり、さらに24日には温度計T2(T.P.+5,964 mm)を下回り、30日には、水位計L2(T.P.+5,664 mm)も下回ったため、31日に注水量を約3.0 m³/hから約4.0 m³/hへと増量。6月1日に水位計温度計T2(T.P.+5,964 mm)超まで復すという挙動を繰り返しています。

なお2月13日地震の前のPCV底部からの水位は約175 cm、水位計L2(T.P.+5,664 mm)のPCV底部からの水位は約92 cmです。

(2021年6月の経過)

上記の注水量の増量により、6月1日、水位は再び温度計T2(T.P.+5,964 mm)超に復し、6月3日以降、水位計L3(T.P.+6,264 mm)付近にあるようです。

また、接点式の水位計であるL2(T.P.+5,664 mm)については、6月1日、水位がT.P.+5,964 mm超であるにもかかわらず、接点ON(水没)とOFF(非水没表示)を繰り返している状態ということであり、信頼性に疑問が生じています。

出典：2021年5月30日東京電力資料「1,3号機原子炉格納容器(PCV)の水位低下について(続報13)」一原子力発電所 1号機および3号

https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1612077_9004.html

2021年6月1日東京電力資料「福島第機原子炉格納容器における水位低下について(続報)」

https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210601_1.pdf

2021年6月1日東京電力資料「福島第一原子力発電所 1号機および3号機原子炉格納容器における水位低下について(続報)」

https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210601_1.pdf

[概要に戻る](#)

⑤ 2021年2月13日地震による1・3号機原子炉格納容器の損


傷の拡大(推定)と水位の低下について

2021年2月13日深夜、福島県沖を震源とする地震が発生しました。福島第一原子力発電所では、現行基準地震動(水平方向) 600 Galに対して6号機で235.1 Galの揺れでした。

従来から原子炉格納容器(以下、PCV)の損傷が推定されていた1, 3号機においては、地震前の冷却注水量3.0 m³/hにより、1号機ではPCV底部より約175 cm、3号機では約638 cmの水位が保たれていました。しかし2月19日以降水位の低下が続き、3号機では4月1日、約548 cmまで約90 cm低下したところで安定しました(前々ページ既報)。

1号機は、一時は約92 cmまで水位が低下しましたが、冷却注水量を3.0 m³/hと4.0 m³/hとの間で調節、試行錯誤するとともに、連続して水位を測定できる圧力計を追加設置し、6月7日に冷却注水量を3.5 m³/hとすることで約152 cmで安定を得ました。

これらのことから、3号機では、これまでに損傷が確認されていた主蒸気配管の伸縮継手部より下部に新たな損傷が発生(参照) 1号機では、これまでに損傷が確認されていた真空破壊ラインベローズの損傷規模が 0.5 m³/h程度拡大したと推定されます(下図)。

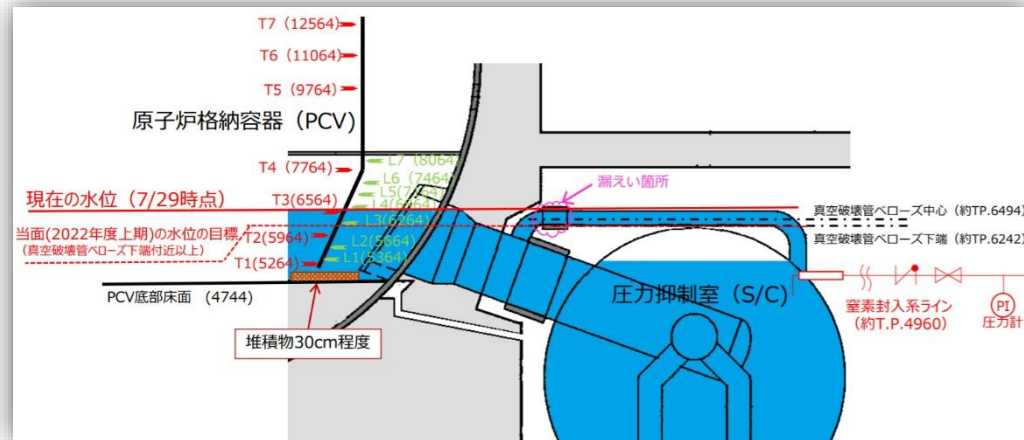

出典：2021年2月15日東京電力資料「地震発生後の福島第一原子力発電所の状況について」

https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210215_1.pdf

2016年1月21日東京電力資料「福島第一原子力発電所検討用地震動・津波に対する建屋検討結果」

<https://web.archive.org/web/20170119041544/https://www.nsr.go.jp/data/000137503.pdf>

2021年7月29日東京電力資料「1号機 原子炉格納容器における水位安定の状況について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2021/07/92-3-6-2.pdf>

概要に戻る

⑥ 2号機TE-2-3-69Rの謎

筆者は日課として、東京電力のホームページから福島第一原子力発電所の[プラント関連パラメータアーカイブ](#)というページを開き、その日のパラメータのデータを前日のそれと比較しています。



その日課の中で以前から不思議に思っていたことがあります、自信をもって解釈も説明もできないため、これまでレポートもしてきませんでした。今回、分からないことは分からないこととして、事実を事実としてレポートしておくことにします。

それは2号機原子炉圧力容器(以下、RPV)の底部ヘッド上部に2014年に新設されたTE-2-3-69Rという温度計(下左図参照)があります。その温度計のデータが、同じ2号機RPV底部ヘッド上部にある温度計TE-2-3-69H3(下左図参照)や、1・3号機のほぼ同じ位置にある温度計のデータと時々(月に1, 2回ぐらい)違う動きをすることです。TE-2-3-69R以外の温度計データは毎日おおよそ原子炉冷却用の注水温度と同期してなだらかな変化をしています、ところがTE-2-3-69Rの温度計データは時々それらと同期せず、小さいながらも明らかにTE-2-3-69R以外の温度計データの変化より大きな変化を示すことがあるのです。

次ページの3つの表をご覧ください。上が2024年2月1日のRPV底部温度データ、真ん中が2月5日のデータ、下が2月13日のデータです。赤い楕円で囲ったのが2号機TE-2-3-69Rのデータ、オレンジ色の楕円内がTE-2-3-69H3という2号機のもう一つの温度計データ、青の楕円内が1号機のほぼ同じ位置の温度計データ、緑の楕円内が3号機のほぼ同じ位置の温度計データです。

下右のグラフは2023年初頭の2か月少しの期間のTE-2-3-69R データ(赤)、TE-2-3-69H3 のデータ(オレンジ)、1号機のほぼ同じ位置の温度計データ(青)、3号機のほぼ同じ位置の温度計データ(緑)です。明らかにTE-2-3-69Rのデータが他のデータと異なる動きを示していることがお分かりいただけると思います。

(次ページに続く)

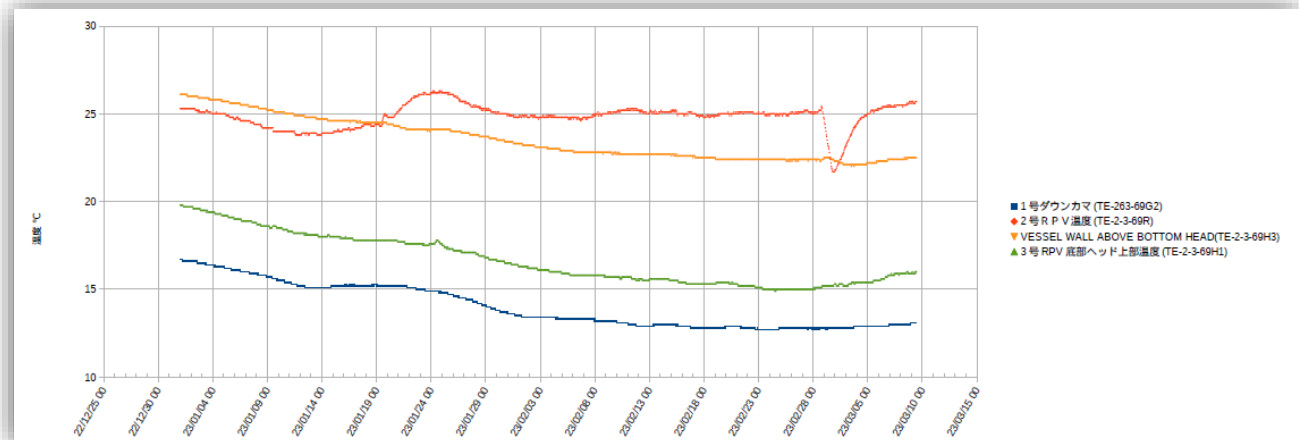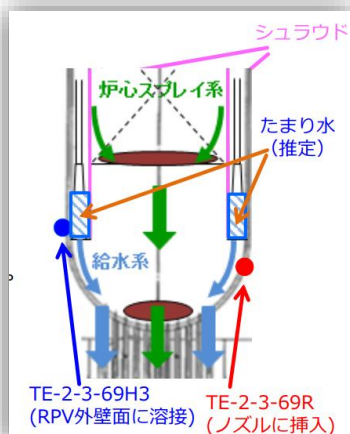

この違いが、東京電力が下記出典で言う、TE-2-3-69Rの他の温度計との設置位置の違いによるものか、他の温度計の事故の影響による指示値の不確かさによるものか現時点では確かめようはありませんが、2号機TE-2-3-69Rの近くに、活動量が時折変動する何らかの熱源があることが推定されます。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2024年2月1日 11:00現在

2024
東京電力ホール
福島第一廃炉

	1号機	2号機	3号機
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 15.8 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 12.9 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 15.1 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 25.4 °C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 28.8 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 17.4 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 17.6 °C

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2024年2月5日 11:00現在

2024
東京電力ホール
福島第一廃炉

	1号機	2号機	3号機
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 15.7 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 12.9 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 15.1 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 25.3 °C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 29.5 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 17.3 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 17.6 °C

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2024年2月13日 11:00現在

2024
東京電力ホール
福島第一廃炉

	1号機	2号機	3号機
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 15.3 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 12.7 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 14.8 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 25.4 °C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 26.3 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 17.3 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 17.3 °C

出典：2019年8月27日東京電力資料「2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果と今後の試験計画について」
<https://www.da.nsr.go.jp/file/NR000127243/000283111.pdf>

概要に戻る

⑦1号機原子炉格納容器水位低下方法変更の(筆者にとっての)謎

1号機では、2024年2月29日に見送りとされた、原子炉格納容器(以下、PCV)内部調査(気中部調査)を3月14日に実施することに伴い、下記の通り1号機の原子炉注水を停止しました。

調査開始前 3月14日9:52 (3.8 m³/h→0 m³/h)、調査終了後 3月14日12:10 (0 m³/h→3.8 m³/h)。関連パラメータには異常がなかったとのことです。

また1号機では、耐震性向上に向けてPCVの水位を、現在の圧力抑制室(以下、S/C)底部から約8.5 m(T.P.6600)からS/Cの中央部付近(S/C底部から約4 m、T.P.2134)まで、原子炉注水の設定流量を±0.3 m³/hの範囲で調整しながら、約9か月かけて、段階的に低下させる計画が、2月29日東京電力資料「1号機原子炉格納容器の水位低下について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/02/02/3-5-2.pdf>

で明らかにされています。そして、この計画に沿って、3月26日(3.8 m³/h→3.4 m³/h)と原子炉注水量が変更されています。

(筆者にとっての謎はここからです)

しかし1号機では、S/Cに繋がっているCUW(筆者注: 重大事故時に圧力容器を除熱することにより間接的にPCVを除熱する代替補機冷却系)配管を経由したS/Cからの取水により、PCVの水位の低下を図る計画が進行していました。

『核燃料デブリの取り出し準備2024年2月レポート』

<https://1fwatcher.files.wordpress.com/2024/03/202402-05-debris.pdf>

の298ページ～305ページをご覧ください。

2023年12月21日の第121回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議までは、1号機PCVの水位低下はCUWを経由したS/Cからの取水により行われることになっており、1年以上にわたって準備作業が行われていました。

筆者は、2024年2月の『原子炉の状態レポート』

<https://1fwatcher.files.wordpress.com/2024/03/202402-01-gennshiro-02.pdf>

4ページの主な取り組みと状況で2024年2月29日1号機水位低下計画をレポートした際、水位低下<方法の変更>を見逃していました。

現在のところ、東京電力廃炉カンパニー、原子力規制委員会、廃炉等推進機構等の<方法の変更の理由>を記述した資料を探していますが、見つけられていません。

今後、<方法の変更の理由>を明らかにできた場合は『核燃料デブリの取り出し準備レポート』で報告します。

(更新)

個々の停止実績および予定については、下の循環注水スケジュール表をご覧ください。

[illegible]


7 原子炉格納容器ガス管理設備

(1) 窒素ガス分離装置A及びBの取替及び原子炉圧力容器窒素封入ライン二重化 (特定原子力施設に係る実施計画変更認可申請)

原子炉格納容器内窒素封入設備は、水素爆発を予防するために、原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内に窒素を封入することで不活性雰囲気を維持することを目的として、専用のディーゼル発電機を備えない窒素ガス分離装置A・B2台を事故直後1号機近傍の10 m盤に設置・運用し、2013年には専用のディーゼル発電機を備えたCを高台に新設・運用しています。

東京電力は2017年10月6日、原子力規制委員会に対し、津波時等の信頼性向上のため、A・BをCと同様の高台に移設し、かつそれぞれに専用ディーゼル発電機を設置するという変更認可を申請しました。

(現在の原子炉格納容器内窒素封入設備配置位置)

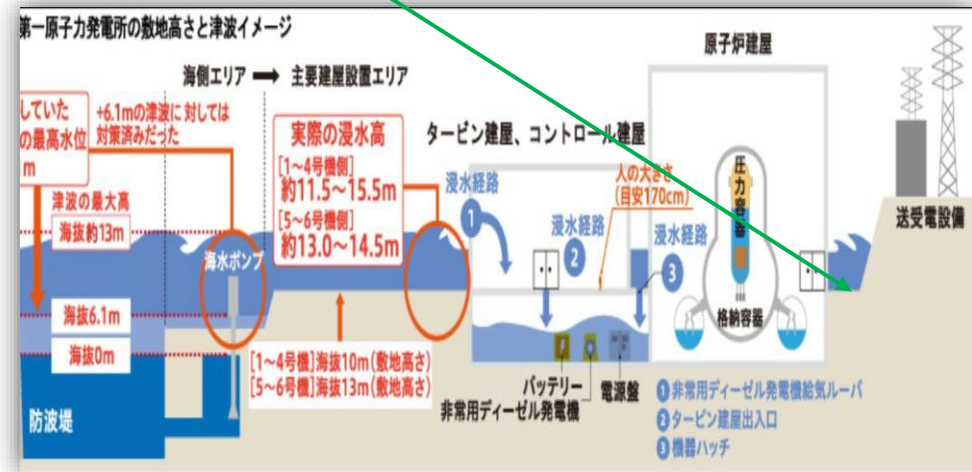

出典：2012年12月25日東京電力「窒素ガス分離装置（C）の新設について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/121225/121225_01j.pdf

2017年10月6日原子力規制委員会「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書」

<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12639624/www.nra.go.jp/data/000206065.pdf>

2017年10月6日原子力規制委員会「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.2 原子炉格納容器内窒素封入設備）」

<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12639624/www.nra.go.jp/data/000206059.pdf>

概要に戻る

(2) 福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器内圧力の減圧試験の実施について

イチエフの1～3号機の格納容器(PCV)は、窒素ガスの注入とガス管理設備による排気のバランスにより大気圧より高い圧力(PCV内の気圧)を維持し、水素濃度の上昇を抑制してきました。


とくにメルトダウン後に1・3号機のように水素爆発を起こしてしまっていない2号機については、1号機(大気圧+1.15 kPa)、3号機(大気圧+1.15 kPa)より高い大気圧+ 3.0 kPa～5.5 kPaで運用してきました。

一方、今後、格納容器からの放射性物質の放出口リスクを低減させ、また格納容器内部調査時における格納容器内外の遮断(バウンダリ)開放作業等の作業性を向上させるために、格納容器圧力を下げていく必要があります。

現在、2号機でも水素濃度上昇のリスクは低くなっており、東京電力は、1 kPa減圧した場合でも水素濃度上昇量は0.1 %程度と低く、実施計画制限2.5 % (水素濃度管理値: 1.5 %)に至るおそれはないと推定しています。

このため、2018年7月から約半年間の予定で、減圧試験を実施し、その結果プラントパラメータやダスト濃度に有意な変動は確認されませんでした。

本試験の結果を踏まえ、2018年12月1日よりPCVの設定圧力を大気圧+2 kPa程度を中心に、0 kPa～ 5.5 kPaを運用範囲とし本運用しています。

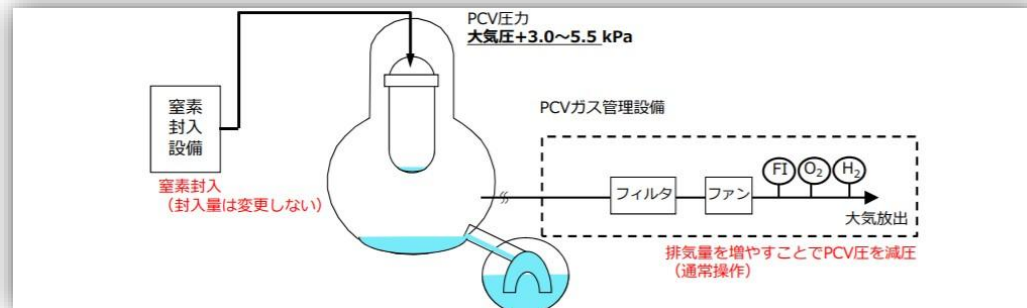

2号機 原子炉格納容器(PCV)の減圧機能確認に戻る

出典：2018年6月28日第55回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料
「福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器内圧力の減圧試験の実施について」

<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/07/3-5-2.pdf>

2018年12月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議 (第61回) 資料

「福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器圧力の減圧試験(STEP2)の結果について」

<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/13/3-5-2.pdf>

概要に戻る

(3) 1号機格納容器内部調査のためのアクセスルート構築のためのX-2貫通部外側の 孔あけ作業における、放射性ダスト放出リスク低減のための減圧操作について

東京電力は、2019年度上期に実施が予定されている1号機格納容器内部調査の、アクセスルート構築に際して実施する孔あけ加工機(アブレシブウォータージェット:AWJ)による作業中のダスト放出リスクをさらに低減することを目的とし、1号機の原子炉格納容器(PCV)圧力(PCV内の気圧)を大気圧と同等程度を目標に減圧する操作を実施し、その結果と今後の取り扱いについて以下の明朝体部分(文中のゴシック体は筆者による補遺)の通り公表しました。

操作実績

- ・操作日時:2019年4月4日(木), 11日(木)
- ・対象号機:1号機
- ・PCVガス管理設備排気流量:4月 4日 約20 m³/h → 約24 m³/h
4月11日 約23 m³/h → 約26 m³/h
- ・PCV圧力 操作前:約0.7 kPa → 4月15日現在:約0.0kPa

(次ページに続く)

4月4,11日, 1号機PCV(原子炉格納容器)ガス管理設備排気流量を増加させることにより, 1号機PCVの減圧を実施した結果, 大気圧と同等程度までPCV圧力(PCV内の気圧)を減圧(約0.0-約0.1 kPa)できることを確認した(減圧操作後, 監視パラメータである酸素濃度・水素濃度に異常なし)。

一方, 4月11日の操作以降, 複数のPCV内温度計で大気圧の上昇に応じた温度上昇を確認(約0.1-約0.3℃/hで上昇が確認されたものが1本。その他は0.1℃/h未満の微小な上昇)過去にも類似事象は確認されているが, その際の温度上昇率(約0.6-約2.0℃/h)に比べ, 今回の上昇率は小さい。

減圧操作の手順は「PCV内温度が全体的に上昇傾向が継続する場合は, 排気流量を減少させる」としていたが, 大気圧の変動に対する温度計指示の上昇が落ち着く傾向が見られることから, 当面は現状の減圧状態を維持し, 温度の監視を継続することとする。但し, 念のため下記の判断基準を追加し, そのいずれかを逸脱した場合は, ガス管理設備の排気流量をPCV温度の上昇が確認されなかった4月11日の操作前(約23-約24 m³/h)を目安に減少させる等の対応をとる。

温度計指示値 50℃以下

温度上昇率 1.0℃/h以下



なお, 排気流量を減少させる場合には, 今回得られた減圧操作に関する知見を踏まえ, PCV温度の監視を行った上で, 圧力の調整を検討する。

(4) 新規に設置したRVHラインを用いた窒素封入設備の通気試験

「[原子炉格納容器ガス管理設備](#)」ページでレポートした通り、窒素封入設備のうちA、Bは、震災直後にT.P.8.5m盤に設置した設備であるため、東京電力は、津波対策としてT.P.33.5m盤の高台へ移し、同時に、窒素ガス分離装置AおよびBを取替え（2019年3月現在、装置本体を収納したコンテナ、発電設備、電気計装品コンテナ等を設置済み）、並びに非常用電源を多重化するため専用ディーゼル発電機を新設します。

合わせて信頼性向上のため、1～3号機原子炉圧力容器(RPV)封入ラインを二重化します。新設装置への切り替えは、原子炉への窒素封入に影響がないように既設装置を流用しながら実施することとしています。

2019年6月、1号機において、2系統の窒素封入ラインのうち、新たに設置したRVHラインを用いた窒素封入設備の通気試験を実施しています。通気試験における新設RVHラインおよび既設JPラインそれぞれの窒素封入量の変更量については出典3をご覧ください。

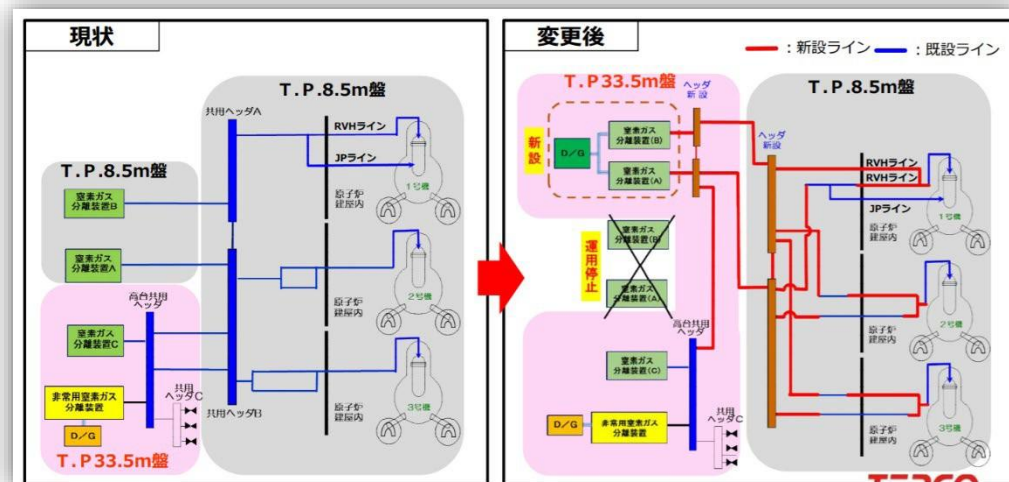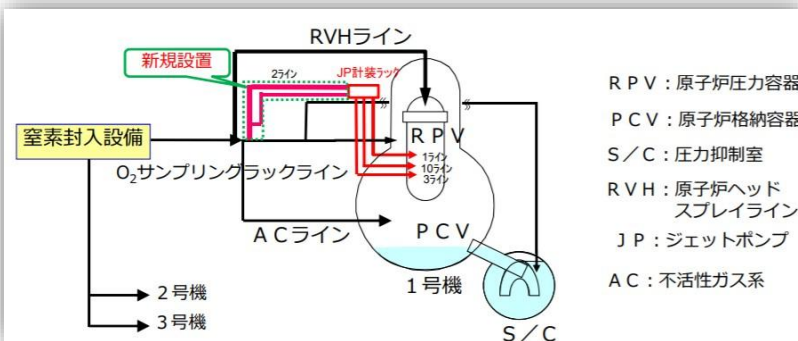

窒素ガス分離装置(B)のLCO逸脱に戻る

出典：2019年8月24日東京電力

「原子炉格納容器内窒素封入設備 1～3号機原子炉圧力容器封入ライン二重化及び窒素ガス分離装置A、B取替工事について」
<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-5.pdf>

2019年3月26日福島県「福島第一原子力発電所現地確認報告書」

<https://web.archive.org/web/20191020185614/http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/330661.pdf>

2019年6月東京電力「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」

https://www.tepco.co.jp/press/report/2019/1515154_8985.html

概要に戻る

(5) 1～3号機窒素封入設備他取替工事におけるインシデント

2020年2月27日の廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議(第75回)において、東京電力が提出した下記出典資料「1～3号機窒素封入設備他取替工事について」を開いたところ、5ページに

工事期間中に発生した不適合事象※の対策として、系統全ての弁について銘板の照合およびラインの識別表の取付を実施した。

という記述があったため、このことも含め、この工事計画についてレポートします。

東京電力は、窒素封入設備について、信頼性向上対策として原子炉圧力容器(RPV)窒素封入ラインの二重化工事を実施しました。

ところが、2019年8月、2号機の既設RPV封入ラインから新設RPV封入ラインへの切替を実施中、原子炉格納容器(PCV)内への窒素封入が停止しました。

原因は、操作対象弁の弁銘板に取付間違いがあり(次ページ画像参照)、弁操作により窒素封入ラインが閉塞されたためでした。

その後、弁状態を復旧し、窒素封入が再開されました。

(次ページに続く)

2019年8月のトラブル

このときのトラブルは、2個の弁の表示が入替わっていて違う弁を閉じてしまったものです。


下図の下のラインの13Aと表示された弁(本来は13B)を閉めようとしたが、上のラインの「13B」と表示されていた弁を閉めてしまったため、原子炉格納容器(PCV)内への窒素封入が停止してしまいました。

弁銘板の取付間違いの原因について、東京電力は、

取り付け時期が震災当初であり、ラインや弁の敷設状況が識別するには、高線量環境化で確認する時間が取れ難く、ラインが輻輳している状況であったため、間違って取り付けた


と推測しています。

(次ページに続く)

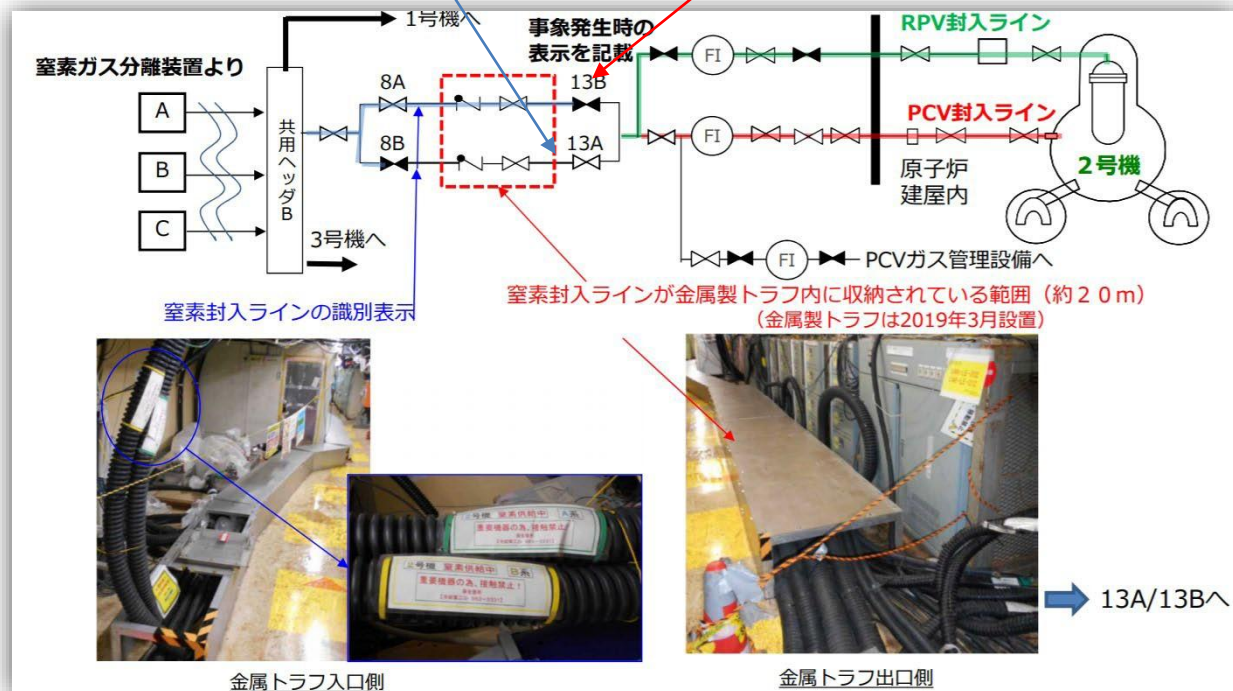

その後、当該弁13A/Bの弁銘板の間違ひは修正されました。

東京電力は、2020年2月現在、原子炉圧力容器(RPV)窒素封入ラインは二重化され、既に実施されているT.P 33.5 m盤での窒素ガス分離装置A及びBの取替並びに専用ディーゼル発電機の新設、免震重要棟からの遠隔起動化と併せ、「現在、窒素封入設備は信頼性向上工事が完了し、安定運転を継続中」としています。

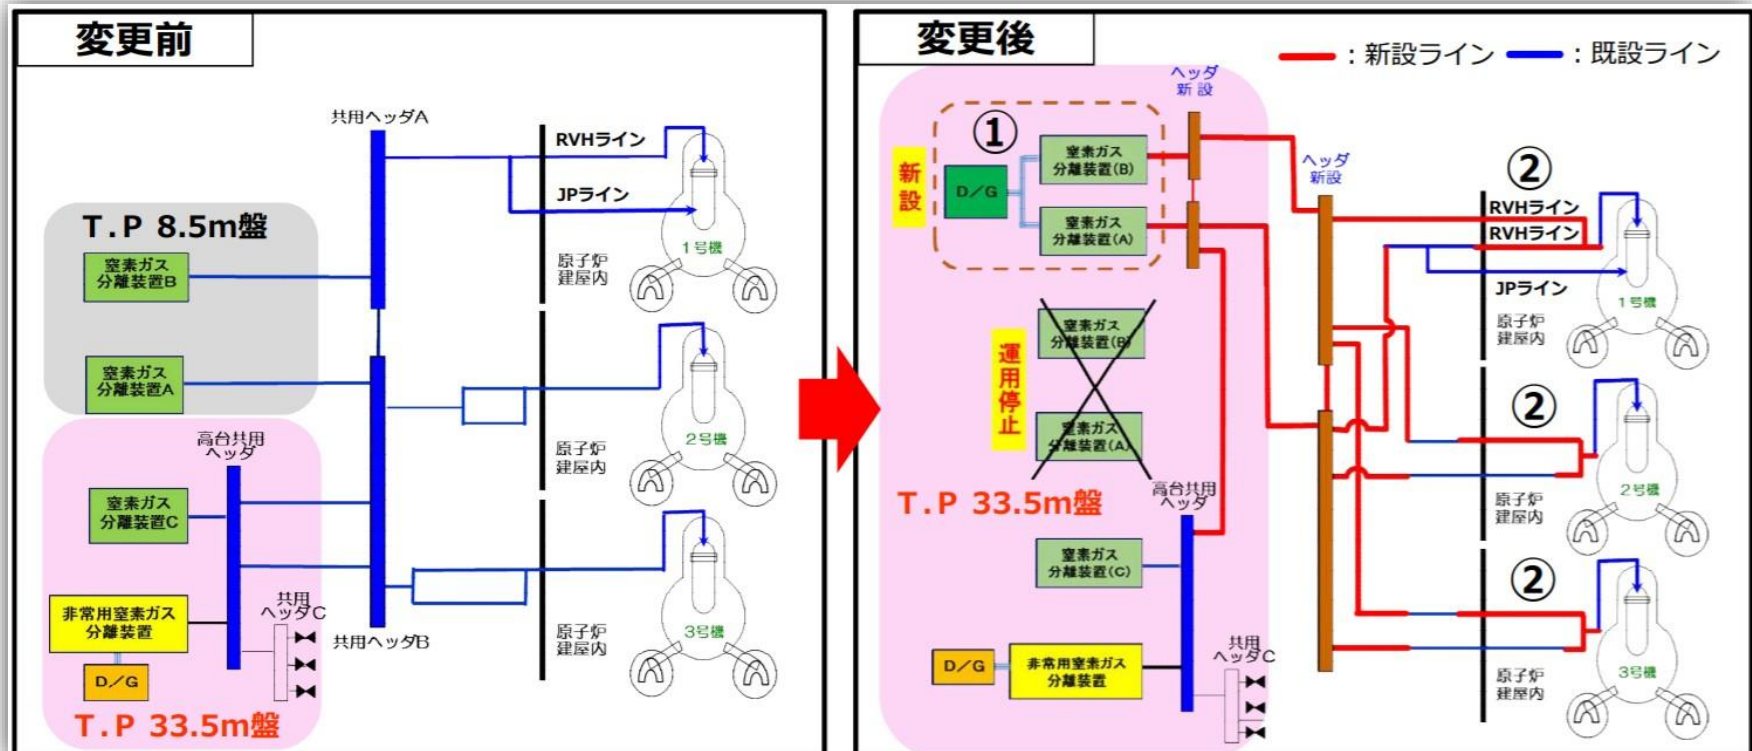

(6) 窒素封入設備の通気試験に伴う、1号機の窒素封入量変更

東京電力は、2019年12月20日に予定し延期されていた、窒素封入設備の通気試験に伴う、1号機の窒素封入量変更については、以下のとおり実施したと発表しました。各ラインの概要は下図をご参照ください。

[1号機窒素封入量変更実績]

(試験開始 1月30日午前10時12分)


原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン: 15 Nm³/h → 30～15 Nm³/h

ジェットポンプ計装ラックライン : 15 Nm³/h → 0～15 Nm³/h

(試験終了 1月30日午後1時50分)

原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン: 30～15 Nm³/h → 15 Nm³/h

ジェットポンプ計装ラックライン : 0～15 Nm³/h → 15 Nm³/h

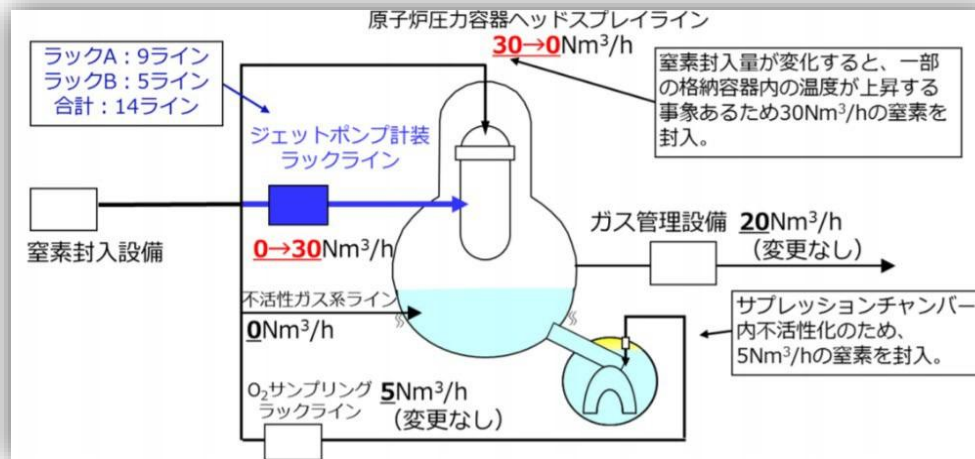

出典：2020年1月30日 東京電力ホームページ「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」

http://www.tepco.co.jp/press/report/2020/1527975_8987.html

2017年5月25日 東京電力資料「循環注水冷却スケジュール」

http://www.tepco.co.jp/decommission/information/committee/roadmap_progress/pdf/2017/d170525_10-j.pdf

概要に戻る

(7) a 窒素ガス分離装置(B)指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について

東京電力によると、窒素ガス分離装置B [参照](#) に関し、下記のようなLCO(実施計画に定められた運転上の制限)逸脱が生じたとのことです。(下線は筆者)

4月24日、窒素ガス分離装置の運転をB/CからA/Cへ切替を実施したところ、停止した窒素ガス分離装置Bについて、免震棟集中監視室の監視画面において③出口流量の指示値が減少しないことを確認した。その後の調査において、現場操作盤で警報(4月21日2:14発報)が発生していることを当直員が確認。また、その他の関連パラメータを確認したところ、4月21日以降窒素ガス分離装置Bの ①窒素濃度及び ③出口流量の指示値に通常の変動がなく一定となっていることを確認した。

当直長は、上記のことから、実施計画で要求される事項(「封入する窒素の濃度が99 %以上であることを毎日1回確認する」)を行うことができていなかったとし、4月24日13:40に「運転上の制限逸脱」を判断した。

なお、窒素ガス分離装置Bの窒素供給の停止を現場の ③出口流量の指示値(0 Nm³/h)で確認、またA/C運転時のパラメータ(窒素濃度、出口流量等)に異常がないことを確認し、当直長は「運転上の制限逸脱からの復帰」を同時刻13:40に判断した。

4月21日以降、PCV(筆者注:原子炉格納容器)内の水素濃度等の監視パラメータに異常は確認されていない。

窒素ガス分離装置Bの状態について、東京電力は、窒素ガス分離装置B本体のパッケージ内部に黒色の粉が広範囲に飛散し堆積しており、この黒色の粉は、装置内の活性炭槽または吸着槽に充填していた活性炭が細粒化されサイレンサから排気されたもので(装置内の他の部分に漏えいの跡がない)、これが、パッケージ内部に設置しているコントローラに流入し、コントローラが故障したことで、「電源異常」の発報に至った可能性があるとしています。

そして今後の対応として、下記の事項を挙げています。

運転継続中の窒素ガス分離装置A／Cについて、以下のとおり監視強化を実施(4月24日より実施中)

(1)現場運転状況確認

- ・現場巡視点検を1回以上／日にて実施
- ・運転状態、現場盤での警報発生の有無および、装置本体内部の異常の有無を確認

(2)免震棟集中監視室パラメータ確認

- ・運転状況のパラメータのトレンドグラフを監視装置に常時表示し確認を実施
- ・運転状況の傾向変化についても確認

(表示させるトレンドグラフは、指示値の変動が確認できるように表示スパンを拡大化)

確認対象パラメータは、窒素封入圧力、窒素封入流量、窒素ガス発生装置出口流量および窒素/酸素濃度

設備

窒素ガス分離装置B

構外に搬出し、損傷原因の調査及び点検を行う予定。なお、復旧については、設備の状態を確認したうえで検討。

窒素ガス分離装置A

B号機と同一製品であり、同様な事象が発生する可能性も否定出来ないことから、応急対策を検討中(サイレンサの排気口の屋外化等)。また、運転中のA号機に異常は確認されていないが、C号機のみでも1～3号機の窒素封入量の十分な確保が可能であり、安定的に窒素供給できることから待機号機とする。

※C号機が停止した場合、速やかにA号機を起動する。PCV内の水素濃度の制限に到達するまで時間的余裕があり、PCVへの窒素封入機能に影響はない。

(次ページに続く)

監視警報

現場警報が免震棟集中監視室に発報されなかったことについては、免震棟集中監視室でも検知できるように見直しを検討中。

この運転上の制限逸脱事象で気になることは、4月21日に窒素ガス分離装置B現場操作盤で警報が発生しており、また4月21日以降、窒素ガス分離装置Bの①窒素濃度及び③出口流量の指示値に通常の変動がなく一定となっていたにもかかわらず、窒素ガス分離装置(B)またはそのコントローラの異常が認知されたのが4月24日だということです。

東京電力は、今後の対応において、警報の認知については「現場巡視点検を1回以上／日にて実施」とし、パラメータの異常の認知については、免震棟集中監視室において「運転状況のパラメータのトレンドグラフを監視装置に常時表示し確認を実施」としているわけですが、逆に言うと、これまで警報の発生やパラメータの状態が常時モニターされているわけではなかったということになります。


窒素ガス分離装置のT.P.33.5 m盤の高台へ移転、および分離装置A 及びBの取替えは2019年のことであり、このときに上記のような対応がとれなかったものかと思われます。

(次ページに続く)

b 窒素ガス分離装置(B)指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について(続報)

(窒素分離封入ライン)

※吸着槽1と2の切替運転(吸着⇔再生)により連続的に窒素供給を行う。

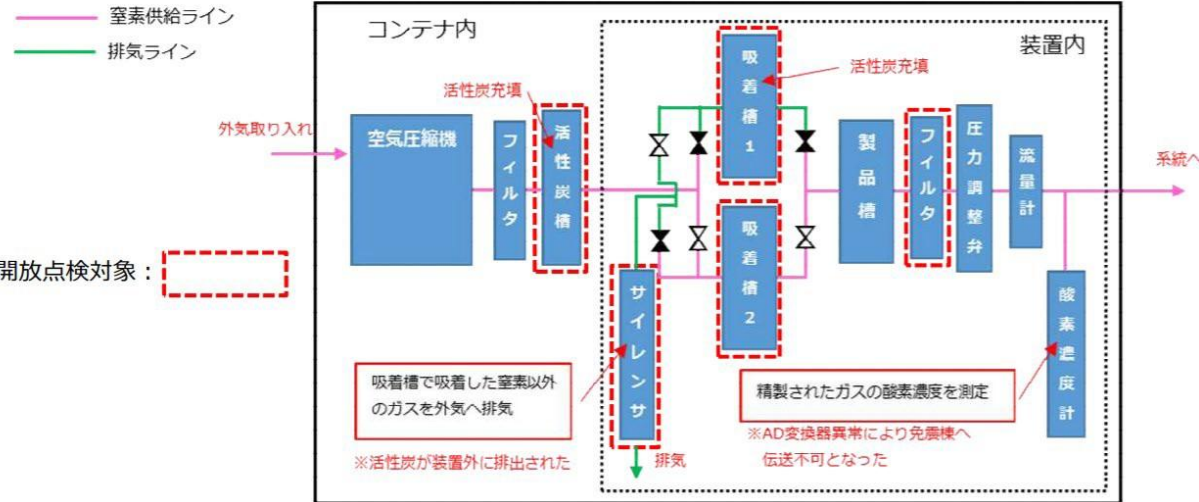


(次ページに続く)

(パラメータ伝送ライン)

当該警報が免震棟集中監視室に発報されない理由

窒素ガス分離装置の運転停止に関わる警報について、免震棟集中監視室に伝送する設計としていた為、当該警報は免震棟集中監視室に伝送されなかった。



出典 : 2020年5月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第78回) 資料
「窒素ガス分離装置(B)指示不良に関する不具合の原因と対策について
(窒素ガス分離装置(B)指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について(続報))」



<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf>

概要に戻る

東京電力の発表による、4月21日～4月24日に窒素ガス分離装置(B)に関連して起きた現象は以下の通りです。

- 1、4月21日以降、窒素ガス分離装置(B) の①窒素濃度及び③出口流量の指示値に通常の変動がなく一定となっていた。
- 2、AD変換器の不具合発生と同時に「FX3U-4AD電源異常」警報が(4月21日2:14発報)が発生していた。
- 3、AD変換器のDC24V電源ランプが消灯していた。
- 4、窒素ガス分離装置(B)本体のパッケージ内部に黒色の粉が飛散し堆積していた。
- 5、装置内の流路を構成する配管・機器の継手部に漏えいの痕跡がなかった。
- 6、AD変換器内のヒューズが開放していた。
- 7、AD変換器上面のスリット部に黒色の粉が堆積されていた。
- 8、吸着槽1の活性炭が減少・細粒化していた。
- 9、出口フィルタの外側に活性炭が付着、内側には付着していなかった。

(次ページに続く)

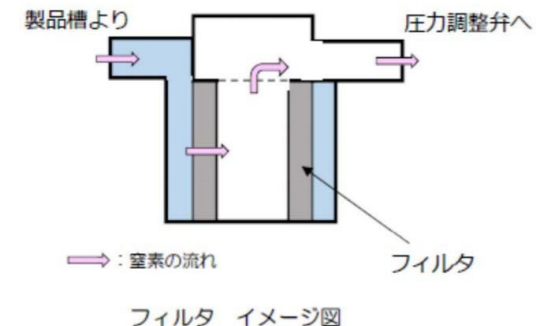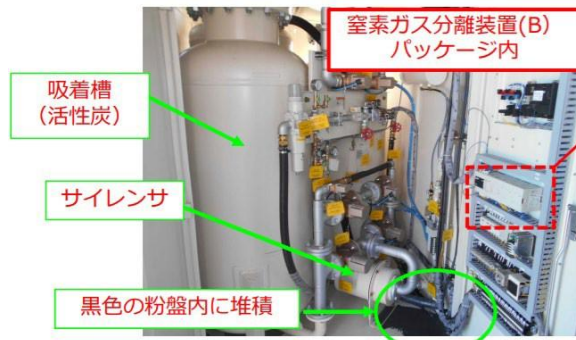

出典：2020年5月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第78回） 資料
「窒素ガス分離装置（B）指示不良に関する不具合の原因と対策について
（窒素ガス分離装置（B）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について（続報）」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf>

概要に戻る

そして以上の現象から、事象の原因を以下のように推定しています。

- ① 当該装置の吸着槽1内に充填されていた活性炭が細粒化し、吸着槽の下流側にある装置内のサイレンサから排出されて、当該装置内に活性炭が飛散した。
- ② 飛散した活性炭が当該装置内のAD変換器のスリットから内部に混入したことにより、回路が短絡したことでヒューズが開放し、回路への電源供給が絶たれたため、AD変換の機能が喪失した。AD変換器の不具合により、計器からの信号を変換・伝送できず、不具合発生時の信号がシーケンサに保持された状態となったため、免震棟集中監視室に伝送される指示値が一定になったと考えられる。
- ③ また、AD変換器の不具合による現場警報が免震棟に発報されない設計であったことから、当直員は機器の異常を検知することができなかった。

さらに、窒素分離封入ラインへの影響を以下のように推定しています。

- (1)確認された活性炭はフィルタにより捕集され、フィルタより下流には流入していないことから、窒素封入系統への影響はなかったと考えられる。
- (2)再現性試験において、装置内酸素濃度計の指示値「0.0%」(窒素濃度100.0%)が確認されたことから、不具合が確認された4月21日から24日の運転期間において、原子炉格納容器へ封入する窒素濃度は99%以上を満足していた状態であり、原子炉格納容器内の不活性雰囲気維持機能は確保されていたと考えられる。

つまり、4月21日から24日までの間、窒素ガス分離装置(B)が機能を維持していたかどうかは、リアルタイムのパラメータがAD変換器の故障により実態を示さなくなったパラメータを含んでいるため、事後の再現性試験による機能確認によって、「原子炉格納容器内の不活性雰囲気維持機能は確保されていたと考えられる」と、間接的な推定しかできないようです。 [続報2に戻る](#)

c 窒素ガス分離装置(B)指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について (続報2)

2020年7月、東京電力は、これまでレポートしてきた不具合を生じた窒素ガス分離装置(B) **参照** について、下記の点検と対策を実施したことから、窒素ガス分離装置(B)の運転を7月13日再開したと発表しました。(次ページに画像掲載)


原因	対策	状況
吸着槽の活性炭流出 吸着槽 1 内に充填されていた活性炭が細粒化し、装置内のサイレンサから排出されて、当該装置内に活性炭が飛散した。	活性炭の 細粒化 が起きないように吸着槽の 緊密化 を行う。 ⇒活性炭の充填高さが変わらなくなるまで、活性炭の充填高さの確認と補充を繰り返し実施する。	窒素ガス分離装置(B)について実施済
活性炭の混入による制御装置の不具合 飛散した活性炭が当該装置内の制御装置内部に混入したことにより、制御装置の機能が喪失した(回路短絡による電源供給喪失)。 ↓ 制御装置の不具合により、計器からの信号を変換・伝送できず、不具合発生時の信号が保持された状態となり、免震棟監視室に伝送される指示値が一定になった。	活性炭細粒化の可能性を完全には否定できないことから、 サイレンサの排気を窒素ガス分離装置の外部に排出 できるよう改造を行う。 (A号機についてもB号機と同一製品であることから同様な対策を実施する)	・窒素ガス分離装置(B)について実施済 ・同型機である窒素ガス分離装置(A)はB号機運転開始後、実施予定 (C号機は設計が異なり、屋外に排気される)
現場警報が免震棟に発報されなかった 制御装置の不具合による現場警報が免震棟に発報されない設計であったことから、当直員は機器の異常を検知することができなかった。 (窒素ガス分離装置の警報のうち、運転停止に関わるものについて、免震棟集中監視室に伝送する設計としていた)	今回の事象を踏まえ窒素ガス分離装置の現場警報について、 免震棟監視室に発報されるよう改造 を行う。	・窒素ガス分離装置(B)について実施済 ・窒素ガス分離装置(A/C)はB号機運転開始後、実施予定。

- ・不具合のあった制御装置について交換を実施。
- ・不具合が確認された制御装置以外について、異常は確認されていないが飛散した活性炭の影響が懸念されることから、点検や部品の交換等を実施済。

吸着槽 1 の活性炭の充填状況



サイレンサの設置状況

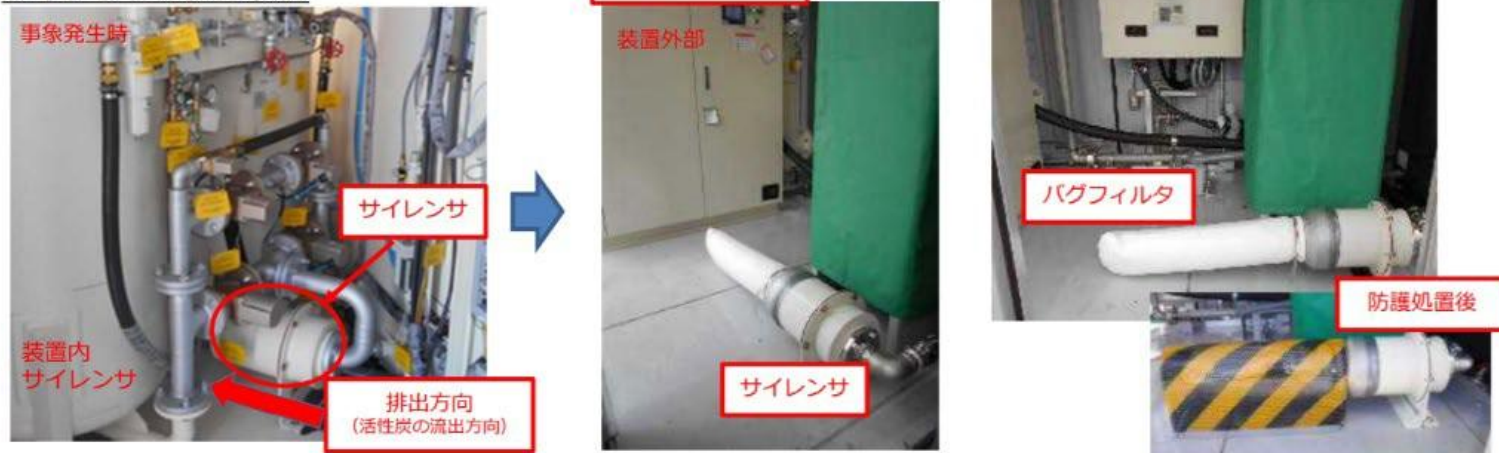

3

(8) a 2号機原子炉格納容器(PCV)の減圧機能確認の実施について


東京電力は2020年7月2日、2021年に予定している2号機での核燃料デブリの試験的取り出し(PCV内部調査)に向け、PCV外への放射性ダストの漏出抑制を目的として、PCVを減圧することを検討していることを発表しました。

東京電力は、イチエフの1～3号機原子炉において、PCV内の減圧により外部への放射性物質の放出リスクを低減させ、またPCV内部調査時におけるPCV内外の遮断(バウンダリ)開放作業等の作業性を向上させるために、2018年7月からの減圧試験を経て、12月1日より、PCVの設定圧力を大気圧+2 kPa程度を中心に、0 kPa～ 5.5 kPaを運用範囲として運用してきました。 参照

ちなみに2020年7月1日の原子炉格納容器圧力は、1号機0.16 kPa g、2号機2.55 kPa g、3号機0.41 kPa gとなっています。

今回は、2020年7月6日～10日に、現状値から大気との均圧まで減圧することを目標として、既設ガス管理設備のフィルタを介した排気量を増加させることで、減圧機能の確認をするということです。

東京電力は、2012年以降、PCV圧力低下と共に一定期間水素濃度の上昇・下降がみられたこと、低気圧通過等によりPCVが負圧となった場合の酸素濃度の上昇評価、2018年度にPCV圧力の調整を約4.25 kPaから約2 kPaに変更した際は、水素濃度等の監視パラメータに有意な変動は確認されていないことなどに留意しつつ減圧計画を進めるようです。

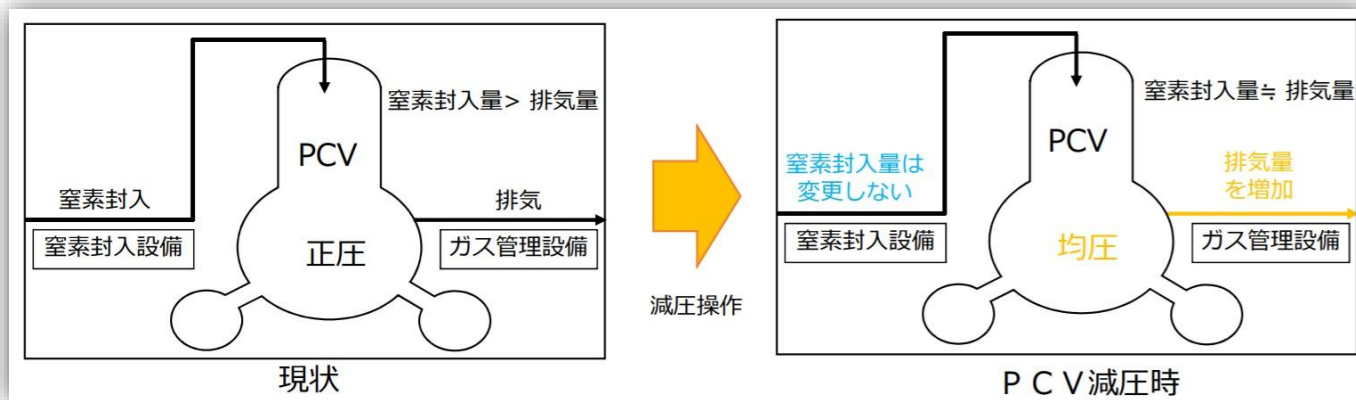

出典：2020年7月2日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第79回） 資料「2号機 原子炉格納容器(PCV)の減圧機能確認の実施について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/06/3-3-4.pdf>

2020年7月2日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第79回） 資料「福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/06/1-1.pdf>

概要に戻る

b 2号機原子炉格納容器(PCV)の減圧機能確認の結果について

2020年7月30日、東京電力は、2号機原子炉格納容器の減圧機能確認(前ページ参照)について、7/6～7/8に機能確認を実施し、7/9に復旧。減圧機能確認中、下表の監視パラメータに異常がないことを確認したと発表しました。

監視 パラメータ	監視頻度		監視目的	機能確認試験継続の判断基準
	通常時	監視 確認時		
窒素封入量	6時間	毎時	・ガス管理設備の運転状態変化に伴う、系統・機器の異常がないことを確認	・通常の変動範囲(±1Nm ³ /h程度)であること(封入量の異常検知)
排気流量				・通常の変動範囲(±2Nm ³ /h程度)であること(排気流量の異常検知)
PCV圧力			・PCV圧力の過度な変動等が生じないことを確認	・±5.5kPaであること
水素濃度※			・PCVの不活性状態維持(可燃限界未滿に抑えること)	・警報設定値(0.6%)
酸素濃度				・3.5%以下であること
ダスト濃度	毎時		・PCV圧力の変化に伴う排気に有意な変動が生じないことを確認。	・警報設定値(2.0×10 ⁻³ Bq/cm ³)
大気圧			・PCV圧力変動の参考として監視。	・なし

※運転上の制限に関わる監視項目として、水素濃度(PCV内 2.5%未滿, ガス管理設備出口を1%未滿で管理)があり、減圧によるPCV内部状況の変化は小さく、影響は限定的と想定。

(9) 2号機新設原子炉圧力容器(RPV)窒素封入ライン通気確認について

東京電力は、2号機原子炉圧力容器窒素封入点は、単一構成となっているため、窒素封入ラインの信頼性向上としてRPV窒素封入ラインの追加設置を計画しています。


この計画に向けて、2020年8月31日～9月4日にかけて、窒素封入の通気性・保守性等を考慮した追加設置ラインの選定のため、新規封入点の候補となるライン(4ライン)の通気確認を行います。

なお、通気確認は既設のRPV窒素封入量及び原子炉格納容器(PCV)ガス管理設備排気流量は変化させずに実施するそうです。

2. 調査対象 (新規封入候補点配置図)

新規封入点RPVからPCVへの窒素の拡散性や作業性等を考慮して、右図の4箇所のノズルにつながる計装ラック選定。これらについて、通気確認を行う。

- ① 原子炉計装ラック (原子炉水位計等) 【N11B】
- ② 原子炉計装ラック (原子炉水位計等) 【N11A】
- ③ 主蒸気計装ラック 【N3D】
- ④ ジェットポンプ計装ラック 【N8B】
- ※既設 原子炉計装ラック (原子炉水位計等)

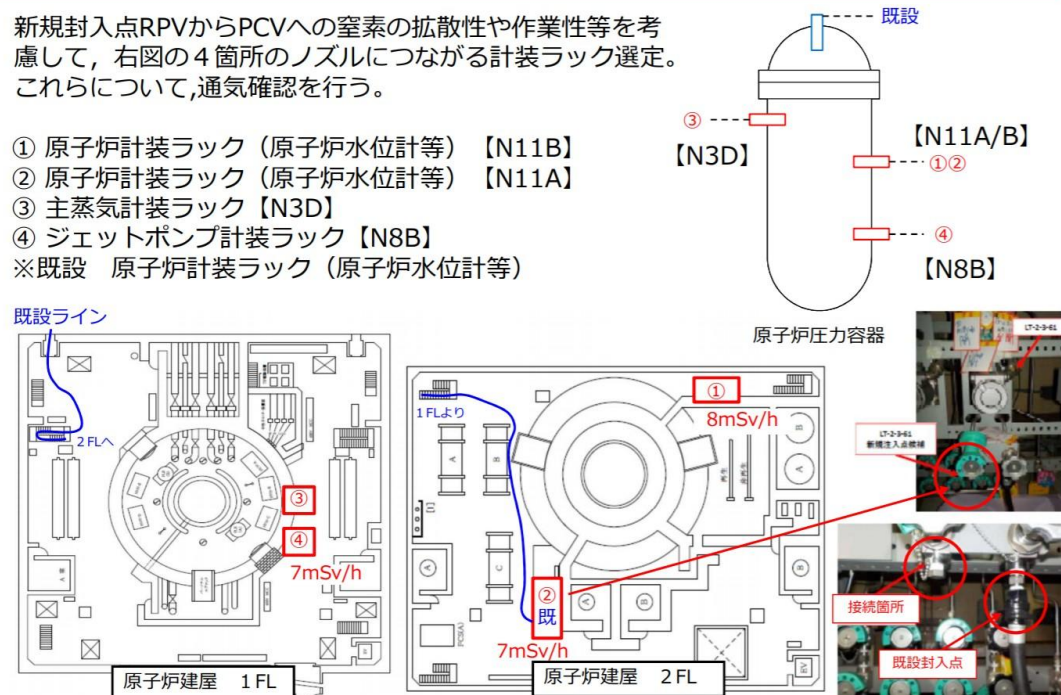

出典：2020年8月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第81回） 資料
「2号機新設RPV窒素封入ライン通気確認について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/08/3-5-3.pdf>

概要に戻る



(10) 1号機 原子炉格納容器窒素封入ライン(不活性ガス系)撤去について

1号機原子炉建屋は、現行ロードマップでは2027年に開始される予定の使用済み核燃料プールからの使用済み核燃料の取り出しについて、2019年12月、ダスト飛散対策の信頼性向上の観点から2023年中に大型建屋カバーを再設置する工法に変更しています。

東京電力は、大型カバー設置に向けて、使用する大型クレーンの走行路の拡幅(ヤード整備)を計画し、この拡幅の妨げになる1号機原子炉格納容器窒素封入ライン(不活性ガス系)を撤去する計画を発表しました(下左図参照)。
今回撤去するのは、予備封入ラインの一つである不活性ガス系封入ライン(AC系)ですが、原子炉格納容器への窒素封入機能は、他のラインにより維持されます(下右図参照)。

配管切断および閉止作業は準備も含め、2020年11月17日～27日に行われる計画です。


(次ページに続く)

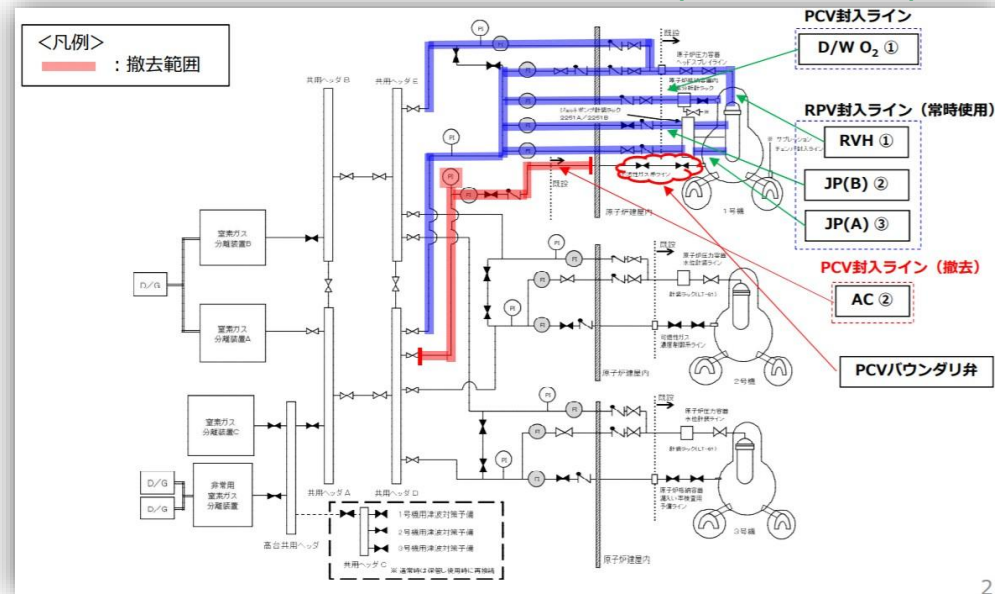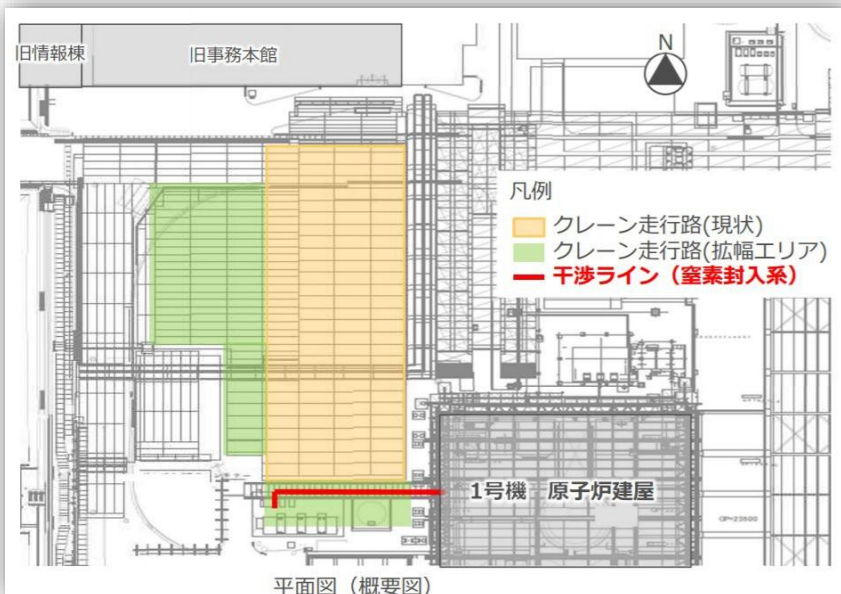

出典：2020年11月26日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第84回）資料
「福島第一原子力発電所 1号機 原子炉格納容器窒素封入ライン(不活性ガス系)撤去について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/11/3-5-2.pdf>

概要に戻る

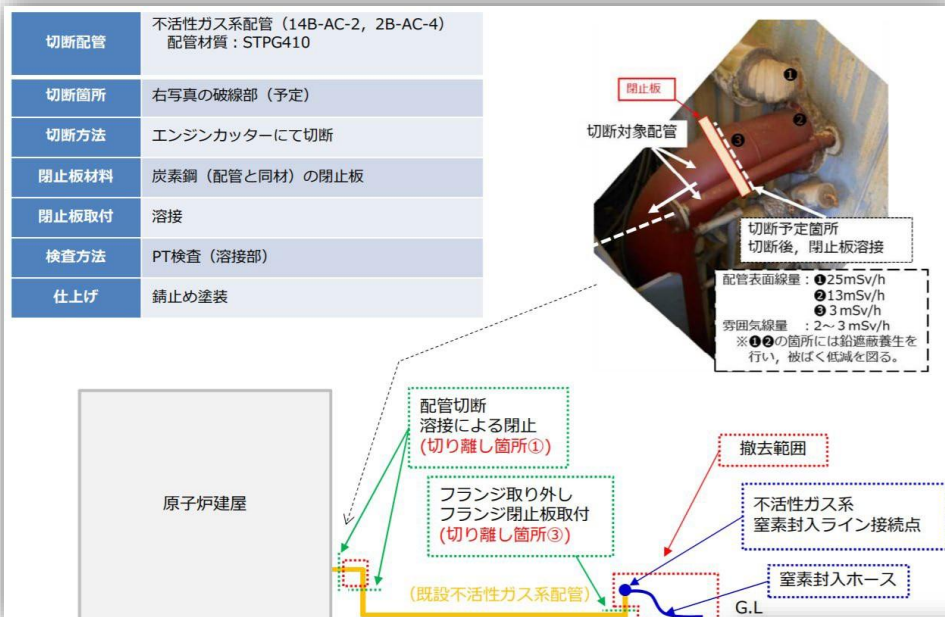

リスク	対応
弁のバウンダリ機能喪失 - PCVからの逆流 (PCV圧力の低下) - 水素の滞留	配管内圧の確認 - 撤去対象ラインの空きフランジに仮設圧力計を取付け、配管内の圧力を確認した。N2封入時の圧力 (11.3kPa) が確認されたことから弁のバウンダリ機能は正常。PCVからの逆流はなく、配管内に水素の滞留はないと推定。 ※配管内圧確認時のPCV圧力: 約0.10kPa - 念のため、配管内圧開放後、配管切断前に小口径の穴を開けて水素濃度を測定してから切断作業を開始する。
ダストの拡散	配管内包気体の汚染確認 - 配管内に残圧があることから、切り離し前に空きフランジにフィルタを取付けた仮設ラインを設け、フィルタを通して圧抜きを実施する。また、フィルタの線量を測定し、汚染の有無を確認する。(合わせて水素濃度・PCV圧力の挙動も確認する) 配管切断時ダスト拡散対策 - 仮設ハウス及び局所排風機・フィルタを設置し、環境へのダスト拡散防止対策を実施する。


出典: 2020年11月26日 廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議 (第84回) 資料
「福島第一原子力発電所 1 号機 原子炉格納容器窒素封入ライン (不活性ガス系) 撤去について」

<https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/11/3-5-2.pdf>

概要に戻る

(11) 原子力格納容器ガス管理設備スケジュール

(更新)

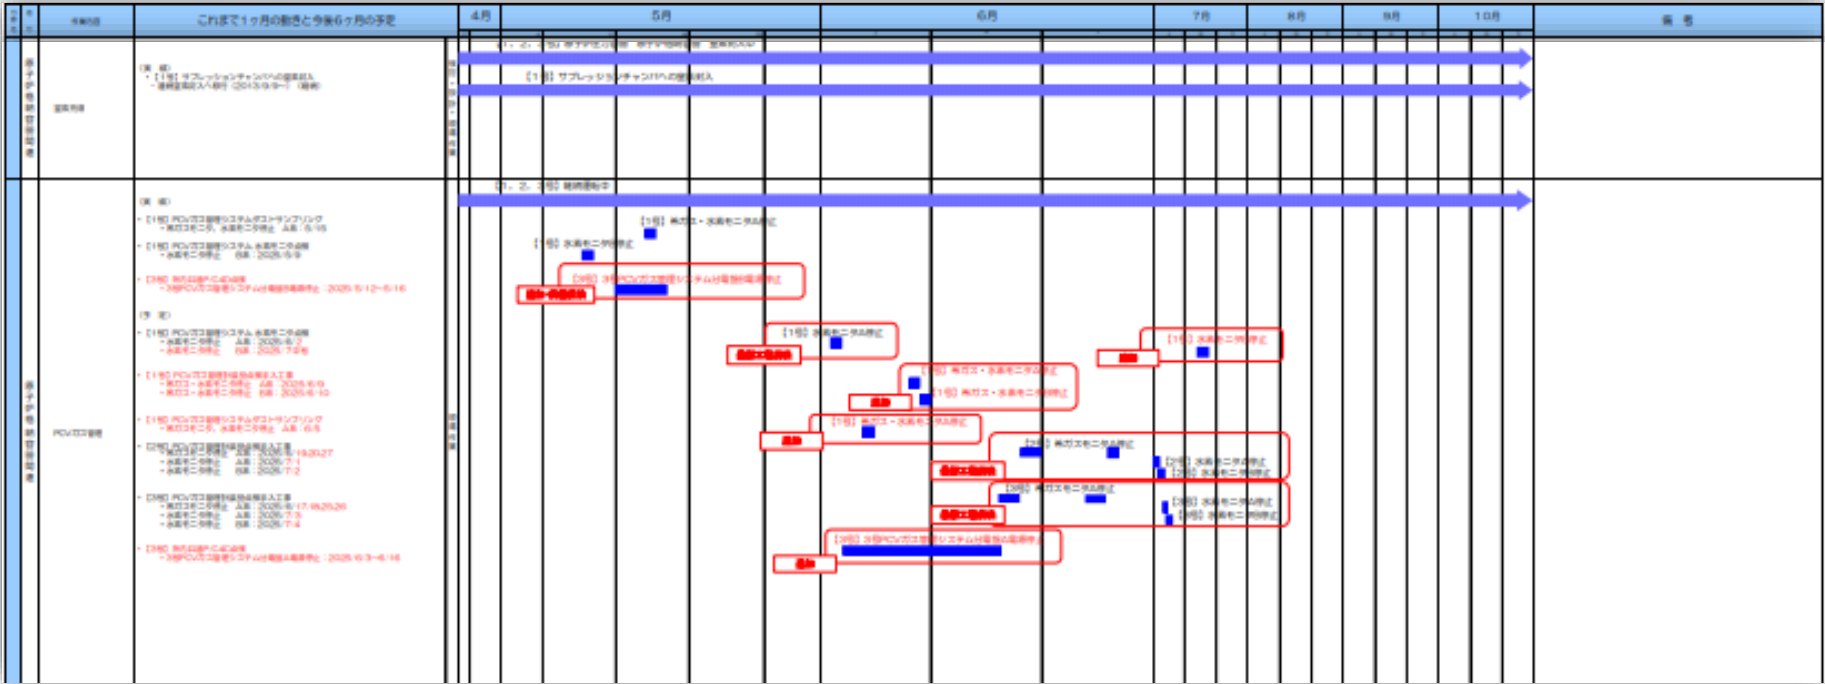

8 東京電力が発表してきた原子炉の状態を表すデータの信頼性について(1)

3号機の温度計ケーブルに溶断が見つっています。

2017年11月の「核燃料デブリの取り出し準備」レポート88・89ページでレポートしたとおり、3号機格納容器内部調査により、これまで3号機原子炉圧力容器底部の温度を測っていたとされていた温度計12本(このうち3本は「実施計画」において運転上の制限からの逸脱を監視するために用いられていた)のケーブルが溶断していたことが明らかになり、11月30日、東京電力はこれらの温度計を故障と判断し、原子力規制委員会にもその旨報告しました。

しかしこれらの温度計は11月まで故障とはされておらず、原子力規制委員会に11月に提出した温度計の信頼性評価の報告書においても、「監視に使用可」と評価されていました(下記出典3の9ページ、TE-2-3-69L1からL3の3本)。

また、東京電力のホームページ上の「プラント関連パラメータ(水位・圧力・温度など)」においても11月29日分までは、これらの温度計で測定したとされる温度が原子炉圧力容器底部の温度として公表されていました。

出典：1F-Watcher「月例レポート 2017年11月燃料デブリの取り出し準備」
<https://1fwatcher.files.wordpress.com/2017/12/201711-05-debris4.pdf>

2017年11月30日東京電力資料

「福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器(PCV)内部調査における一部の原子炉圧力容器(RPV)温度計ケーブル欠損について」
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images2/handouts_171130_03-j.pdf

2017年12月1日東京電力 原子力規制委員会提出資料

「福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について(平成29年12月提出)」

<http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf2/171201j0201.pdf>

2017年11月1日東京電力 原子力規制委員会提出資料

「福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について(平成29年11月提出)」

<http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf2/171101j0201.pdf>

東京電力ホームページ「プラント関連パラメータ(水位・圧力・温度など)」

<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/index-j.html>

概要に戻る

東京電力が発表してきた原子炉の状態を表すデータの信頼性について(2)

このことについて、12月18日の東京電力原子力定例記者会見において、木元原子力立地本部長代理は、目視できない原子炉内の温度計の健全性を確認する方法は、現在のところ、温度計に直流電気を流しその抵抗値を測定する(故障していれば抵抗値は無限大になる)方法しかないが、今回故障と判断した12本の温度計について12月13日に改めて測定したところでも、抵抗値は前回測定した値と同等の値を示していた。現在はこれらの温度計が示すデータが何を表しているかについてそれ以上の知見はないと語っています(出典の動画の26分過ぎから36分過ぎまで)。

原子炉の状態そのものについては、木元氏が語る通り、他の温度計・ガス管理システム等、他のパラメータから、冷温停止状態にあることは間違いないところではあると思われます。

しかし、これまで毎月、信頼性を確認したとし、公表してきたデータが、東京電力自身が今回故障していたと判断した温度計で測定したデータであったことは、東京電力が公表してきたデータの信頼性を損なうものです。

温度計のケーブルの溶断という事実と、それにもかかわらずデータが採れてしまっていることの機序を明らかにするとともに、温度計の信頼性を確認する方法を再検討し、データの信頼性を回復することが東京電力に求められます。

9 原子炉建屋から新たに放出された放射性物質量の評価についての考察

東京電力は、2018年10月25日、第59回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議において提出した下記出典資料
「廃炉・汚染水対策の概要」

の

4ページ「2. 原子炉建屋からの放射性物質の放出」

において、

1～4 号機原子炉建屋から新たに放出される放射性物質による、敷地境界における空气中放射性物質濃度は、Cs-134 約 1.4×10^{-11} ベクレル/cm³ 及び Cs-137 約 1.1×10^{-10} ベクレル/cm³ と評価。放出された放射性物質による敷地境界上の被ばく線量は 0.0011 mSv/年未満と評価。(筆者注: 評価値は【放出量＝放射性物質濃度×排気風量】を基本とする評価式に各種データ、パラメータを代入して計算した推定値)

と発表しました。

9月の敷地境界における空气中放射性物質濃度と敷地境界上の被ばく線量の評価値について、8月の評価値からの増加を見てみましょう。

	(8 月)	→	(9 月)
Cs-134(単位ベクレル/cm ³)	5.4×10^{-12}	→	1.4×10^{-11}
Cs-137(単位ベクレル/cm ³)	3.1×10^{-11}	→	1.1×10^{-10}
被ばく線量	0.00045 mSv/年未満	→	0.0011 mSv/年未満

そして、このことについて、

- ・2018 年 9 月の評価上の放出量は、放出管理の目標値(筆者注:1 mSv/y)を十分下回ったが、前月と比較すると増加。
- ・これは 2号機原子炉建屋オペフロ残置物撤去作業に伴い、オペフロ内の空気中放射性物質濃度が上昇したこととで、**評価上の放出量が増加したもの**

と解説し、さらに

- ・(筆者注:評価のための式は)過小評価となることを避けるため、建屋内の空気中の放射性物質濃度ならびに排気風量に保守的な条件を仮定して評価していることから、実際の放出量は評価値より小さくなる。
 - ・また、当該作業中の 2 号機原子炉建屋開口部近傍(西側構台)のダストモニタならびにモニタリングポストには有意な変動はなく、周辺への影響はない。
 - ・今後、放出量評価を実際の値に近づけるため、建屋からの排気風量評価値を低減する対策として、10 月中に原子炉建屋の開口部の一つである二重扉をシート養生し、開口部面積を低減する。
- また、対策実施済の西側前室、ブローアウトパネルの隙間の開口部面積についても見直した上で評価を行う。

と説明を加えています。

なお、この記述は、同回の会議だけに提出された資料

「1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量評価結果 2018年9月分(放出量評価の補足)」

<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-6-4.pdf>

をまとめたもののようです。

ここでは、**前ページ**での東京電力の説明のうち、

・(補注:評価のための式は)過小評価となることを避けるため、建屋内の空気中の放射性物質濃度ならびに排気風量に保守的な条件を仮定して評価していることから、実際の放出量は評価値より小さくなる。


・今後、放出量評価を実際の値に近づけるため、建屋からの排気風量評価値を低減する対策として、10 月中に原子炉建屋の開口部の一つである二重扉をシート養生し、開口部面積を低減する。

また、対策実施済の西側前室、ブローアウトパネルの隙間の開口部面積についても見直した上で評価を行う。

という部分の、開口部面積を低減することによって評価放出量が減少するかどうかということについて、東京電力が発表した8～10月の2号機オペレーティングフロア作業時の放射性ダスト濃度と原子炉建屋の開口の隙間及びブローアウトパネルの隙間(下図参照⇒2019年1月17日に福島第一廃炉カンパニーの社員の方に確認したところ、下図のブルーの向きの矢印は、左側が西側前室の開口の隙間からの放出を、右側が元のブローアウトパネル部からのフィルターを備えた排気設備への放出を示しているそうです)の評価放出量のデータを検討します。

まずこれらの数値をプロットした次ページのグラフをご覧ください。

2. 開口の隙間及びブローアウトパネルの隙間

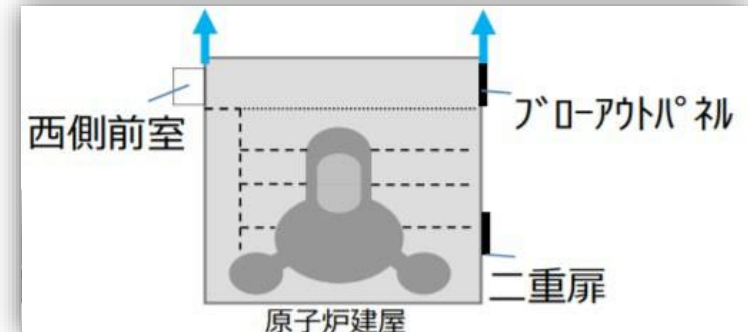

原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果 (2018年8月)

<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-6-3.pdf>

原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果 (2018年9月)


<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-6-3.pdf>

1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量評価結果 2018年10月評価分 (詳細データ)

<http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/12/3-6-3-2.pdf>

概要に戻る

ダスト測定値、パラメーターおよび評価放出量との関係

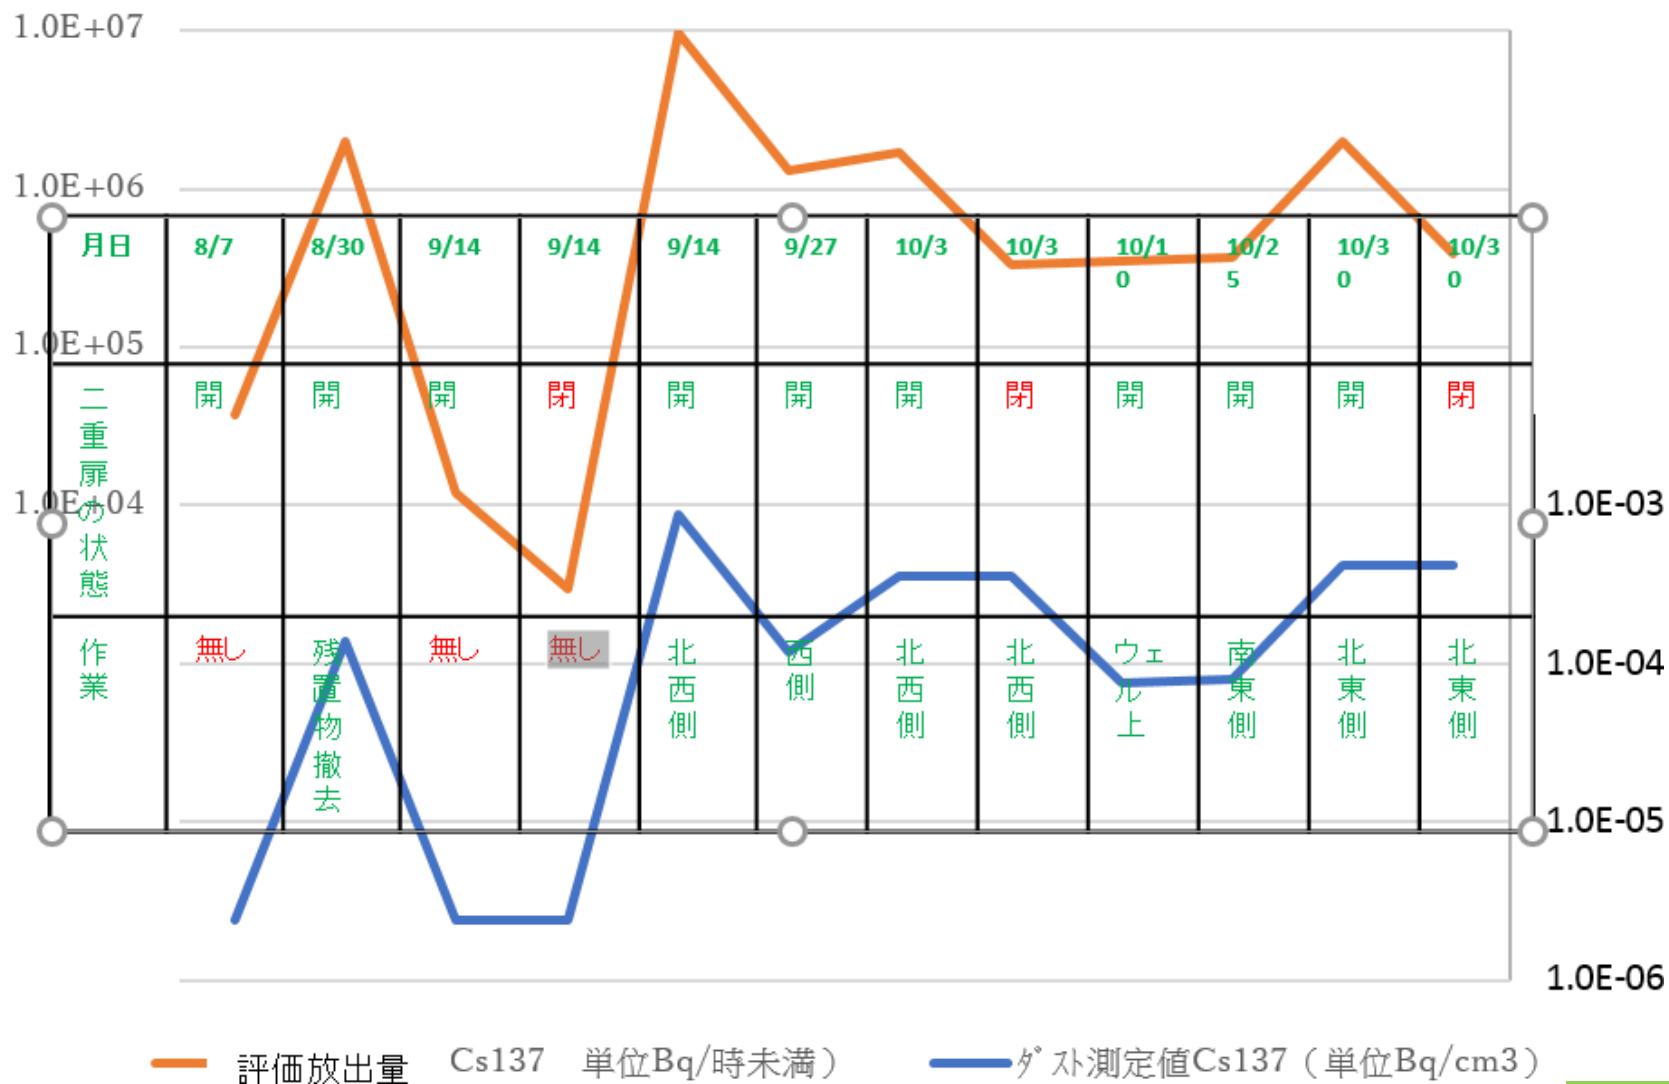

グラフの青い折れ線は測定されたダスト濃度、オレンジ色の折れ線は評価放出量です。

重ね合わせた3段12列の表は上から、ダスト濃度が測定された日時、開口部である二重扉（前々ページの下右図をご覧ください）の開閉状態、オペレーティングフロア上での作業の有無です。

この問題では、

左から3列目（9/14、二重扉は開いている、作業はなかった）と4列目（9/14、**二重扉は閉じている**、作業はなかった）、7列目（10/3、二重扉は開いている、北西側作業）と8列目（10/3、**二重扉は閉じている**、北西側作業）、11列目（10/30、二重扉は開いている、北東側作業）と12列目（10/30、**二重扉は閉じている**、北東側作業）をご覧ください。

いずれも、測定されたダスト濃度は変わらないにもかかわらず、二重扉を閉めることで評価放出量は減少しています。前々ページに示した東京電力の説明、開口部面積を低減することによって評価放出量が減少することは確かなようです。

なお、2018年10月のレポート以来考察してきた、2号機オペレーティングフロア上での残置物撤去作業にともなう敷地境界における空气中放射性物質濃度と敷地境界上の被ばく線量の評価値の上昇についての、東京電力の「**評価上の放出量が増加した**」という表現の妥当性については、「使用済み核燃料プール対策レポート」で考察しています。

10 東京電力が発表したイチエフ内のインシデント・事故情報

(更新)

- 05月26日 [協力企業作業員の管理対象区域内における飲水事案](#)
- 05月27日 [\(不適合の公表 GⅡ 以上\) 管理対象区域内における飲水事案発生\(発見日5月23日\)](#)
- 5月29日 [\(不適合の公表 GⅡ 以上\) 管理対象区域内における飲水事案発生\(発見日5月26日\)](#)

11 ① イチエフに関する報道【廃炉作業】

(更新)

今月の中区分:2号機で試験的に取り出された核燃料デブリの分析/ 放射性廃棄物の処理・処分/未分類

< 2号機で試験的に取り出された核燃料デブリの分析 >

2025.05.29 共同通信 [デブリ「燃料成分多い可能性」 原発2回目採取、分析結果発表](#)

2025.05.30 福島民友新聞 [第1原発採取デブリ空洞を確認 「2回目」分析結果、茶色近い褐色特徴](#)

< 放射性廃棄物の処理・処分 >

2025.05.31 共同通信 [東電、最大の貯蔵庫を本格運用 10棟目、がれきを一時保管](#)

< 未分類 >

2025.05.02 福島民友新聞 [廃炉の状況、疑問答えます…福島県内、16市町村で対話の会](#)

(次ページからイチエフ事故の後始末)

11 ② イチエフに関する報道【イチエフ事故の後始末】

(更新)

今月の中区分:福島県内の除染土の県外処理処分/避難者/検証・伝承・記録/帰還困難区域に関する動き/ ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響/旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事/未分類

<福島県内の除染土の県外処理処分>

2025.05.03	福島民友新聞	除染土再生利用促進へ 県外で小規模活用検討 花壇など想定
2025.05.22	共同通信	除染土、官邸・省庁花壇に再利用 政府検討、東電福島第1原発事故
2025.05.23	福島民報	除染土再利用、官邸に加え霞が関でも 政府が理解醸成へ検討 実現なら福島県外で初
2025.05.27	福島民友新聞	【速報】除染土再利用へ「理解醸成重要」と官房長官
2025.05.27	共同通信	原発除染土、官邸で初利用へ 政府「花壇」で実績、理解狙う
2025.05.28	福島民友新聞	「除染土の官邸活用」明記 閣僚会議で基本方針決定
2025.05.28	福島民友新聞	除染土の最終処分候補地、選定工程具体化促す 自民提言案
2025.05.28	福島民友新聞	「飛散、流出防ぐ対策を」 除染土再生利用、都民らの受け止め
2025.05.31	宮崎日日新聞	福島原発除染土 処分場受け入れ 宮崎県、条件付きで「検討意向」

<避難者>

2025.05.21	福島民報	【震災・原発事故14年】福島市への避難者、孤立防止 支援センター開所 社協連携 飯舘、浪江の職員も勤務
------------	------	---

(次ページに続く)

概要に戻る

11 ② イチエフに関する報道【イチエフ事故の後始末 続き】

(更新)

今月の中区分:福島県内の除染土の県外処理処分/避難者/検証・伝承・記録/帰還困難区域に関する動き/ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響/旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事/未分類

<避難者 了>

- 2025.05.21 福島民報 [【震災・原発事故14年】ありがとう「桜風舎」福島県富岡町のNPO 郡山市の交流拠点閉所](#)
- 2025.05.24 福島民報 [震災に伴う避難、帰還後の生活について自由に語る 福島県富岡町で「語り人アワー」](#)
- 2025.05.26 共同通信 [神奈川避難者、東電と和解 原発集団訴訟、全国5例目](#)

<検証・伝承・記録>

- 2025.05.03 福島民報 [一時解体検討の旧小高教会幼稚園の園舎 改修し歴史郷土資料室を開設 卒園生の熱意実る 福島県南相馬市](#)
- 2025.05.03 福島民友新聞 [双葉町出身・歌手あやこさん、歌謡コンサート 5日に原子力災害伝承館](#)
- 2025.05.04 福島民報 [復興の祈り舞踊に込め 92歳、表現の情熱今も 8月連盟50周年で新作披露 福島県内第一人者 横山慶子さん\(浪江出身\)](#)
- 2025.05.13 福島民報 [避難住民の交流拠点閉所へ 富岡町3・11を語る会の「人の駅 桜風舎」福島県郡山市\(再掲\)](#)
- 2025.05.16 福島民友新聞 [大堀相馬焼・旧松永窯、6月中旬から公開へ 浪江、福島県内初の「民間遺構」](#)
- 2025.05.20 福島民報 [大阪・関西万博、福島県復興の展示始まる 震災と原発事故からの歩みを発信 24日まで](#)

概要に戻る

(次ページに続く)

11 ② イチエフに関する報道【イチエフ事故の後始末 **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:福島県内の除染土の県外処理処分/避難者/検証・伝承・記録/帰還困難区域に関する動き/ ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響/旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事/未分類

<検証・伝承・記録 **了**>

- 2025.05.24 福島民報 [震災に伴う避難、帰還後の生活について自由に語る 福島県富岡町で「語り人アワー」](#) (再掲)
- 2025.05.27 新潟日報 [永瀬正敏さん原案・主演映画「いきもののきろく」、東日本大震災被災者の言葉胸に「震災を作品で残したい」 シネ・ウインド\(新潟市中央区\)で5月29日まで上映](#)
- 2025.05.31 福島民友新聞 [震災伝承へ語り部育成 浪江で講座スタート](#)
-

<帰還困難区域に関する動き>

- 2025.05.14 福島民友新聞 [帰還困難区域活動自由に 第2期後、自民復興加速化本部、提言へ調整](#)
- 2025.05.14 福島民報 [福島県の帰還困難区域 活動全面自由化検討へ 個人ごとに線量管理 自民復興加速化本部が提言案](#)
- 2025.05.24 福島民友新聞 [帰還困難解除へ道筋明示を、福島県内6町村協議会、政府に要望](#)
-

(次ページに続く)

概要に戻る

11 ② イチエフに関する報道【イチエフ事故の後始末 **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:福島県内の除染土の県外処理処分/避難者/検証・伝承・記録/帰還困難区域に関する動き/ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響/旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事/未分類

<ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響 **了**>

2025.05.26	共同通信	IAEA、処理水の監視状況検証 福島第1原発の安全性調査
2025.05.30	共同通信	【独自】水産物輸入手続き開始へ 日本産、中国が業者登録
2025.05.30	共同通信	中国、日本産水産物の輸入再開へ 林官房長官、施設の登録完了後
2025.05.30	共同通信	日本産水産物、中国輸出再開へ 37道府県、手続き開始合意
2025.05.30	共同通信	原発処理水放出、安全基準に合致 IAEAの調査団
2025.05.31	高知新聞	【中国への水産物】早期再開と完全な撤廃を

<旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事>

(双葉町)

2025.05.01	福島民友新聞	整体で双葉郡を元気に 鍼灸師・堀本さん(大熊出身)郡内に拠点「いつか自分の店を」
2025.05.04	共同通信	原発避難の町に移住者がコーヒー店開業 福島・双葉「人が訪れるきっかけに」
2025.05.06	福島民友新聞	「歌で人を励ましたい」双葉出身のあやこさん、西田敏行さんパネル展で披露
2025.05.12	福島民友新聞	双葉駅前…夜も活気を、午後9時まで営業飲食店開店 新たなにぎわい拠点

概要に戻る

(次ページに続く)

11 ② イチエフに関する報道【イチエフ事故の後始末 続き】 (更新)

今月の中区分:福島県内の除染土の県外処理処分/避難者/検証・伝承・記録/帰還困難区域に関する動き/ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響/旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事/未分類

<旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事 続き>

(浪江町)

- 2025.05.02 福島民報 [【震災・原発事故14年】古里へ誘う黄色の波 福島県浪江町津島地区に菜の花畑 営農再開の促進期待](#)
- 2025.05.18 福島民友新聞 [住民が育てた「クローバー」 浪江の復興拠点、色鮮やかに咲き競う](#)
- 2025.05.21 福島民報 [【震災・原発事故14年】福島市への避難者、孤立防止 支援センター開所 社協連携 飯舘、浪江の職員も勤務 \(再掲\)](#)

(飯舘村)

- 2025.05.05 福島民報 [復興へと歩む 福島県飯舘村長泥地区 長泥コミュニティセンターの「ワクワクマルシェ」にぎわう](#)
- 2025.05.23 福島民報 [渋谷を彩る飯舘の草木 福島大の大黒ゼミ生、24日庭園完成 自然を若い世代に](#)
- 2025.05.23 共同通信 [福島・飯舘でコメ出荷向け田植え 原発事故後初、安全性確認市場へ](#)
- 2025.05.24 福島民友新聞 [飯舘・長泥地区で営農再開、復興拠点 待望の田植え作業](#)
- 2025.05.29 福島民友新聞 [ハンドラッグ、飯舘に初出店 橋浦社長「復興の一助、貢献したい」](#)

(次ページに続く)

11 ② イチエフに関する報道【イチエフ事故の後始末 続き】 (更新)

今月の中区分:福島県内の除染土の県外処理処分/避難者/検証・伝承・記録/帰還困難区域に関する動き/ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響/旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事/未分類

<旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事 続き>

(南相馬市)

- 2025.05.03 福島民報 [一時解体検討の旧小高教会幼稚園の園舎 改修し歴史郷土資料室を開設 卒園生の熱意実る福島県南相馬市](#) (再掲)
- 2025.05.06 福島民友新聞 [小高の野菜で料理を 南相馬の地域協力隊員、7日に飲食店オープン](#)
- 2025.05.08 福島民報 [サラダが主役の店オープン 起業型地域おこし協力隊・加藤さん\(福島県南相馬市小高区出身\)地元食材にこだわる](#)
- 2025.05.15 福島民報 [就労継続支援事業所「トクギー」 6月1日に開所 福島県南相馬市で内覧会](#)
- 2025.05.27 福島民報 [女性の出場条件緩和で「感謝しかない」「相馬野馬追」再出場の阿部日向子さん 福島・小高郷](#)
- 2025.05.29 福島民報 [【花紀行】横田のバラ園\(福島県南相馬市小高区\)](#)

(富岡町)

- 2025.05.13 福島民報 [避難住民の交流拠点閉所へ 富岡町3・11を語る会の「人の駅 桜風舎」 福島県郡山市](#) (再掲)
- 2025.05.21 福島民報 [【震災・原発事故14年】ありがとう「桜風舎」 福島県富岡町のNPO 郡山市の交流拠点閉所](#) (再掲)
- 2025.05.29 福島民報 [6月8日、合併70年記念式典 福島県富岡町「学びの森」開館20周年イベントも同日開催](#)

[概要に戻る](#)[\(次ページに続く\)](#)

11 ② イチエフに関する報道【イチエフ事故の後始末 続き】 (更新)

今月の中区分:福島県内の除染土の県外処理処分/避難者/検証・伝承・記録/帰還困難区域に関する動き/ ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響/旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事/未分類

<旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事 続き>

(葛尾村)

2025.05.23 福島民友新聞 [田畑染める深紅の花…クリームゾンクローバー 葛尾を肥沃な土地に](#)

(大熊町)

2025.05.08 福島民報 [東京芸大生がデザインのトートバッグ 福島県大熊町の児童に 初課題として制作 個性あふれるデザイン](#)

(浜通り・相双地方)

2025.05.07 福島民報 [復興の現状学ぶ 首都圏の中高生、福島県浜通り訪問 11月のツアーに向け事前学習](#)

2025.05.11 福島民報 [少子化を生きる ふくしまの未来 市町村アンケート\(上\) 会津と浜通り流出に危機感 地域事情で異なる要因](#)

2025.05.17 福島民報 [9月ツール・ド・ふくしま サイクリング3コース設定 120・70・40キロ 8月24日まで参加募る](#)

2025.05.21 福島民報 [フラガールOG集結 10月18日「復活きずな公演」 本番に向けレッスン開始 ハワイアンズ\(福島県いわき市\)](#)

2025.05.24 福島民報 [公的資金注入後償却か 福島県のいわき信組は「全て復興に」 架空融資問題](#)

(次ページに続く)

概要に戻る

11 ② イチエフに関する報道【イチエフ事故の後始末 続き】 (更新)

今月の中区分:福島県内の除染土の県外処理処分/避難者/検証・伝承・記録/帰還困難区域に関する動き/ ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響/旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事/未分類

<旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事 続き>

(福島県)

- | | | |
|------------|--------|--|
| 2025.05.01 | 福島民報 | 「未知なる不安」への対処法紹介 福島医大放射線医学県民健康管理センター長・安村さんが書籍出版 |
| 2025.05.03 | 福島民報 | 少子化を生きる ふくしまの未来 第5部「産みやすさ」(5) 理解醸成(上) 正しい知識、意識を |
| 2025.05.05 | 福島民報 | 3分運動で生徒健やか 平野中(福島市)が「朝活」 福医大、中学生向けプログラム普及へ 筋肉量増、意識向上 |
| 2025.05.13 | 福島民報 | 前在英福島県人会ロンドンしゃくなげ会長 満山喜郎さんとの思い出語る 福島で偲ぶ会 |
| 2025.05.16 | 共同通信 | 福島県、健康調査データを初提供 近畿大教授に、原発事故の影響 |
| 2025.05.17 | 福島民報 | 2024年度ホープツーリズム参加者 1万9071人、過去最多 新設アンバサダーなど奏功 福島県 |
| 2025.05.05 | 福島民報 | にぎわい拠点「スカイブルー土湯」オープン 5日もグランドオープンフェス 福島市土湯温泉町 |
| 2025.05.06 | 福島民友新聞 | 桃課長の当麻選手ら3人、摘花作業に汗 福島ユナイテッド農業部 |
| 2025.05.08 | 福島民報 | 福島県産農産物輸出量が前年度比倍増 全体は898トン コメは2倍超えの823トン 2024年度過去最多 |
| 2025.05.22 | 福島民報 | 昆虫マップ作成し環境保全や交流人口創出へ 福島県内外の自治体と企業・団体でつくる「聖地協議会」が事業計画決定 |

概要に戻る

(次ページに続く)

11 ② イチエフに関する報道【イチエフ事故の後始末 了】 (更新)

今月の中区分:福島県内の除染土の県外処理処分/避難者/検証・伝承・記録/帰還困難区域に関する動き/ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響/旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事/未分類

<旧・現避難指示区域・浜通り・相双地方・福島県の出来事 了>

(福島県 続き)

- 2025.05.24 福島民報 [内堀知事、オーストラリアで福島県の魅力紹介 レセプションで県産品提供](#)
- 2025.05.27 福島民報 [豪から誘客、福島県が強化 現地旅行業協と連携へ覚書 通年の観光需要増へ ホープツーリズムにも関心](#)

<未分類>

- 2025.05.21 福島民報 [大阪・関西万博 福島県の今が分かった「復興展示」開始 来場者、認識「更新」 浜通りの未来へメッセージ](#)
- 2025.05.21 福島民報 [大阪・関西万博 経産省 福島県の復興展示始まる 浜通り被災市町村 多言語対応強化へ 研究者や観光外国人が増加](#)
- 2025.05.22 共同通信 [福島と能登、復興へ万博で対談「人生は復活の繰り返し」](#)
- 2025.05.23 新潟日報 [新潟県、東京電力から福島第1原発事故の損害賠償金6万円受け取る](#)
- 2025.05.27 福島民友新聞 [セシウム吸排出、釣り合い評価手法確立 樹木と土壌間で循環](#)

[概要に戻る](#)

(次ページから原子力発電、核施設をめぐる動き)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き】 (更新)

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレイスメント計画/各地の原発・核施設/未分

＜再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策＞

(電力需要)

2025.05.27 北海道新聞 [電力需要、予測は高め？ 北海道内、この先10年で1割増 過去には実績と大きなずれ](#)

(発電)

2025.05.01 新潟日報 [再生可能エネルギー、需要の全量上回る発電量の時間帯が年48日に・2024年の新潟など東北電力エリア…太陽光がけん引](#)

(蓄電)

2025.05.06 共同通信 [関電、大阪に蓄電所建設へ 国内最大級、再エネの導入加速](#)

(原子力発電・エネルギー政策)

2025.05.02 共同通信 [原発稼働率、24年度は32%に 2基再開、福島事故後で最も高く](#)

2025.05.03 共同通信 [豪総選挙、投票始まる 物価高騰、原発是非が争点](#)

2025.05.12 共同通信 [政府、高耐久核融合炉へ試験参画 スペイン建設施設の費用一部負担](#)

2025.05.15 茨城新聞 [新小型原子炉を商用化 日立GE、カナダへ1基 茨城](#)

[概要に戻る](#)[\(次ページに続く\)](#)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレースメント計画/各地の原発・核施設/未分

<再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策 **続き**>

(原子力発電・エネルギー政策 **了**)

2025.05.16	共同通信	ベルギー、脱原発撤回へ 議会在政策転換を可決
2025.05.18	共同通信	台湾、アジア初の脱原発 期限迎え運転停止
2025.05.23	共同通信	米、原発規制大幅緩和へ AI、軍へ電力供給目指す
2025.05.24	北海道新聞	原発関連事業「既に斜陽産業」 龍谷大・大島教授、旭川で講演
2025.05.27	共同通信	IHI、小型炉建屋建設へ壁試作 米原子力企業事業に参画
2025.05.30	共同通信	米規制委、小型原子炉の設計承認「30年導入向け順調」

<原子力発電のバックエンド>

(バックエンド全般)

2025.05.06	北海道新聞	2000のQ&Aから見えたものは 核ごみ文献調査説明会<関口編集委員が読み解く>
2025.05.12	北海道新聞	核ごみの後始末、現状や課題把握へ 原発立地市町村協、25年度中に検討委設置

(次ページに続く)

概要に戻る

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレイスメント計画/各地の原発・核施設/未分類

＜原子力発電のバックエンド **続き**＞

(使用済み核燃料の最終処分)

(北海道寿都町)

- 2025.05.07 北海道新聞 [核ごみ、6月11日寿都で3回目シンポ 専門家3人招き 経済効果／プロセス／安全性](#)
- 2025.05.23 北海道新聞 [火山論文 寿都の大半、処分場不適の可能性も](#)
- 2025.05.23 北海道新聞 [「寿都に核ごみ処分場不適の火山」論文発表へ NUMO、報告書に反映しない方針](#)

(対馬市)

- 2025.05.16 長崎新聞 [対馬市議選終盤情勢 新人増、有力者引退で激戦 核ごみ最終処分場に高い関心](#)

(島根県益田市)

- 2025.05.16 共同通信 [核のごみ調査、検討求める声浮上 島根・益田、知事「反対」](#)
- 2025.05.16 中国新聞 [益田市で核ごみ文献調査の請願検討 経済界有志、市議会に](#)
- 2025.05.19 中国新聞 [益田経済界有志の核のごみ文献調査の請願検討 市長が中止を勧告](#)
- 2025.05.18 中国新聞 [益田市の核のごみ文献調査の市議会への請願 経済界有志が見送りへ](#)
- 2025.05.19 共同通信 [核ごみ調査、隣接の萩市長も反対 風評被害の観光客減を懸念](#)
- 2025.05.20 中国新聞 [益田経済界有志の核ごみ文献調査、請願は「白紙」](#)

[概要に戻る](#)[\(次ページに続く\)](#)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレイスメント計画/各地の原発・核施設/未分

＜原子力発電のバックエンド **了**＞

(使用済み核燃料の最終処分 **了**)

(島根県益田市 **了**)

2025.05.22 中国新聞 [益田経済界有志の核ごみ文献調査終了、請願の「白紙」で](#)

2025.05.27 日本海新聞 [核ごみ調査完全断念 島根・益田の経済界有志](#)

(北海道神恵内村)

2025.05.17 北海道新聞 [核ごみ最終処分場選定 神恵内で「対話の場」会合 村長・村議の出席要請検討](#)

(再処理)

2025.05.18 共同通信 [再処理工場で薬液漏れ 日本原燃、外部へ影響なし](#)

(中間貯蔵・一時保管(地上保管))

2025.05.28 福井新聞 [高浜原発の乾式貯蔵施設設置を許可 原子力規制委員会、関西電力の原発で初](#)

2025.05.28 共同通信 [原発「乾式貯蔵施設」新設を許可 原子力規制委、女川と高浜](#)

[概要に戻る](#)

(次ページから原子力災害時の避難計画の妥当性)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレイスメント計画/各地の原発・核施設/未分類

<原子力災害時の避難計画の妥当性>

(柏崎刈羽原発)

2025.05.01	新潟日報	原発事故時の屋内退避見直し、原子力規制委員会が原発周辺自治体の意見に対する回答公表
2025.05.01	新潟日報	柏崎刈羽原発の「緊急時対応」再修正案の内容、再稼働議論の行方は… 内閣府、作業部会を5月2日開催
2025.05.03	新潟日報	柏崎刈羽原発「緊急時対応」最終案を了承 “新潟特有の課題”への対応は… 内閣府が住民説明会開催へ
2025.05.08	共同通信	【独自】原発事故時、バス稼働は1割強 柏崎、運転手の被ばく懸念
2025.05.10	共同通信	避難バス、隣県稼働台数見通せず 柏崎刈羽原発、事故対応に不安
2025.05.12	新潟日報	柏崎刈羽原発で事故が起こったら…国が「緊急時対応」など説明会開催 6月1日に柏崎市、7日に長岡市
2025.05.14	共同通信	避難バス事業者意向を確認 新潟知事、柏崎原発事故時
2025.05.16	共同通信	新潟、柏崎原発事故時の予測公表 「被ばく避けられる」
2025.05.19	新潟日報	柏崎刈羽原発運転差し止め訴訟、「複合災害時に被ばく」と原告側が主張…新潟地裁で口頭弁論

[概要に戻る](#)

(次ページに続く)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/泊原発/原子力発電についての世論調査/裁判・法的手続き・裁判外紛争解決手続き(ADR)/各地の原発・核施設/未分類

<原子力災害時の避難計画の妥当性 **了**>

(柏崎刈羽原発 **了**)

- 2025.05.21 新潟日報 [柏崎刈羽原発事故時の物資輸送、除雪作業…民間への協力依頼「国が体制整備を」市町村側が要望 新潟市で実務担当者会議](#)
- 2025.05.22 新潟日報 [柏崎刈羽原発の被ばく線量シミュレーション、花角英世知事「避難計画や屋内退避の有効性は検証できた」](#)
- 2025.05.27 新潟日報 [柏崎刈羽原発の「緊急時対応」は「実効性を欠く」新潟県などの市民団体が国会内で反対集会](#)
(未分類)
- 2025.05.03 北海道新聞 [「計画通りにいくかどうか…」住民避難に不安の声 地元同意「範囲拡大を」<泊原発再稼働 緊急レポート>⑦](#)
- 2025.05.15 茨城新聞 [5項目の実効性確認へ 東海第2避難計画検証委 移動手段の確保策など 茨城](#)
- 2025.05.15 静岡新聞 [浜岡原発31キロ圏の9市町「屋内退避に課題」UPZ圏、要配慮者の避難困難 放射線防護対策の必要性高く](#)
- 2025.05.16 静岡新聞 [静岡県の避難者情報登録システム、訓練で初運用 操作「簡素化を」／実効性疑問視する声も](#)
- 2025.05.30 共同通信 [原発立地半島の防災に50億円 中国電力負担、避難道路確保](#)
- 2025.05.31 共同通信 [内閣府、原発防災強化へ部署新設 複合災害に対応](#)

[概要に戻る](#)

..... (次ページから柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地))

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレイスメント計画/各地の原発・核施設/未分

<柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)>

- 2025.05.02 共同通信 [新潟、再稼働容認は「49%」 経産省の「県民アンケート」](#)
- 2025.05.06 新潟日報 [\[柏崎刈羽原発・県民投票条例案否決\]「再稼働の是非、県議会が結論を」新潟国際情報大・越智敏夫学長に聞く”議会の役目”](#)
- 2025.05.07 新潟日報 [放射線から身を守る方法を解説 6月22日に柏崎市で原子力災害に備えたセミナーを開催](#)
- 2025.05.07 共同通信 [新潟知事、原発交付金地域拡大を 城内科技相に「30キロ圏にも」](#)
- 2025.05.07 新潟日報 [新潟県市長会新会長に関口芳史・十日町市長 柏崎刈羽原発の再稼働問題「慎重に進める必要ある」](#)
- 2025.05.08 新潟日報 [柏崎刈羽原発の特措法対象地域、30キロ圏内も 花角英世知事が関係省庁で支援拡大要望](#)
- 2025.05.08 新潟日報 [柏崎刈羽原発巡る「県民意識調査」花角英世知事が検討、柏崎市の桜井雅浩市長「このタイミングでの意図が理解できない」](#)
- 2025.05.09 新潟日報 [柏崎刈羽原発の再稼働巡る県民意識調査、花角英世知事「設問が難しい」時期や手法明言せず](#)
- 2025.05.12 新潟日報 [柏崎刈羽原発「問題克服されない限り再稼働すべきでない」と緊急声明、「脱原発をめざす首長会議」新潟市で総会](#)

(次ページに続く)

概要に戻る

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレースメント計画/各地の原発・核施設/未分

＜柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地) **続き**>

- 2025.05.12 新潟日報 [非常用ディーゼル発電機の潤滑油加熱器に異常、加熱器を停止・柏崎刈羽原発1号機 発電機自体は動かせる状態](#)
- 2025.05.12 新潟日報 [柏崎刈羽原発の衛星電話不具合、東電「組織的な問題なかった」原子力規制委員会に報告書提出](#)
- 2025.05.13 新潟日報 [原発再稼働合格に「有効期限を」柏崎の桜井雅浩市長が私案、地元同意が拘束する現状に異論…国側は否定的](#)
- 2025.05.14 新潟日報 [柏崎刈羽原発の再稼働巡る地元同意、花角英世知事「確認するプロセスあっていい」柏崎市長の「私案」には「申し上げることはない」](#)
- 2025.05.14 新潟日報 [柏崎刈羽原発の再稼働是非巡り、公聴会「早ければ6月から」新潟県知事が意向 出席者一部公募の可能性にも言及](#)
- 2025.05.15 新潟日報 [「柏崎刈羽原発の透明性を確保する地域の会」新会長に品田善司さんを選出 柏崎市で定例会](#)
- 2025.05.15 新潟日報 [\[出雲崎町議会議員選挙2025\] 柏崎刈羽原発の再稼働問題は？町の最重要課題は？立候補予定者13人にアンケート](#)
- 2025.05.16 新潟日報 [柏崎刈羽原発「地域の会」新体制で議論スタート、7号機の追加検査や公聴会実施の意義を質問](#)

[概要に戻る](#)[\(次ページに続く\)](#)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレイスメント計画/各地の原発・核施設/未分類

＜柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地) **続き**>

2025.05.16	新潟日報	テロ対策の不備相次いだ柏崎刈羽原発、原子力規制委員ら5月27日に視察 設備の建設と運用を確認
2025.05.17	新潟日報	柏崎刈羽原発の再稼働問題で東電社長 7号機の地元同意ずれ込んだ場合、6号機先行の可能性に言及
2025.05.18	新潟日報	柏崎刈羽原発再稼働の「事前了解権」獲得目指す 半径30キロ圏自治体などの議員研究会が活動方針
2025.05.18	新潟日報	柏崎刈羽原発再稼働の工程表「詳細は控える」資源エネルギー庁が新潟市で市民団体に回答
2025.05.19	新潟日報	自民党県連幹事長に岩村良一氏が留任へ 総務会長の中村康司氏、政調会長の高橋直揮氏も次期三役人事固まる
2025.05.20	共同通信	新潟県の被ばく予測に懸念 柏崎原発、自治体実務会議
2025.05.21	新潟日報	柏崎刈羽原発6号機の燃料装填取りやめを要請…県内市民団体が東京電力新潟本社に文書提出
2025.05.21	共同通信	柏崎原発の再稼働是非で意見交換 新潟県知事と5市町長
2025.05.22	新潟日報	柏崎刈羽原発の再稼働是非巡り、花角英世知事が首長懇談会開始 魚沼地域5市町長の意見は

[概要に戻る](#)[\(次ページに続く\)](#)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレースメント計画/各地の原発・核施設/未分

<柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地) **続き**>

- 2025.05.22 新潟日報 [テロ対策不備相次いだ柏崎刈羽原発、核物質防護の重点検査終了 原子力規制委員会、通常の検査体制に移行へ](#)
- 2025.05.22 共同通信 [東電、核燃料装填前の原子炉公開 柏崎刈羽6号機、安全対策終了で](#)
- 2025.05.22 新潟日報 [柏崎刈羽原発の変圧器火災、中越沖地震による地面の沈みでケーブル引っ張られ損傷か](#)
- 2025.05.23 新潟日報 [「過酷事故ないと言えるなら、原発は首都圏でもよいのでは」長岡市長が県の被ばく線量シミュレーションで見解 柏崎刈羽原発の耐用年数踏まえた論点と説明](#)
- 2025.05.24 新潟日報 [「協力企業の模範となって」東電社員に求める 東電第三者委、柏崎原発テロ対策の改善状況を「評価」](#)
- 2025.05.25 新潟日報 [テロ対策施設未完成でも再稼働？電源車やポンプ車など移動型装置で対応も…専門家「規制の要求に矛盾」](#)
- 2025.05.26 新潟日報 [日本維新の会、新潟選挙区の対応は…候補擁立の有無「6月上旬までに決定」前原誠司・共同代表に聞く](#)
- 2025.05.26 新潟日報 [「県の動向、今後も監視し続ける」柏崎刈羽原発再稼働巡る県民投票条例請求の市民団体が報告集会](#)

[概要に戻る](#)[\(次ページに続く\)](#)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレースメント計画/各地の原発・核施設/未分類

<柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地) **了**>

- 2025.05.27 新潟日報 [原子力改革監視委員会のクライン委員長、6月10日燃料装填の柏崎刈羽原発6号機を視察「14年間停止していたとは思えない」](#)
- 2025.05.27 共同通信 [テロ対策改善に「安心」と評価 柏崎刈羽原発を原子力規制委視察](#)
- 2025.05.28 新潟日報 [柏崎刈羽原発「作業中の人身事故が相次いでいることは遺憾」 原子力改革監視委員会が報告書](#)
- 2025.05.29 新潟日報 [柏崎刈羽原発の県民投票、上越市の市民団体が報告集会 活動継続を確認](#)
- 2025.05.29 新潟日報 [柏崎刈羽原発の再稼働に賛否示さぬ首長…花角英世知事「悩みも一つの情報」 残る懇談会、夏までに開催意向](#)
- 2025.05.29 新潟日報 [衛星電話の故障相次ぐ柏崎刈羽原発、7号機の追加検査に規制事務所長「完了に1、2カ月」](#)
- 2025.05.29 新潟日報 [柏崎刈羽原発6号機に改良型タービン導入へ、東京電力が工事計画を提出…早ければ2027年の導入を見込む](#)
- 2025.05.30 共同通信 [【速報】柏崎原発公聴会8月末まで再稼働事実上困難](#)
- 2025.05.30 新潟日報 [中原八一市長、柏崎刈羽原発再稼働問題「県議会で意思表示を」… 知事選で「信を問う」ことには否定的考え](#)
- 2025.05.30 新潟日報 [\[柏崎刈羽原発再稼働問題\]公聴会は6月29日から5回開催、花角知事が県民意見を見極める手法の一つ 公述人を募集](#)

[概要に戻る](#)

(次ページに九州電力の原発リプレースメント計画)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレースメント計画/各地の原発・核施設/未分類

＜九州電力による原発リプレースメント計画＞

- 2025.05.05 南日本新聞 [川内原発増設に「反対」51%、賛成を8ポイント上回る 理由は「安全性に疑問」最多 南日本新聞意識調査](#)
- 2025.05.05 南日本新聞 [川内原発 増設「反対」が5割を超える中、再稼働10年で見えた課題とは…2位「災害対策」、1位は？ 南日本新聞社・意識調査](#)
- 2025.05.20 南日本新聞 [九電が原発新設を検討、川内も候補地可能性 経営ビジョンに「次世代革新炉の開発検討」初めて盛り込む](#)
- 2025.05.23 南日本新聞 [「川内原発での建設は明白」…九電が明記した「次世代革新炉」の新設検討、市民団体が中止を申し入れ](#)
- 2025.05.27 南日本新聞 [「事故リスクと核ごみ排出は変わらない」…九電が明記した「次世代革新炉」新設検討、反対を求め市長に要請書 薩摩川内の市民団体](#)

(次ページに各地の原発・核施設)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレースメント計画/各地の原発・核施設/未分類

<各地の原発・核施設>

(泊原発)

2025.05.01	北海道新聞	問われる原発運営能力<泊原発再稼働 緊急レポート>①
2025.05.05	北海道新聞	泊原発再稼働と核ごみ受け入れ反対 200人デモ行進 札幌
2025.05.11	北海道新聞	立憲・野田代表インタビュー 泊原発再稼働の地元同意範囲「知事が判断を」
2025.05.15	北海道新聞	泊原発3号機審査で実施中の「パブリックコメント」とは？<ニュース虫めがね>
2025.05.15	北海道新聞	泊再稼働 資料公表へ 北電、一般道民向けに
2025.05.16	共同通信	泊原発審査合格「大変意義深い」 電事連会長、再稼働巡り
2025.05.20	北海道新聞	泊3号機の原子炉設置変更許可 原子力委で異論出ず 規制委が意見聴取
2025.05.27	北海道新聞	泊3号機の変更許可「妥当」 原子力委が答申決定
2025.05.31	北海道新聞	泊原発3号機 意見公募終了 規制委、今夏にも審査書決定

(女川原発 **了**)

2025.05.01	福島民友新聞	東北電力、2年連続の黒字 純利益1828億円、過去2番目 3月期決算
2025.05.14	共同通信	女川原発、排ガス設備が故障 運転に影響なし、東北電力
2025.05.27	共同通信	女川原発2号機で機器不具合 運転影響なし、東北電力
2025.05.28	共同通信	原発「乾式貯蔵施設」新設を許可 原子力規制委、女川と高浜

[概要に戻る](#)[\(次ページに続く\)](#)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレースメント計画/各地の原発・核施設/未分類

<各地の原発・核施設 **続き**>

(島根原発)

2025.05.01	日本海新聞	点検 平井県政一5期目折り返し (3)懸案事項 協議、交渉重ね節目に 一定評価も残るしこり
2025.05.12	中國新聞	島根原発2号機の内部公開、中国電力
2025.05.15	日本海新聞	島根2号機の管理計画補正 中電、規制委に提出
2025.05.16	中國新聞	中国電力、島根原発1号機で定期検査開始
2025.05.21	中國新聞	原子力規制委、中国電力島根原発2号機の長期施設管理計画を認可

(高浜原発)

2025.05.02	福井新聞	高浜原発の作業員、燃料移送用プールに落下し重傷 定期検査中の3号機、関電「被ばく線量は低い」
2025.05.28	福井新聞	高浜原発の乾式貯蔵施設設置を許可 原子力規制委員会、関西電力の原発で初 (再掲)
2025.05.28	共同通信	原発「乾式貯蔵施設」新設を許可 原子力規制委、女川と高浜 (再掲)

(次ページに続く)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレイスメント計画/各地の原発・核施設/未分類

<各地の原発・核施設 **続き**>

(伊方原発)

- | | | |
|------------|------|--|
| 2025.05.13 | 共同通信 | 資材自然発火で原発火災か 愛媛、四国電伊方2号機 |
| 2025.05.21 | 共同通信 | 伊方原発、非常用の衛星電話故障 3号機の一部、既に交換 |
| 2025.05.28 | 愛媛新聞 | 伊方原発トラブルの教訓継承へ 松山の四電研修所にスペース新設 |
| 2025.05.30 | 共同通信 | 伊方原発、研修施設公開 従業員が過去トラブル学ぶ |

(浜岡原発)

- | | | |
|------------|------|---|
| 2025.05.14 | 静岡新聞 | 浜岡原発再稼働、周辺11市町長「容認」ゼロ 国の新規制基準審査合格でも 全炉停止14年 |
| | | アンケート |
| 2025.05.15 | 共同通信 | 解体中の浜岡原発で火災 放射性物質漏れなし |
| 2025.05.15 | 静岡新聞 | 浜岡原発31キロ圏の9市町「屋内退避に課題」 UPZ圏、要配慮者の避難困難 放射線防護対策の必要性高く(再掲) |

(志賀原発)

- | | | |
|------------|------|---|
| 2025.05.14 | 共同通信 | 火災発生の誤情報は伝達ミス 能登地震直後の北陸電力志賀原発 |
|------------|------|---|

[概要に戻る](#)[\(次ページに続く\)](#)

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き **続き**】 **(更新)**

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレースメント計画/各地の原発・核施設/未分類

<各地の原発・核施設 **続き**>

(敦賀原発)

- 2025.05.17 共同通信 [原電、敦賀1号機廃炉完了に遅れ 40年度予定から](#)
- 2025.05.17 中日新聞 [敦賀原発1号機廃炉5年以上遅れる見込み 予定は2040年度、作業に技術的課題](#)
- 2025.05.19 共同通信 [敦賀1号機廃炉7年遅れ 原電、規制委や県に報告](#)

(玄海原発)

- 2025.05.20 共同通信 [汚染手袋で顔触れたか 原発作業員被ばくで九電](#)

(美浜原発)

- 2025.05.21 共同通信 [定検の美浜3号機、原子炉起動 関西電力、6月に営業運転再開へ](#)

(上関原発/中間貯蔵施設)

- 2025.05.28 共同通信 [上関の周辺市町がエネ庁訪問へ 山口、使用済み燃料中間貯蔵巡り](#)
- 2025.05.29 共同通信 [上関原発審査、新規制補正後に「開始」規制委がボーリング訴訟で回答](#)

(次ページに続く)

概要に戻る

11 ③ イチエフに関する報道【原子力発電、核施設をめぐる動き 了】 (更新)

今月の中区分:再生可能エネルギー・原子力発電・エネルギー政策/原子力発電のバックエンド(使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管(地上保管)/原子力災害時の避難計画の妥当性/柏崎刈羽原発(電力消費地と原発立地)/九州電力による原発リプレースメント計画/各地の原発・核施設/未分類

<各地の原発・核施設 了>

(東海原発)

2025.05.30 茨城新聞 [東海第2 原子炉建屋内で火災 溶接用ケーブルから出火 放射性物質漏れなし 茨城](#)

2025.05.15 茨城新聞 [5項目の実効性確認へ 東海第2避難計画検証委 移動手段の確保策など 茨城](#) (再掲)

<未分類>

2025.05.12 愛媛新聞 [「反原発」訴え半世紀、斉間さんの運動引き継ぐ 八幡浜でしのぶ会](#)

2025.05.13 中国新聞 [チヨルノービリ原発事故の支援 調査団に広島医師ら【ヒロシマドキュメント1990年9月】](#)

2025.05.13 共同通信 [国民・玉木氏、出馬に確認書要求 他党からの候補も積極擁立へ](#)

2025.05.14 共同通信 [広島23年工場被ばくレベル1 非破壊検査中作業員、規制委評価](#)

2025.05.23 中国新聞 [立憲民主の戸倉氏、参院選山口に無所属で立候補表明 党県連「連合山口と調整できず、自主投票になる」](#)

2025.05.25 中日新聞 [イ病を知る 新たな文献「研究会」資料館に講義録など寄贈](#)

2025.05.30 東奥日報 [米学生、弘前大学で被ばく医療学ぶ](#)

概要に戻る

(了)
